

# CONTRATO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA PARA LA “UNIDAD DE PPL N° 1”

## Unidad de Personas Privadas de Libertad N° 1 de Montevideo

Sistema de participación público-privado



Inicio de obras: julio 2015

Inicio de operación (estimada): noviembre 2017

Contratista

**UNIDAD PUNTA DE RIELES**



Construye

**ABENGOA**  
TEYMA

**ABENGOA**  
INABENSA

## 5to INFORME DE ESTADO DE SITUACIÓN DEL CONTRATO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Período: Julio - Diciembre 2017

Montevideo, Enero de 2018

## INDICE DE CONTENIDO

1. Antecedentes.....	3
2. Resumen Ejecutivo del Informe Semestral.....	3
3. Etapa de Construcción.....	3
a. Avances en el Área Técnica.....	3
i. Proyecto Ejecutivo.....	3
ii. Construcción de las obras.....	3
iii. Gestión ambiental.....	6
iv. Información general del Inspector del Contrato.....	7
b. Avances en el Área Financiera.....	9
i. Estados contables <sup>4</sup> .....	9
ii. Garantías.....	11
iii. Información general del Inspector del Contrato.....	11
c. Avances en el Área Operacional.....	11
i. Organización y Personal superior del contratista.....	11
ii. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.....	11
4. Comisión de seguimiento.....	12
5. Referencias.....	13
ANEXO I.....	14

## **1. Antecedentes**

El Ministerio del Interior llamó, adjudicó y firmó el Contrato de la Licitación Pública Nacional/Internacional tramitada por expediente N° 8549/2012 caratulado LICITACIÓN PÚBLICA N° 35/12 REF. CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA “UNIDAD DE PPL N° 1” cumpliendo con todos los actos pertinentes de cada etapa.

La etapa de Pre-Construcción que iniciara el 27 de Mayo de 2014 con la adjudicación provisional del contrato PPP a UPR S.A., culminó el 17 de Agosto de 2015 con el inicio de las obras.

En Enero de 2016, Agosto de 2016 y Enero 2017, el Inspector del Contrato elevó los Informes de Estado de Situación del Contrato Etapa de Pre-Construcción y Construcción, de los períodos: Junio/Diciembre de 2015 (1ro.), Enero/Junio-Julio de 2016 (2do.), Julio/Diciembre de 2016 (3ro.) y Enero/Junio 2017 (4to.) respectivamente.

## **2. Resumen Ejecutivo del Informe Semestral**

El presente informe se elabora en cumplimiento con el Artículo 39° de la Ley N° 18.786 y de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley de PPP y la Guía para la presentación de Informes de Control y Seguimiento y corresponde a la quinta instancia de comunicación a través de entregas semestrales del estado de situación del contrato y de cualquier hecho extraordinario que altere sustancialmente el contrato.

El período abordado Julio-Diciembre 2017 corresponde a los acontecimientos referentes a la Etapa de Construcción en curso iniciadas en Agosto de 2015.

## **3. Etapa de Construcción.**

La etapa de Construcción inició el 17 de Agosto de 2015 con la firma del Acta de Inicio de Obra.

### **a. Avances en el Área Técnica.**

#### **i. Proyecto Ejecutivo.**

22 de Diciembre de 2017 – Es otorgada la PSP

31 de Diciembre de 2017 – El avance informado al cierre del semestre es del 99,9 %.

#### **ii. Construcción de las obras.**

Permiso de Construcción.

##### **1. Proyecto de Arquitectura. Expediente N°4113-012917-15**

Tras la entrega del proyecto arquitectónico por parte de UPR, el proyecto quedó aprobado a expensas del pago de las tasas correspondientes. Durante el semestre UPR recibió resolución de la IM exonerando el pago de tasas a los permisos vinculados al proyecto.

2. Proyecto de Saneamiento. Expediente N°9073-000937-15  
Obra terminada y habilitada por Intendencia de Montevideo.
3. Proyecto de Vialidad - Expediente N°4540-000052-16  
El trabajo de asfaltado de Av. Punta de Rieles se encuentra en curso.

Conexiones: Se finalizaron las obras de conexiones ante UTE, OSE, ANTEL y GASUR/ANCAP de acuerdo con las características del Proyecto Ejecutivo aprobado.

Otras habilitaciones.

Se continúan las gestiones de habilitaciones ante MSP (edificio Enfermería), URSEC la inhibición de señal y ante MIEM-ARNR el uso de radioisótopo o radiaciones ionizantes.

Banco de Previsión Social

Las nóminas registradas ante el BPS de la Obra Pública N° 9989 08666 en el período se encuentran al día y se detallan en Anexo I (página 14). Se controlan los recibos de BPS con constancia de pago.

Personal afectado:

Personal	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17
Operarios Teyma	430	425	318	302	102	106
Técnico	29	28	26	22	20	12
Subcontratos	240	272	230	154	68	75
<b>Total</b>	<b>699</b>	<b>725</b>	<b>574</b>	<b>478</b>	<b>190</b>	<b>193</b>


Control Cláusula de adhesión al pliego. Se constata al 31/12/17 la adhesión a las obligaciones del pliego del Contratista Principal, Teyma Uruguay S.A. y los subcontratos con: Flasur S.A., Loben SRL, Schimdt Premoldeados S.A., Daniel F. Núñez Olivera, Thyssenkrupp Elevadores S.A., RyK Ingenieros S.RL e Idalar S.A..-

### Resumen ejecutivo del Período

De acuerdo al informe mensual de Unidad Punta de Rieles S.A. al 31 de diciembre del 2017, el avance físico acumulado es del 99,9%<sub>1</sub>.

El 1ro de noviembre del 2017 se comenzó la recepción de los edificios por parte del Inspector del Contrato, no habiendo observaciones complejas de salvar.

## Avance físico de Obra al 31/12/2017

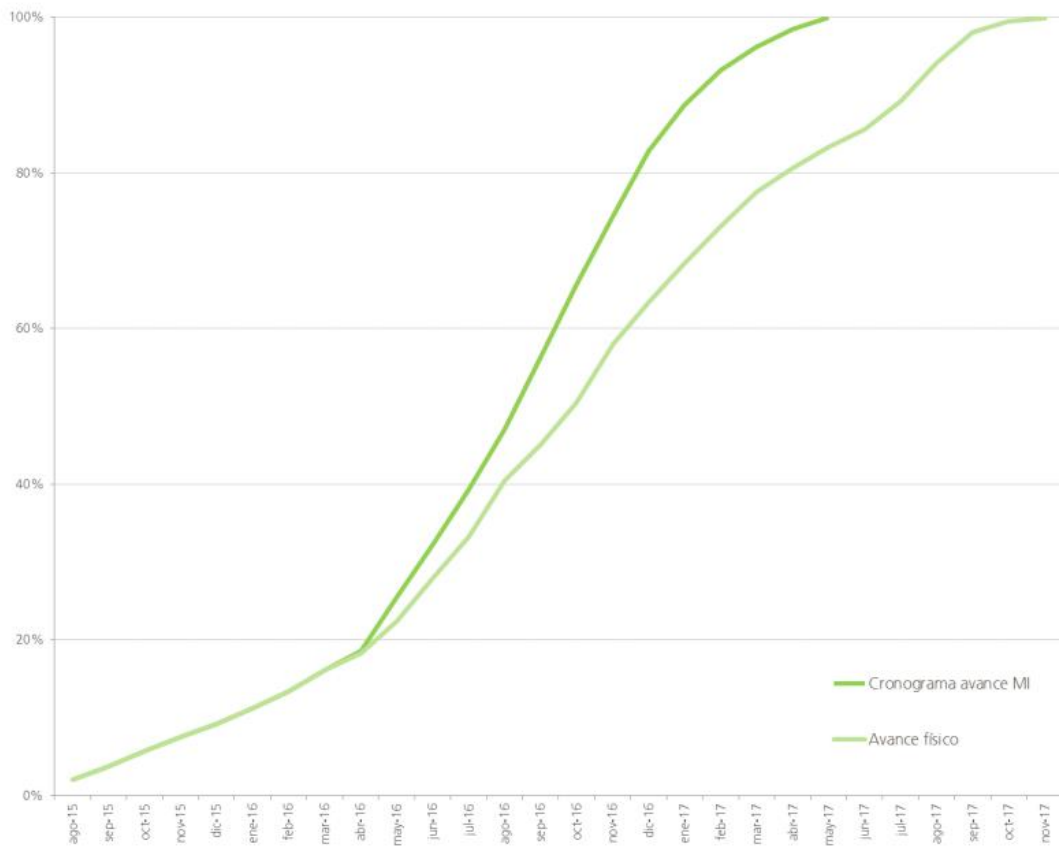

Mes		Avance físico		
		Cronograma avance MI (Abr-2016)	Avance físico mensual	Avance físico acumulado
Mes 01	ago-15	2,1%	2,1%	2,1%
Mes 02	sep-15	3,8%	1,7%	3,8%
Mes 03	oct-15	5,7%	2,0%	5,7%
Mes 04	nov-15	7,5%	1,8%	7,5%
Mes 05	dic-15	9,3%	1,8%	9,3%
Mes 06	ene-16	11,2%	1,9%	11,2%
Mes 07	feb-16	13,4%	2,2%	13,4%
Mes 08	mar-16	16,1%	2,7%	16,1%
Mes 09	abr-16	18,6%	2,2%	18,3%
Mes 10	may-16	25,5%	4,1%	22,4%
Mes 11	jun-16	32,1%	5,5%	27,9%
Mes 12	jul-16	39,3%	5,3%	33,2%
Mes 13	ago-16	47,0%	7,2%	40,4%
Mes 14	sep-16	56,3%	4,7%	45,1%
Mes 15	oct-16	65,7%	5,4%	50,5%
Mes 16	nov-16	74,5%	7,5%	58,0%
Mes 17	dic-16	82,8%	5,3%	63,3%
Mes 18	ene-17	88,7%	5,0%	68,3%
Mes 19	feb-17	93,2%	4,8%	73,1%
Mes 20	mar-17	96,2%	4,4%	77,5%
Mes 21	abr-17	98,5%	3,1%	80,6%
Mes 22	may-17	100,0%	2,7%	83,3%
Mes 23	jun-17	-	2,3%	85,6%
Mes 24	jul-17	-	3,6%	89,2%
Mes 25	ago-17	-	5,0%	94,2%
Mes 26	sep-17	-	3,9%	98,1%
Mes 27	oct-17	-	1,4%	99,5%
Mes 28	nov-17	-	0,4%	99,9%

### iii. Gestión ambiental 2

En el período se recibieron los Informes ambientales N° 8 y 9 correspondientes a los trimestres Mayo a Julio 2017 y Agosto a Octubre 2017 respectivamente. Indicamos los aspectos relevantes de dichos informes:

- El Sistema de Gestión Medioambiental se lleva de acuerdo al plan y los procedimientos vigentes.

- El sistema de Seguridad y Salud Ocupacional se lleva de acuerdo al Plan de Seguridad e Higiene y los Procedimientos vigentes, no habiéndose registrado ningún accidente categorizado como grave o mortal.

Se registró una denuncia de accidente, pero no significativa en todo el período:

Personal	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17
Teyma	0	1	0	0	0	0
Subcontratos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- La Gestión de la Calidad se lleva de acuerdo al Plan y Procedimientos vigentes. Se generan los registros correspondientes en cuanto a los ensayos hasta la fecha. Se han realizado ensayos de resistencia de hormigones tanto de cimentación como de estructura. Los sistemas de gestión se encuentran en ejecución de acuerdo a los procedimientos vigentes. En virtud de que se están terminando las obras ya no se realizan visitas de auditoría interna sobre el sistema de gestión.

#### Control del Plan de Gestión Ambiental

Como desde inicio de las actividades, el control lo realizan los Jefes de Obra, Capataz y Encargados. Además mensualmente se realizan visitas de control y seguimiento de obra por parte del Departamento de Sistemas de Gestión de Teyma. Estas visitas alcanzan a todas las tareas en ejecución sean realizadas con personal propio o subcontratado. Como resultado se eleva un informe a los responsables de la obra.

#### iv. Información general del Inspector del Contrato

##### Gestión documental del proyecto.

El Ministerio del Interior cuenta con el Libro de obra que registra el equipo del EPC, desde el inicio de obra.

Todos los viernes se realiza un seguimiento semanal entre UPR y el MI, se deja constancia de las reuniones en actas elaboradas por ambas partes.

Al cierre del semestre la Comisión Técnica del Inspector del Contrato emitió el 61° (sexagésimo primero) informe técnico. Se mantuvieron las reuniones y recorridas de obra en la que participan el equipo de obra civil del EPC, la Dirección Técnica de UPR S.A. y la Comisión Técnica del Inspector del Contrato. UPR S.A. registró en planilla electrónica las observaciones, la respuesta técnica y el estado de cada solución o respuesta considerada.

El Proyecto Ejecutivo se mantiene documentado en base open-text suministrada por UPR S.A. y a partir del mes de Noviembre 2015 se elabora y publica en SIGES de AGESIC una Planilla de seguimiento de las Modificaciones y Observaciones relevadas, indicando: Aspecto del Proyecto a Modificar, Anterior, Actual, Justificación/Aclaración, Estado y Acciones.

Documentos físicos, electrónicos y resguardo de comunicaciones electrónicas.

Para el seguimiento del Proyecto por el Grupo de Trabajo integrado por MEF y OPP se mantiene el uso del SIGES de AGESIC. En esta plataforma mantiene actualizada la información y documentos relevantes del proyecto así como las actas del grupo de trabajo.

Documentos en SIGES<sub>3</sub> al 31/12/2017:

GESTION AMBIENTAL INFORME TRIMESTRAL (Peso:5)		Ejecución	
Agosto / Setiembre / Octubre 2017	29/11/2017	<input type="checkbox"/>	●
Mayo / Junio / Julio 2017	15/08/2017	<input type="checkbox"/>	●
Febrero / Marzo / Abril 2017	16/05/2017	<input type="checkbox"/>	●
Noviembre / Diciembre 2016 / Enero 2017	17/02/2017	<input type="checkbox"/>	●
Agosto / Setiembre / Octubre 2016	16/11/2016	<input type="checkbox"/>	●
Mayo / Junio / Julio - 2016	15/08/2016	<input type="checkbox"/>	●
Febrero / Marzo / Abril - 2016	11/07/2016	<input type="checkbox"/>	●
Noviembre / Diciembre / Enero - 2015 / 2016	11/05/2016	<input type="checkbox"/>	●
Agosto/Setiembre/Octubre 2015	02/05/2016	<input type="checkbox"/>	●
INFORME FINANCIERO CONTABLE (Peso:5)		Ejecución	
30 de Setiembre 2017 Estados Financieros Intermedios	09/11/2017	<input type="checkbox"/>	●
30 de Junio de 2017 - Estados Financieros Intermedios (2)	04/09/2017	<input type="checkbox"/>	●
30 de Junio de 2017 - Estados Financieros Intermedios (1)	04/09/2017	<input type="checkbox"/>	●
31 de Marzo 2017 Estados Financieros Intermedios	27/04/2017	<input type="checkbox"/>	●
31 de Dic 2016 - Estado financiero anual	19/04/2017	<input type="checkbox"/>	●
30 de Setiembre 2016 Estados Financieros Intermedios	07/11/2016	<input type="checkbox"/>	●
30 Junio 2016 Estados Financieros Intermedios	31/08/2016	<input type="checkbox"/>	●
31 Marzo 2016 Estados Financieros Intermedios	11/05/2016	<input type="checkbox"/>	●
31 Dic 2015 Estado Financiero Anual	11/05/2016	<input type="checkbox"/>	●
30 Set 2015 Estados Financieros Intermedios	11/05/2016	<input type="checkbox"/>	●
OTROS (Peso:0)		No Exigido	
Lista modificaciones al proyecto Abr 2017	03/04/2017	<input type="checkbox"/>	
Lista Modificaciones al proyecto Dic 2016	23/01/2017	<input type="checkbox"/>	
Modificación contractual UPR-Teyma	23/01/2017	<input type="checkbox"/>	
17° Informe Aud. independiente para EF	23/01/2017	<input type="checkbox"/>	
16° Informe Aud.Independiente para Entidades Financiadoras	23/01/2017	<input type="checkbox"/>	
Lista Modificaciones al proyecto Nov 2016	07/11/2016	<input type="checkbox"/>	
Organigrama de obra	13/10/2016	<input type="checkbox"/>	
Listado de modificaciones al proyecto_Set 2016	13/10/2016	<input type="checkbox"/>	



## Evaluación del proyecto

Con vistas a la firma del acuerdo de trabajo conjunto INR/MI-AGEV/OPP para el monitoreo y evaluación del proyecto de participación público privado (PPP) de la UIPPL N° 1 – Punta de Rieles, se trabaja en la elaboración de pautas de trabajo y cronograma.

La documentación preparatoria para la Etapa de Operación requerida por Pliego recibida y aprobada fue:

- Plan de Seguros. Todo riesgo operativo / Responsabilidad civil
- Reglamento Referencial de Servicio
- Plan de Autogestión Ambiental
- Programa de Capacitación
- Programa de Operación

Se implementaron reuniones de trabajo conjunto y según área de responsabilidad (Teyma, Etarey, UPR, INR, ASSE, IC, etc.)

Las instalaciones se encuentran finalizadas, se realizó un proceso de pruebas operativas para evaluar los Sistemas de Seguridad y la operativa de los servicios. En el mes de diciembre se realizaron las capacitaciones al personal del INR por parte de la Concesionaria. Los salones utilizados fueron los comedores de los módulos habitacionales, lo que permitió aprobar las instalaciones. Conjuntamente en esas instancias se realizó el funcionamiento piloto del servicio de alimentación y lavandería, con resultados exitosos.

Entrega de las Obras y Puesta en Servicio Provisoria (PSP).

El 1 de noviembre de 2017 comenzó la recepción de edificios. El primer edificio revisado fue el CA (Control de Accesos) siguiendo AD, IN2, CN, GI y VE.

El 22 de Diciembre de 2017 fue otorgada la PSP.

## **b. Avances en el Área Financiera**

### **i. Estados contables <sup>4</sup>**

En el período UPR S.A. hizo entrega de Estados financieros intermedios al 30 de Setiembre de 2017 e informe de compilación (Cra. Analía Malan Aguirre).

El informe contiene: Informe de Auditoría/Compilación, Estados de Posición/Situación Financiera, Estado de Resultados integrales, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros intermedios.

#### Situación de Abengoa S.A. (casa matriz de la Sociedad)

En el informe de compilación al 30 de Setiembre se hace referencia a la Nota 1 de los estados financieros donde se indica que Abengoa S.A. (casa matriz de la Sociedad) y Teyma Uruguay S.A. (accionista de control y constructor de las obras) han firmado acuerdos de refinanciación de sus deudas financieras con sus acreedores financieros. La Dirección de la sociedad entiende que estos hechos finalmente permiten salir de lo que podía configurar una causal de exigibilidad anticipada de las obligaciones negociables según lo establecido en el documento de emisión y por tal motivo ha procedido a clasificar los saldos de obligaciones negociables en corto y largo plazo de acuerdo al cronograma de vencimientos establecido en el contrato.

Durante el mes de agosto 2017 quedó aprobada una asistencia financiera a la Sociedad para la financiación parcial del proyecto por parte del Banco de la República Oriental del Uruguay.

#### Tipo de deudas:

El 17 de agosto del 2017 el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) concedió a UPR un préstamo subordinado por un importe de hasta UI 86.800.000 (unidades indexadas ochenta y seis millones ochocientos mil) para la financiación parcial de la Obra, debido a la imposibilidad de los accionistas de cumplir con los compromisos de aporte de capital establecidos.

El Consejo de Calificación de FIX SCR Uruguay Calificadora de Riesgo S.A. realizado el 30 de noviembre de 2017<sup>s</sup>, confirma la calificación de 'Asf(uy)' con Perspectiva Estable de las Obligaciones Negociables (ONs) por 717.683.049 emitidas por Unidad Punta de Rieles S.A.

#### Estructura del Capital

El Capital Social autorizado de la Sociedad asciende a UYU 700.000.000 al 30 de Setiembre de 2017. El Capital integrado de la Sociedad alcanzó los UYU 401.561.540.

Con fecha 24 de octubre de 2017 la Sociedad recibió el último desembolso por parte del BROU correspondiente a la deuda subordinada por UI 19.900.000 (equivalente a \$73.474.780)

Con fecha 27 de octubre de 2017 la Sociedad presentó una nota al BROU solicitando la disminución en su totalidad del monto del Aval de Aportaciones Ordinarias y Solicitando la disminución del Aval de Aportaciones Contingentes al monto máximo de UI 21.823.643.

## ii. Garantías.

Las garantías presentadas por UPR S.A. y emitidas por el BSE para la Etapa de Construcción estaban al cierre del mes de Junio 2017 compuestas por cuatro documentos, cada uno de ellos por USD 472.205 las cuales fueron renovadas con vigencia 15/01/2018. Paralelamente con fecha 18/12/2017 fueron presentadas cinco garantías de fiel cumplimiento de contrato para la Etapa Operación, cada documento por un monto de USD498.161 con vigencia 17/12/2018.

## iii. Información general del Inspector del Contrato.

UPR S.A. efectivizó los aportes por concepto de Inspección del Contrato previsto para la etapa OBRA, en mensualidades anticipadas. Se confirma la recepción desde la Cuenta Corriente en Pesos Uruguayos N° 152-0063113 del BROU del Fideicomiso 127272/15 (UPPL 1), RUT 2177 1801 0016 de los pagos correspondientes al segundo semestre del año 2017.

El 28.06.17 en solicitud de UPR y a los efectos de las gestiones realizadas frente a la institución financiera BROU, y de los acreedores prendarios el Ministerio del Interior autorizó que de acuerdo a definición de los recursos propios de la Sociedad, definidos según nota del 30 de enero del 2015 como el capital social unido a la deuda de accionistas aportada a la sociedad, ésta última pueda ser realizada a través de un segundo tramo de deuda, siempre que se cuente con la aprobación de los titulares de las ONs y el Fideicomiso.

## c. Avances en el Área Operacional.


### i. Organización y Personal superior del contratista.

El 31 de octubre el Dr Gabriel Calabuig cesó como el Gerente General del Concesionario. Le ha sustituido para afrontar la fase de operación el Economista Luis Gobbi<sup>6</sup>, el cual ostentaba el cargo de responsable financiero de UPR desde el inicio del proyecto. El equipo cuenta con técnicos, arquitectos y economistas, que trabajan en la coordinación y supervisión de las actividades que le conciernen, por ejemplo, seguimiento de las obras, relaciones con el Ministerio del Interior y con el EPC, solicitud de permisos, certificaciones, gestión de las importaciones, pagos, etc.

### ii. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (Ley N° 16.074 y concordantes)

Durante los meses del semestre, los reportes y denuncias con bajas se han registrado y documentado. El siguiente gráfico muestra la última actualización brindada por UPR S.A. de evolución del índice IFREC (frecuencia de siniestralidad), su comparación con el valor objetivo de Teyma y con el valor medio de la industria de la construcción en Uruguay. El

valor de IFREC se distingue entre el índice que considera bajas (IFREC CBI) del que no considera las afecciones músculo-esqueléticas (s/DME).

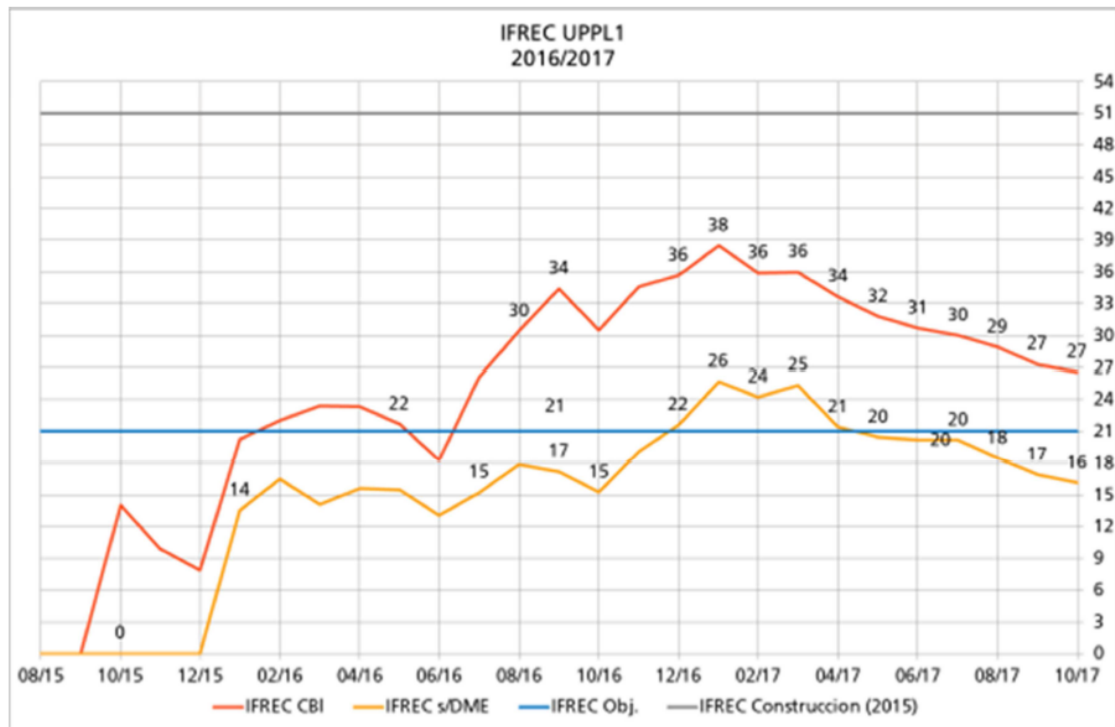

#### 4. Comisión de seguimiento

El Grupo de Trabajo integrado por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio del Interior continúa sesionando mensualmente y en comunicación y apoyo permanente al proyecto cada vez que la situación lo requiere.

Integración a Diciembre de 2017:

**MEF/UPPP:** María Luisa Olivera, Verónica Baldovino, Gabriela Tobías, Thiago Tinoco

**OPP:** Magdalena Viera, Silvana Tayler, Felipe González

**Ministerio del Interior:** Shirley De Armas, Pablo Barreiro

**Inspección del Contrato:** Laura Suárez, Juanita Maritán, Carlos Alpanda, Bernardo Vidal

Ratios financieros para el análisis de los EE.CC. de Unidad Punta de Rieles S.A.. Se aprueba la elaboración para el monitoreo del proyecto por parte del Grupo de Trabajo de los siguientes ratios: 1) Ratio de Liquidez (Razón Corriente), 2) Ratio de Endeudamiento o apalancamiento, 3) Ratio de Pasivo/Activo, 4) Ratio para riesgo de Posición abierta y 5) Ratio de Crédito.

Certificados del Ingeniero Independiente. En el mes de Noviembre 2017 se recibió el Informe de monitoreo elaborado para las entidades Financiadoras de UPPL N° 1 correspondientes al período. Este documento, es el décimo realizado desde que comenzaron los trabajos en agosto de 2015 y acompaña a la certificación mensual No 27. Para su elaboración, el Ingeniero Independiente realizó visitas a la obra y mantuvo reuniones con los equipos del Concesionario (UPR), del operador (Etarey) y del EPC (Teyma) entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre de 2017. En el mes de diciembre se recibió la certificación mensual No 28.

## 5. Referencias

- (1) Informe de avance de obra al 31/12/2017 emitido por UPR S.A.
- (2) Informe trimestral de gestión ambiental Nro. 9 del 15/11/2017 emitido por UPR S.A.
- (3) [www.sigec.agesic.gub.uy](http://www.sigec.agesic.gub.uy)
- (4) Estados financieros Intermedios al 30/09/2017 emitido por UPR S.A.
- (5) Informe de Actualización, Unidad Punta de Rieles S.A., Fix SCR Uruguay Calificadora de Riesgo S.A., Noviembre 30, 2017 publicado el 30/11/2017 en <http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/InformacionInstitucion.aspx?nroinst=7151>
- (6) UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A. Comunica cambio de su Gerente General. Hecho relevante publicado el 01/11/2017 en <http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/InformacionInstitucion.aspx?nroinst=7151>

Informe elaborado en Montevideo, Enero de 2018

Inspector del Contrato  
Bernardo Vidal

### ANEXO I

Nóminas registradas ante el BPS de la Obra Pública N° 9989 08666 en el período Julio - Diciembre 2017

<i>CODIGO</i>	<i>N° EMPRESA</i>	<i>NOMBRE O RAZON SOCIAL</i>	<i>NRO. CONTRIBUYENTE</i>	<i>MES CARGO</i>	<i>MONTO IMPONIBLE NOMINA</i>
175214	6325472	ANDRES TITO	21 718623 0017	07/2017	\$ 25.226,00
176260	5999286	ARQUEYESO LTDA.	21 690718 0018	07/2017	\$ 190.121,05
177054	3248660	B&M SERV. IND. S.R.L.	08 014966 0012	07/2017	\$ 66.450,24
178412	3830905	CONCORDIA PROTEC S.R.L.	16 015713 0010	07/2017	\$ 162.396,70
179427	3798875	FABATEC S.A.	21 504214 0014	07/2017	\$ 6.651,60
180165	6575281	JORGE NELSON VIÑAS ÁLVAREZ	13 016680 0013	07/2017	\$ 1.682.060,99
181988	5239337	LOBEN S.R.L.	21 640688 0017	07/2017	\$ 566.910,00
182123	6830081	MARIO ANDRÉS MOROSINI FERNÁNDEZ	21 798158 0014	07/2017	\$ 53.445,00
183975	3651740	OCEANLUX S.A.	21 378670 0011	07/2017	\$ 2.617,00
184276	0580306	TEYMA URUGUAY S.A.	21 109677 0013	07/2017	\$ 19.884.294,86
185060	4787643	TODO YESO S.R.L.	21 528423 0015	07/2017	\$ 176.951,60
186296	5781417	WALTER ARIEL ORTEGA CURBELO	21 784160 0012	07/2017	\$ 37.612,00
187078	3604619	DANIEL F. NUÑEZ OLIVERA	21 343696 0014	07/2017	\$ 744.425,08
188342	1856783	RYK INGENIEROS S.R.L.	21 213254 0017	07/2017	\$ 188.981,66
189643	3706600	GARDIMAR S.A.	21 417919 0019	07/2017	\$ 70.807,99
190897	3780148	MTA S.A.	21 485547 0014	07/2017	\$ 0,00
191175	5999286	ARQUEYESO LTDA.	21 690718 0018	08/2017	\$ 102.517,21
192355	3248660	B&M SERV. IND. S.R.L.	08 014966 0012	08/2017	\$ 8.401,40
193412	3830905	CONCORDIA PROTEC S.R.L.	16 015713 0010	08/2017	\$ 116.371,50
194228	6192425	CYMA CERRAMIENTOS URUGUAY	21 702595 0018	08/2017	\$ 0,00
195077	3604619	DANIEL F. NUÑEZ OLIVERA	21 343696 0014	08/2017	\$ 710.017,86
196462	3798875	FABATEC S.A.	21 504214 0014	08/2017	\$ 86.385,20
197174	3706600	GARDIMAR S.A.	21 417919 0019	08/2017	\$ 12.746,70
198090	6575281	JORGE NELSON VIÑAS ÁLVAREZ	13 016680 0013	08/2017	\$ 2.282.742,71
199831	5239337	LOBEN S.R.L.	21 640688 0017	08/2017	\$ 848.307,00
200184	6830081	MARIO ANDRÉS MOROSINI FERNÁNDEZ	21 798158 0014	08/2017	\$ 13.502,00
201152	3651740	OCEANLUX S.A.	21 378670 0011	08/2017	\$ 2.617,00
202018	6727747	PALMADUR REPARACIÓN	21 782265 0018	08/2017	\$ 49.553,78
203908	1856783	RYK INGENIEROS S.R.L.	21 213254 0017	08/2017	\$ 605.478,74
204846	0580306	TEYMA URUGUAY S.A.	21 109677 0013	08/2017	\$ 20.334.127,22
205325	4787643	TODO YESO S.R.L.	21 528423 0015	08/2017	\$ 154.233,80

<b>CODIGO</b>	<b>N° EMPRESA</b>	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b>	<b>NRO. CONTRIBUYENTE</b>	<b>MES CARGO</b>	<b>MONTO IMPONIBLE NOMINA</b>
<b>206046</b>	5781417	WALTER ARIEL ORTEGA CURBELO	21 784160 0012	08/2017	\$ 3.475,00
<b>207762</b>	5781417	WALTER ARIEL ORTEGA CURBELO	21 784160 0012	09/2017	\$ 3.475,00
<b>208076</b>	6575281	JORGE NELSON VIÑAS ÁLVAREZ	13 016680 0013	09/2017	\$ 1.457.814,08
<b>209679</b>	3830905	CONCORDIA PROTEC S.R.L.	16 015713 0010	09/2017	\$ 118.558,90
<b>210177</b>	6192425	CYMA CERRAMIENTOS URUGUAY	21 702595 0018	09/2017	\$ 244.235,67
<b>211554</b>	3604619	DANIEL F. NUÑEZ OLIVERA	21 343696 0014	09/2017	\$ 921.556,66
<b>212009</b>	3798875	FABATEC S.A.	21 504214 0014	09/2017	\$ 0,00
<b>213810</b>	5239337	LOBEN S.R.L.	21 640688 0017	09/2017	\$ 1.326.886,00
<b>214131</b>	6830081	MARIO ANDRÉS MOROSINI FERNÁNDEZ	21 798158 0014	09/2017	\$ 13.502,00
<b>215303</b>	3651740	OCEANLUX S.A.	21 378670 0011	09/2017	\$ 2.617,00
<b>216059</b>	1856783	RYK INGENIEROS S.R.L.	21 213254 0017	09/2017	\$ 1.070.862,50
<b>217701</b>	0580306	TEYMA URUGUAY S.A.	21 109677 0013	09/2017	\$ 20.539.076,72
<b>218995</b>	4787643	TODO YESO S.R.L.	21 528423 0015	09/2017	\$ 6.071,40
<b>219448</b>	3706600	GARDIMAR S.A.	21 417919 0019	09/2017	\$ 15.934,62
<b>220742</b>	6727747	PALMADUR REPARACIÓN	21 782265 0018	09/2017	\$ 134.070,76
<b>221560</b>	3248660	B&M SERV. IND. S.R.L.	08 014966 0012	10/2017	\$ 21.714,14
<b>222312</b>	3830905	CONCORDIA PROTEC S.R.L.	16 015713 0010	10/2017	\$ 38.925,20
<b>223245</b>	6192425	CYMA CERRAMIENTOS URUGUAY	21 702595 0018	10/2017	\$ 302.406,82
<b>224327</b>	3604619	DANIEL F. NUÑEZ OLIVERA	21 343696 0014	10/2017	\$ 217.610,60
<b>225018</b>	3798875	FABATEC S.A.	21 504214 0014	10/2017	\$ 4.033,35
<b>226544</b>	3558008	IDALAR S.A.	21 302236 0012	10/2017	\$ 126.623,72
<b>227555</b>	6575281	JORGE NELSON VIÑAS ÁLVAREZ	13 016680 0013	10/2017	\$ 945.026,41
<b>228538</b>	5239337	LOBEN S.R.L.	21 640688 0017	10/2017	\$ 1.508.849,00
<b>229860</b>	3651740	OCEANLUX S.A.	21 378670 0011	10/2017	\$ 2.719,00
<b>230529</b>	6356286	RODRÍGUEZ FRANCO Y RODRÍGUEZ JUAN	08 022906 0011	10/2017	\$ 113.912,00
<b>231285</b>	1856783	RYK INGENIEROS S.R.L.	21 213254 0017	10/2017	\$ 1.032.203,73
<b>232099</b>	0580306	TEYMA URUGUAY S.A.	21 109677 0013	10/2017	\$ 19.759.530,40
<b>233403</b>	4787643	TODO YESO S.R.L.	21 528423 0015	10/2017	\$ 24.081,30
<b>234900</b>	6830081	MARIO ANDRÉS MOROSINI FERNÁNDEZ	21 798158 0014	10/2017	\$ 13.502,00
<b>235631</b>	5781417	WALTER ARIEL ORTEGA CURBELO	21 784160 0012	10/2017	\$ 0,00
<b>236882</b>	6727747	PALMADUR REPARACIÓN	21 782265 0018	10/2017	\$ 83.420,22
<b>237710</b>	4765549	RURALVIAL LTDA.	18 016254 0013	10/2017	\$ 279.621,10
<b>238850</b>	6325472	ANDRES TITO	21 718623 0017	10/2017	\$ 44.323,00

<b>CODIGO</b>	<b>N° EMPRESA</b>	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b>	<b>NRO. CONTRIBUYENTE</b>	<b>MES CARGO</b>	<b>MONTO IMPONIBLE NOMINA</b>
<b>239846</b>	3830905	CONCORDIA PROTEC S.R.L.	16 015713 0010	11/2017	\$ 4.803,80
<b>240252</b>	6192425	CYMA CERRAMIENTOS URUGUAY	21 702595 0018	11/2017	\$ 88.262,44
<b>241628</b>	3604619	DANIEL F. NUÑEZ OLIVERA	21 343696 0014	11/2017	\$ 151.876,80
<b>242333</b>	5401893	HERCOM S.R.L.	21 661542 0019	11/2017	\$ 21.436,78
<b>243340</b>	6575281	JORGE NELSON VIÑAS ÁLVAREZ	13 016680 0013	11/2017	\$ 414.312,00
<b>244764</b>	5239337	LOBEN S.R.L.	21 640688 0017	11/2017	\$ 487.253,00
<b>245290</b>	3651740	OCEANLUX S.A.	21 378670 0011	11/2017	\$ 2.719,00
<b>246182</b>	6356286	RODRÍGUEZ FRANCO Y RODRÍGUEZ JUAN	08 022906 0011	11/2017	\$ 32.161,00
<b>247027</b>	1856783	RYK INGENIEROS S.R.L.	21 213254 0017	11/2017	\$ 156.762,77
<b>248897</b>	0580306	TEYMA URUGUAY S.A.	21 109677 0013	11/2017	\$ 12.407.839,76
<b>249156</b>	5781417	WALTER ARIEL ORTEGA CURBELO	21 784160 0012	11/2017	\$ 0,00
<b>250143</b>	3558008	IDALAR S.A.	21 302236 0012	11/2017	\$ 215.281,58
<b>251655</b>	6727747	PALMADUR REPARACIÓN	21 782265 0018	11/2017	\$ 23.707,71
<b>252866</b>	6830081	MARIO ANDRÉS MOROSINI FERNÁNDEZ	21 798158 0014	11/2017	\$ 4.500,00
<b>253999</b>	4765549	RURALVIAL LTDA.	18 016254 0013	11/2017	\$ 458.422,00
<b>254756</b>	0580306	TEYMA URUGUAY S.A.	21 109677 0013	12/2017	\$ 4.951.661,58
<b>255048</b>	5401893	HERCOM S.R.L.	21 661542 0019	12/2017	\$ 89.520,49
<b>256933</b>	6575281	JORGE NELSON VIÑAS ÁLVAREZ	13 016680 0013	12/2017	\$ 15.478,09
<b>257242</b>	5239337	LOBEN S.R.L.	21 640688 0017	12/2017	\$ 228.264,00
<b>258564</b>	3604619	DANIEL F. NUÑEZ OLIVERA	21 343696 0014	12/2017	\$ 71.822,35
<b>259607</b>	3651740	OCEANLUX S.A.	21 378670 0011	12/2017	\$ 2.719,00
<b>260275</b>	6356286	RODRÍGUEZ FRANCO Y RODRÍGUEZ JUAN	08 022906 0011	12/2017	\$ 2.838,00
<b>261193</b>	0580306	RECT. TEYMA URUGUAY S.A.	21 109677 0013	12/2017	\$ 0,00
<b>262426</b>	4765549	RURALVIAL LTDA.	18 016254 0013	12/2017	\$ 231.348,90
<b>263218</b>	5781417	WALTER ARIEL ORTEGA CURBELO	21 784160 0012	12/2017	\$ 2.075,00
<b>264576</b>	1856783	RYK INGENIEROS S.R.L.	21 213254 0017	12/2017	\$ 76.896,16
<b>265054</b>	3558008	IDALAR S.A.	21 302236 0012	12/2017	\$ 49.080,73
