

**CONTRATO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO – PRIVADA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA  
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 47/2016**

**INFORME TRIMESTRAL N° 4  
Julio – Agosto - Setiembre 2020**

## ÍNDICE

|  |    |
|--|----|
| ÍNDICE .....   | 2  |
| SUMARIO .....  | 3  |
| AVANCE DE LA INVERSIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.....         | 3  |
| ANEP - AVANCE REAL DE OBRAS vrs. PROYECTADO.....         | 5  |
| (Según Informes Mensuales CEPI SA) .....                 | 5  |
| INAU - AVANCE REAL DE OBRAS vrs. PROYECTADO .....        | 8  |
| (Según Informes Mensuales CEPI SA) .....                 | 8  |
| ACTA TRIMESTRAL ANEP .....                               | 11 |
| ACTA TRIMESTRAL INAU .....                               | 17 |
| ANEXO I – DETALLE AVANCE DE LA INVERSIÓN TRIMESTRAL..... | 22 |
| ANEXO I ANEP AT.rar .....                                | 22 |
| ANEXO I INAU AT.rar.....                                 | 22 |
| ANEXO II– INFORME TRIMESTRAL N° 4 - CEPI.....            | 23 |
| 202009 - Trimestral 4-ANEP.rar .....                     | 23 |
| PPP1 - ANEP - Informe trimestral N°4 – 202009.....       | 23 |
| 01 - Anexo I - Avance de obra .....                      | 23 |
| 02 - Anexo II - Gestión ambiental.....                   | 23 |
| 03 - Anexo III - Denuncias de accidentes .....           | 23 |
| 04 - Anexo IV - Estados contables .....                  | 23 |
| 05 - Anexo V - Seguros RC, TRC y TRO.....                | 23 |
| 202009 - Trimestral 4-INAU.rar .....                     | 23 |
| PPP1 - INAU - Informe trimestral N°4 – 202009 .....      | 23 |
| 01 - Anexo I - Avance de obra .....                      | 23 |
| 02 - Anexo II - Gestión ambiental.....                   | 23 |
| 03 - Anexo III - Denuncias de accidentes .....           | 23 |
| 04 - Anexo IV - Estados contables .....                  | 23 |
| 05 - Anexo V - Seguros RC, TRC y TRO.....                | 23 |

## SUMARIO

El presente informe se emite y envía cuando está prácticamente finalizando el trimestre siguiente al que el éste refiere.

Quien suscribe se ha incorporado al proyecto PPP1 como Supervisor del Contrato a mediados del mes de octubre próximo pasado.

Se ha enfocado fundamentalmente en los aspectos relativos al avance de la inversión.

Sin embargo, se quiere destacar la preocupación en cuanto a la asignación de recursos a la Supervisión ya que los técnicos integrantes del equipo comparten su dedicación con los otros proyectos que se están desarrollando (PPP2 y PPP3) y que demandan cada vez más atención. Esto es así tanto para el caso de ANEP como para el caso de INAU.

## AVANCE DE LA INVERSIÓN Y PUESTA EN SERVICIO

En el período se han iniciado actividades en los centros que a continuación se detallan:

ANEP, J24 Montevideo-Manga, J28 Montevideo-Manga, J31 Paysandú-Zona Sur, J32 Paysandú-Velódromo, J34 Rocha-Rocha, J36 Salto-Barrio Artigas, J37 Salto-Barrio Constitución, J40 San José-Ciudad del Plata y J41 Soriano-Cardona.

INAU, C48 Montevideo-Abayubá

Del análisis de la información de obras, recabada por la supervisión, se refleja un avance algo menor al manifestado por CEPI en su informe para el trimestre.

Esto es, a nivel global, para INAU 70,19% según la supervisión y 71,04% según CEPI y para ANEP 69,04% según la supervisión y 69,73% para CEPI.

Esta situación se ha reflejado en el Acta Trimestral correspondiente, enviada a CEPI.

La información de detalle se encuentra en los anexos a este informe.

Se observa una disminución significativa, con relación al trimestre anterior, en cuanto a la diferencia entre el avance real y el proyectado. Esto es un hecho positivo.

En el trimestre anterior la diferencia se situaba en un 13,99 % para ANEP y 17,59 % para INAU. Actualmente se observa un 2,06 % para ANEP y un 1,87 % para INAU.

Esto significa que el avance real global se acerca razonablemente al proyectado.

Se observan, sin embargo, algunos casos particulares, que deben ser monitoreados con atención, como son los centros de INAU C46, C48 y C49.

Todo esto en base a la información que surge del informe trimestral de CEPI.

En cuanto a las puestas en servicio, al final del período encontramos en esta fase veintidós centros de ANEP y ocho centros de INAU.



**ANEP - AVANCE REAL DE OBRAS vrs. PROYECTADO  
(Según Informes Mensuales CEPI SA)**

ANEP - CEPI  
PPP EDUCATIVA 1 - RESUMEN DE INVERSION INICIAL


30/9/2020

| J N°                 | Nombre   | INVERSION INICIAL PREVISTA |                   |                    | CEPI SA                    |                           |                             |                               | DESVIO        |
|----------------------|--|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
|                      |  | PRECIO SUBRUBRO (UJ)       | EQUIPAMIENTO (UJ) | TOTAL              | AVANCE REAL ACUMULADO (UJ) | AVANCE REAL ACUMULADO (%) | AVANCE ACUMULADO PROYECTADO | Avance Acumulado Proyectado % |               |
| J-01                 | ARTIGAS (J+C) 25 DE AGOSTO                       | 9.915.670                  | 193.033           | 10.108.703         | 10.108.703                 | 100.0%                    | 10.108.703                  | 100.00%                       | 0.0%          |
| J-02                 | CANELONES (J) LAS PIEDRAS                        | 10.999.461                 | 193.033           | 11.092.494         | 11.092.494                 | 100.0%                    | 11.092.494                  | 100.00%                       | 0.0%          |
| J-03                 | CANELONES (J+C) PROGRESO VISTA LINDA             | 9.804.267                  | 193.033           | 9.997.300          | 9.958.354                  | 99.6%                     | 9.997.300                   | 100.00%                       | -0.4%         |
| J-04                 | CANELONES (J+C) LAS PIEDRAS EL DORADO            | 10.081.495                 | 193.033           | 10.274.528         | 10.274.528                 | 100.0%                    | 10.274.528                  | 100.00%                       | 0.0%          |
| J-05                 | CANELONES (J) LAS PIEDRAS                        | 11.198.838                 | 193.033           | 11.391.871         | 11.391.871                 | 100.0%                    | 11.391.871                  | 100.00%                       | 0.0%          |
| J-06                 | CANELONES (J) LOS AROMOS                         | 10.692.037                 | 193.033           | 10.885.070         | 8.606.312                  | 79.1%                     | 10.426.588                  | 95.79%                        | -17.5%        |
| J-07                 | CANELONES(J+C) BARROS BLANCOS                    | 10.099.801                 | 193.033           | 10.292.834         | 10.253.888                 | 99.6%                     | 10.292.834                  | 100.00%                       | -0.4%         |
| J-08                 | CANELONES (J) LAS PIEDRAS                        | 9.876.560                  | 193.033           | 10.069.593         | 10.069.593                 | 100.0%                    | 10.069.593                  | 100.00%                       | 0.0%          |
| J-09                 | CERRO LARGO (J) MELO                             | 10.226.852                 | 193.033           | 10.419.885         | 3.162.042                  | 30.3%                     | 2.472.456                   | 23.73%                        | 27.9%         |
| J-10                 | COLONIA (J) JUAN LACAZE - Villa Panche           | 11.325.106                 | 193.033           | 11.518.219         | 11.232.304                 | 97.5%                     | 11.518.219                  | 100.00%                       | -2.5%         |
| J-11                 | CANELONES (J) AEROPARQUE                         | 9.834.590                  | 193.033           | 10.027.623         | 2.327.000                  | 23.2%                     | 2.958.165                   | 29.50%                        | -21.3%        |
| J-12                 | MALDONADO (J) HIPODROMO                          | 9.857.593                  | 193.033           | 10.050.626         | 10.050.626                 | 100.0%                    | 10.050.626                  | 100.00%                       | 0.0%          |
| J-13                 | MALDONADO (J) PIRIÁPOLIS                         | 9.742.834                  | 193.033           | 9.935.867          | 7.864.314                  | 79.2%                     | 9.463.273                   | 95.24%                        | -16.9%        |
| J-14                 | MONTEVIDEO (J) - SANTIAGO VAZQUEZ                | 10.368.966                 | 193.033           | 10.561.999         | 10.561.999                 | 100.0%                    | 10.561.999                  | 100.00%                       | 0.0%          |
| J-15                 | MONTEVIDEO (J+C) - MARACANA                      | 9.359.618                  | 193.033           | 9.552.651          | 9.552.651                  | 100.0%                    | 9.552.651                   | 100.00%                       | 0.0%          |
| J-16                 | MONTEVIDEO (J) - PUNTA RIELES                    | 9.761.687                  | 193.033           | 9.954.720          | 9.880.965                  | 99.3%                     | 9.954.720                   | 100.00%                       | -0.7%         |
| J-17                 | MONTEVIDEO (J) - LA PALOMA                       | 10.072.437                 | 193.033           | 10.265.470         | 2.011.174                  | 19.6%                     | 1.746.484                   | 17.01%                        | 15.2%         |
| J-18                 | MONTEVIDEO (J) - CASABO                          | 9.650.243                  | 193.033           | 9.843.276          | 1.431.801                  | 14.5%                     | 1.728.046                   | 17.54%                        | -17.1%        |
| J-19                 | MONTEVIDEO (J) - PARQUE GUARANI                  | 9.817.230                  | 193.033           | 10.010.263         | 7.943.979                  | 79.4%                     | 10.010.263                  | 100.00%                       | -20.6%        |
| J-20                 | MONTEVIDEO (J) - PASO DE LA ARENA                | 9.852.035                  | 193.033           | 10.045.068         | 10.045.068                 | 100.0%                    | 10.045.068                  | 100.00%                       | 0.0%          |
| J-21                 | MONTEVIDEO (J) - PAJAS BLANCAS                   | 10.728.131                 | 193.033           | 10.921.164         | 10.921.164                 | 100.0%                    | 10.921.164                  | 100.00%                       | 0.0%          |
| J-22                 | MONTEVIDEO (J) - Los Bulevares (Las Higuieritas) | 9.621.555                  | 193.033           | 9.814.588          | 9.814.588                  | 100.0%                    | 9.814.588                   | 100.00%                       | 0.0%          |
| J-23                 | MONTEVIDEO (J+C) - SAYAGO                        | 9.454.999                  | 193.033           | 9.648.032          | 8.558.876                  | 88.7%                     | 9.416.033                   | 97.60%                        | -9.1%         |
| J-24                 | MONTEVIDEO (J) - MANGA                           | 10.556.006                 | 193.033           | 10.749.119         | 1.241.361                  | 11.5%                     | 3.574.200                   | 33.25%                        | -65.3%        |
| J-25                 | MONTEVIDEO (J) - VILLA ESPAÑOLA                  | 9.682.677                  | 193.033           | 9.875.710          | 9.875.710                  | 100.0%                    | 9.875.710                   | 100.00%                       | 0.0%          |
| J-26                 | MONTEVIDEO (J) - BELLA ITALIA                    | 9.781.482                  | 193.033           | 9.974.515          | 9.974.515                  | 100.0%                    | 9.974.515                   | 100.00%                       | 0.0%          |
| J-27                 | MONTEVIDEO (J) - LAS DURANAS                     | 9.781.529                  | 193.033           | 9.974.562          | 9.974.562                  | 100.0%                    | 9.974.562                   | 100.00%                       | 0.0%          |
| J-28                 | MONTEVIDEO (J) - UNION                           | 10.113.427                 | 193.033           | 10.306.460         | 1.220.071                  | 11.8%                     | 4.732.303                   | 45.92%                        | -74.2%        |
| J-29                 | MONTEVIDEO (J) - LAS ACACIAS                     | 10.148.204                 | 193.033           | 10.341.237         | 2.928.644                  | 28.3%                     | 2.525.653                   | 24.42%                        | 18.0%         |
| J-30                 | MONTEVIDEO (J+C) - Ruta 8 km 18                  | 9.690.256                  | 193.033           | 9.883.289          | 9.883.289                  | 100.0%                    | 9.883.289                   | 100.00%                       | 0.0%          |
| J-31                 | PAYSANDU (J) - Zona Sur                          | 10.138.411                 | 193.033           | 10.331.444         | 2.504.806                  | 24.2%                     | 1.499.925                   | 14.52%                        | 67.0%         |
| J-32                 | PAYSANDU (J) - Velódromo                         | 10.000.491                 | 193.033           | 10.193.525         | 2.498.388                  | 24.5%                     | 1.785.636                   | 17.52%                        | 39.9%         |
| J-33                 | RIVERA (J) - Barrio La Estiva                    | 10.325.834                 | 193.033           | 10.518.867         | 10.518.867                 | 100.0%                    | 10.518.867                  | 100.00%                       | 0.0%          |
| J-34                 | ROCHA (J) - Rocha                                | 10.476.076                 | 193.033           | 10.669.109         | 1.853.807                  | 17.4%                     | 1.772.831                   | 16.62%                        | 4.6%          |
| J-35                 | SALTO (J) - Barrio Uruguay                       | 10.255.760                 | 193.033           | 10.448.793         | 10.448.793                 | 100.0%                    | 10.448.793                  | 100.00%                       | 0.0%          |
| J-36                 | SALTO (J) - Barrio Artigas                       | 10.093.137                 | 193.033           | 10.286.170         | 2.493.571                  | 24.2%                     | 826.092                     | 8.03%                         | 201.9%        |
| J-37                 | SALTO (J) - Barrio Constitución                  | 10.028.841                 | 193.033           | 10.221.874         | 2.490.210                  | 24.4%                     | 1.523.147                   | 14.90%                        | 63.5%         |
| J-38                 | SALTO (J+C) - La Amarilla                        | 9.668.121                  | 193.033           | 9.861.155          | 9.861.155                  | 100.0%                    | 9.861.155                   | 100.00%                       | 0.0%          |
| J-39                 | SAN JOSÉ (J) LIBERTAD                            | 10.016.697                 | 193.033           | 10.209.730         | 10.149.808                 | 99.4%                     | 10.209.730                  | 100.00%                       | -0.6%         |
| J-40                 | SAN JOSÉ (J) CIUDAD DEL PLATA - Monte Grande     | 9.894.670                  | 193.033           | 10.087.711         | 1.576.885                  | 15.5%                     | 3.617.457                   | 35.51%                        | -56.4%        |
| J-41                 | SORIANO (J) CARDONA                              | 9.928.848                  | 193.033           | 10.121.881         | 2.475.672                  | 24.5%                     | 1.471.022                   | 14.53%                        | 68.3%         |
| J-42                 | SORIANO (J+C) MERCEDES                           | 9.802.787                  | 193.033           | 10.095.820         | 2.323.808                  | 23.0%                     | 1.302.469                   | 12.81%                        | 0.9%          |
| J-43                 | TACUAREMBO (J+C) - Barrio López                  | 9.757.935                  | 193.033           | 9.950.968          | 9.950.968                  | 100.0%                    | 9.950.968                   | 100.00%                       | 0.0%          |
| J-44                 | TREINTA Y TRES (J) - Barrio Ituzaingó            | 9.716.417                  | 193.033           | 9.909.450          | 2.867.725                  | 28.9%                     | 740.651                     | 7.47%                         | 300.7%        |
| <b>TOTALES EN UJ</b> |  | <b>442,307,798</b>         | <b>8,493,455</b>  | <b>450,801,253</b> | <b>314,326,912</b>         | <b>69.73%</b>             | <b>320,936,684</b>          | <b>71.19%</b>                 | <b>-2.06%</b> |

## ANEP

### PPP EDUCATIVA 1

#### AVANCE GLOBAL REAL ACUMULADO VTS AVANCE GLOBAL PROYECTADO

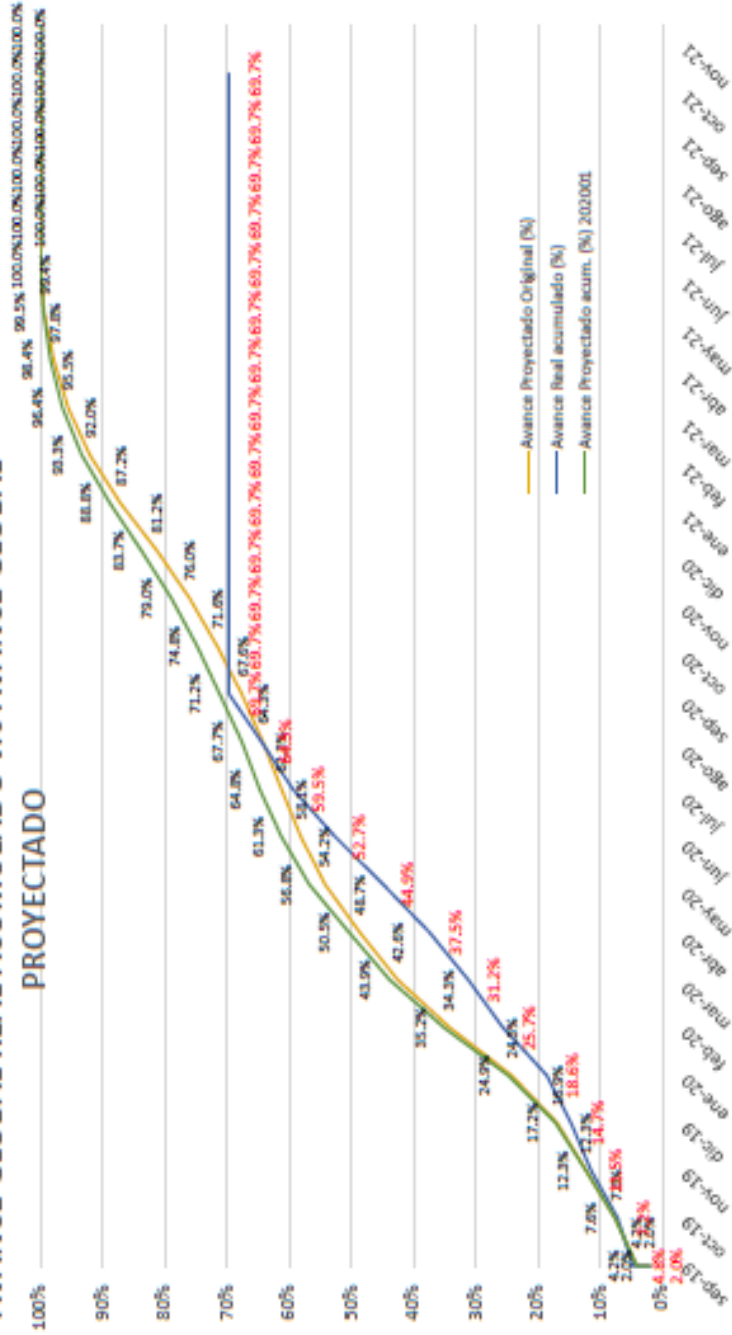



**INAU - AVANCE REAL DE OBRAS vrs. PROYECTADO  
(Según Informes Mensuales CEPI SA)**




INAU - CEPI



30/9/2020

**RESUMEN DE INVERSION INICIAL**

| N° de Centro                 | OBRA TOTAL (U)    | LEYES SOCIALES (U) | PRECIO SUBRUBRO (U) | TOTAL (U)          | CEPI SA                      |                    | PROYECTADO        | % PROYECTADO | DESVIO        |
|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------|
|                              |                   |                    |                     |                    | AVANCE DE OBRA Acumulado (U) | Avance % Acumulado |                   |              |               |
| 1 ARTIGAS - Artigas          | 6,211,735.98      | 902,945.77         | 7,114,681.75        | 7,114,681.75       | 7,114,682                    | 100.00%            | 7,114,682         | 100.0%       | 0.00%         |
| 3 CANELONES - Vista Linda    | 6,108,652.41      | 937,026.14         | 7,045,678.56        | 7,045,678.56       | 7,045,074                    | 99.99%             | 7,045,074         | 100.0%       | 0.00%         |
| 4 CANELONES - El Dorado      | 6,366,488.07      | 957,616.85         | 7,324,104.93        | 7,324,104.93       | 7,324,105                    | 100.00%            | 7,324,105         | 100.0%       | 0.00%         |
| 7 CANELONES - Barros Blancos | 6,338,460.76      | 964,248.84         | 7,302,709.61        | 7,302,709.61       | 7,302,710                    | 100.00%            | 7,302,710         | 100.0%       | 0.00%         |
| 15 MONTEVIDEO - Maracana     | 5,705,012.53      | 889,010.38         | 6,594,022.92        | 6,594,022.92       | 6,594,023                    | 100.00%            | 6,594,023         | 100.0%       | 0.00%         |
| 23 MONTEVIDEO - Sayago       | 5,749,018.80      | 891,777.92         | 6,640,796.72        | 6,640,796.72       | 6,618,716                    | 99.67%             | 6,640,797         | 100.0%       | -0.38%        |
| 30 MONTEVIDEO - Ruta 8       | 5,983,240.52      | 924,375.57         | 6,907,616.09        | 6,907,616.09       | 6,907,616                    | 100.00%            | 6,907,616         | 100.0%       | 0.00%         |
| 38 SALTO - La Amarilla       | 6,036,960.48      | 897,310.38         | 6,934,270.86        | 6,934,270.86       | 6,934,271                    | 100.00%            | 6,934,271         | 100.0%       | 0.00%         |
| 42 SORIANO - Mercedes        | 6,149,101.92      | 925,512.92         | 7,074,614.84        | 7,074,614.84       | 1,674,970                    | 23.68%             | 1,617,600         | 22.9%        | 3.55%         |
| 43 TACUAREMBO - Barrio Lopez | 5,926,638.42      | 890,747.30         | 6,817,385.72        | 6,817,385.72       | 6,817,386                    | 100.00%            | 6,817,386         | 100.0%       | 0.00%         |
| 45 CANELONES - La Paz        | 6,545,172.23      | 958,292.50         | 7,503,464.73        | 7,503,464.73       | 2,065,651                    | 27.53%             | 1,774,505         | 23.8%        | 16.41%        |
| 46 MONTEVIDEO - Casavalle    | 6,043,899.83      | 889,847.61         | 6,933,747.44        | 6,933,747.44       | 1,932,058                    | 27.86%             | 3,174,295         | 45.8%        | -39.13%       |
| 47 MONTEVIDEO Villa Española | 5,918,931.62      | 878,496.14         | 6,797,427.76        | 6,797,427.76       | 5,040,364                    | 74.15%             | 3,926,756         | 57.8%        | 28.36%        |
| 48 MONTEVIDEO - Abayuba      | 6,784,309.68      | 982,456.54         | 7,766,766.22        | 7,766,766.22       | 491,983                      | 6.33%              | 1,075,642         | 13.8%        | -54.26%       |
| 49 SALTO - Ceibal            | 6,266,171.32      | 888,534.05         | 7,154,705.37        | 7,154,705.37       | 1,371,420                    | 19.17%             | 2,415,862         | 33.8%        | -43.23%       |
| <b>TOTALES</b>               | <b>92,133,795</b> | <b>13,778,199</b>  | <b>105,911,994</b>  | <b>105,911,994</b> | <b>75,235,029</b>            | <b>71.04%</b>      | <b>76,665,122</b> | <b>72.4%</b> | <b>-1.87%</b> |

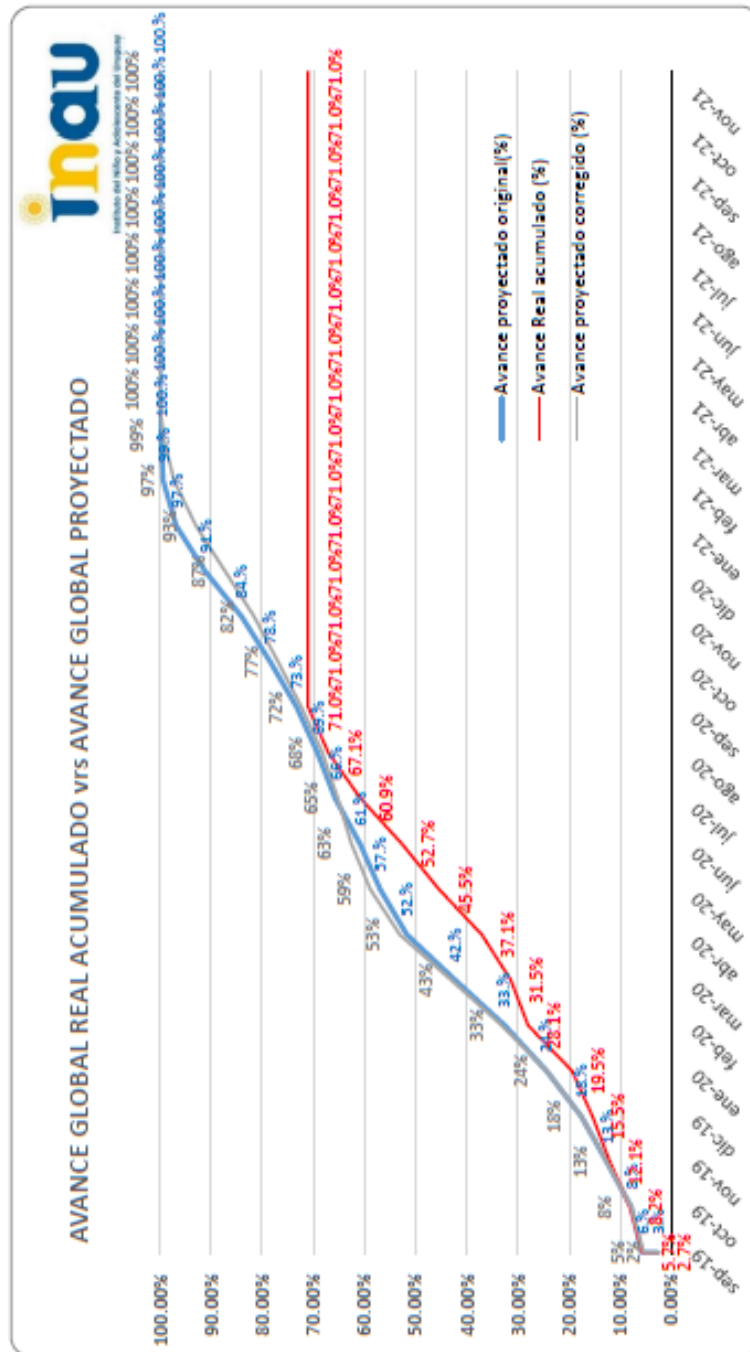



## ACTA TRIMESTRAL ANEP

**CONTRATO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO – PRIVADA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA  
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 47/2016**

**2020930 - ACTA TRIMESTRAL N° 4 - ANEP**

Montevideo, 23 de diciembre de 2020

Atento a lo establecido en el Art. 10.1 se emite la presente acta y se solicita a CEPI SA, la modificación de los valores presentados en su informe trimestral, por no ajustarse a los avances físicos de las obras según las vistas de comprobación realizadas por el equipo de Supervisión de Contrato.

El avance total acumulado reconocido al 30 de setiembre de 2020, de acuerdo con la Supervisión de Contrato asciende a UI 311:233.248 (unidades indexadas trescientos once millones doscientos treinta y tres mil doscientos cuarenta y ocho) lo que representa un porcentaje de avance de 69.04 %.

| ANEP |                                       | INVERSION INICAL PREVISTA | CEPI SA                    |                           | APC                            |                               |
|------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| J N° | Nombre                                | TOTAL                     | AVANCE REAL ACUMULADO (UI) | AVANCE REAL ACUMULADO (%) | Avance % Acumulado Sup de Cont | AVANCE DE OBRA Acumulado (UI) |
| J-01 | ARTIGAS (J+C) 25 DE AGOSTO            | 10,108,703                | 10,108,703                 | 100.0%                    | 99.77%                         | 10,085,557                    |
| J-02 | CANELONES (J) LAS PIEDRAS             | 11,092,494                | 11,092,494                 | 100.0%                    | 99.73%                         | 11,062,335                    |
| J-03 | CANELONES (J+C) PROGRESO VISTA LINDA  | 9,997,300                 | 9,958,354                  | 99.6%                     | 99.20%                         | 9,916,852                     |
| J-04 | CANELONES (J+C) LAS PIEDRAS EL DORADO | 10,274,528                | 10,274,528                 | 100.0%                    | 99.92%                         | 10,266,602                    |
| J-05 | CANELONES (J) LAS PIEDRAS             | 11,391,871                | 11,391,871                 | 100.0%                    | 99.79%                         | 11,367,796                    |
| J-06 | CANELONES (J) LOS AROMOS              | 10,885,070                | 8,606,312                  | 79.1%                     | 75.01%                         | 8,164,484                     |
| J-07 | CANELONES(J+C) BARROS BLANCOS         | 10,292,834                | 10,253,888                 | 99.6%                     | 99.58%                         | 10,249,230                    |
| J-08 | CANELONES (J) LAS PIEDRAS             | 10,069,593                | 10,069,593                 | 100.0%                    | 99.53%                         | 10,022,126                    |
| J-09 | CERRO LARGO (J) MELO                  | 10,419,885                | 3,162,042                  | 30.3%                     | 28.68%                         | 2,988,792                     |
| J-10 | COLONIA (J) JUAN LACAZE - Villa Panca | 11,518,219                | 11,232,304                 | 97.5%                     | 99.82%                         | 11,496,984                    |
| J-11 | CANELONES (J) AEROPARQUE              | 10,027,623                | 2,327,000                  | 23.2%                     | 22.74%                         | 2,280,371                     |
| J-12 | MALDONADO (J) - HIPODROMO             | 10,050,626                | 10,050,626                 | 100.0%                    | 99.90%                         | 10,040,584                    |

| ANEP                 |   | INVERSION INICIAL PREVISTA | CEPI SA                    |                           | APC                            |                               |
|----------------------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| J N°                 | Nombre  | TOTAL                      | AVANCE REAL ACUMULADO (UI) | AVANCE REAL ACUMULADO (%) | Avance % Acumulado Sup de Cont | AVANCE DE OBRA Acumulado (UI) |
| J-13                 | MALDONADO (J) PIRIÁPOLIS                        | 9,935,867                  | 7,864,314                  | 79.2%                     | 72.41%                         | 7,194,517                     |
| J-14                 | MONTEVIDEO (J) - SANTIAGO VAZQUEZ               | 10,561,999                 | 10,561,999                 | 100.0%                    | 99.52%                         | 10,511,192                    |
| J-15                 | MONTEVIDEO (J+C) - MARACANA                     | 9,552,651                  | 9,552,651                  | 100.0%                    | 99.71%                         | 9,524,772                     |
| J-16                 | MONTEVIDEO (J) - PUNTA RIELES                   | 9,954,720                  | 9,880,965                  | 99.3%                     | 99.11%                         | 9,865,760                     |
| J-17                 | MONTEVIDEO (J) - LA PALOMA                      | 10,265,470                 | 2,011,174                  | 19.6%                     | 19.59%                         | 2,011,174                     |
| J-18                 | MONTEVIDEO (J) - CASABO                         | 9,851,276                  | 1,431,801                  | 14.5%                     | 14.53%                         | 1,431,801                     |
| J-19                 | MONTEVIDEO (J) - PARQUE GUARANI                 | 10,010,283                 | 7,943,979                  | 79.4%                     | 76.58%                         | 7,665,490                     |
| J-20                 | MONTEVIDEO (J) - PASO DE LA ARENA               | 10,045,068                 | 10,045,068                 | 100.0%                    | 99.82%                         | 10,027,228                    |
| J-21                 | MONTEVIDEO (J) - PAJAS BLANCAS                  | 10,921,164                 | 10,921,164                 | 100.0%                    | 99.58%                         | 10,874,843                    |
| J-22                 | MONTEVIDEO (J) - Los Bulevares (Las Higueritas) | 9,814,588                  | 9,814,588                  | 100.0%                    | 99.57%                         | 9,772,615                     |
| J-23                 | MONTEVIDEO (J+C) - SAYAGO                       | 9,648,032                  | 8,558,876                  | 88.7%                     | 88.15%                         | 8,504,524                     |
| J-24                 | MONTEVIDEO (J) - MANGA                          | 10,749,119                 | 1,241,361                  | 11.5%                     | 11.36%                         | 1,220,910                     |
| J-25                 | MONTEVIDEO (J) - VILLA ESPAÑOLA                 | 9,875,710                  | 9,875,710                  | 100.0%                    | 99.97%                         | 9,873,064                     |
| J-26                 | MONTEVIDEO (J) - BELLA ITALIA                   | 9,974,515                  | 9,974,515                  | 100.0%                    | 99.98%                         | 9,973,011                     |
| J-27                 | MONTEVIDEO (J) - LAS DURANAS                    | 9,974,562                  | 9,974,562                  | 100.0%                    | 99.92%                         | 9,966,240                     |
| J-28                 | MONTEVIDEO (J) - UNION                          | 10,306,460                 | 1,220,071                  | 11.8%                     | 11.54%                         | 1,189,444                     |
| J-29                 | MONTEVIDEO (J) - LAS ACACIAS                    | 10,341,237                 | 2,928,644                  | 28.3%                     | 28.32%                         | 2,928,644                     |
| J-30                 | MONTEVIDEO (J+C) - Ruta 8 km 18                 | 9,883,289                  | 9,883,289                  | 100.0%                    | 99.95%                         | 9,878,795                     |
| J-31                 | PAYSANDU (J) - Zona Sur                         | 10,331,444                 | 2,504,806                  | 24.2%                     | 24.13%                         | 2,492,923                     |
| J-32                 | PAYSANDU (J) - Velódromo                        | 10,193,525                 | 2,498,388                  | 24.5%                     | 20.04%                         | 2,042,932                     |
| J-33                 | RIVERA (J) - Barrio La Estiva                   | 10,518,867                 | 10,518,867                 | 100.0%                    | 99.92%                         | 10,510,941                    |
| J-34                 | ROCHA (J) - Rocha                               | 10,669,109                 | 1,853,807                  | 17.4%                     | 18.48%                         | 1,971,235                     |
| J-35                 | SALTO (J) - Barrio Uruguay                      | 10,448,793                 | 10,448,793                 | 100.0%                    | 99.66%                         | 10,413,301                    |
| J-36                 | SALTO (J) - Barrio Artigas                      | 10,286,170                 | 2,493,571                  | 24.2%                     | 24.23%                         | 2,491,851                     |
| J-37                 | SALTO (J) - Barrio Constitución                 | 10,221,874                 | 2,490,210                  | 24.4%                     | 14.29%                         | 1,460,926                     |
| J-38                 | SALTO (J+C) - La Amarilla                       | 9,861,155                  | 9,861,155                  | 100.0%                    | 99.67%                         | 9,828,825                     |
| J-39                 | SAN JOSÉ (J) LIBERTAD                           | 10,209,730                 | 10,149,808                 | 99.4%                     | 99.93%                         | 10,202,201                    |
| J-40                 | SAN JOSÉ (J) CIUDAD DEL PLATA - Monte Grande    | 10,187,711                 | 1,576,885                  | 15.5%                     | 15.48%                         | 1,576,885                     |
| J-41                 | SORIANO (J) CARDONA                             | 10,121,881                 | 2,475,672                  | 24.5%                     | 27.31%                         | 2,764,655                     |
| J-42                 | SORIANO (J+C) MERCEDES                          | 10,095,820                 | 2,323,808                  | 23.0%                     | 23.89%                         | 2,412,217                     |
| J-43                 | TACUAREMBO (J+C) - Barrio López                 | 9,950,968                  | 9,950,968                  | 100.0%                    | 99.43%                         | 9,894,125                     |
| J-44                 | TREINTA Y TRES (J) - Barrio Ituzaingó           | 9,909,450                  | 2,967,725                  | 29.9%                     | 28.40%                         | 2,814,493                     |
| <b>TOTALES EN UI</b> |   | <b>450,801,253</b>         | <b>314,326,912</b>         | <b>69.73%</b>             | <b>69.04%</b>                  | <b>311,233,248</b>            |

|      | OBRAS  | Fecha de toma de posesión (Acta de Tenencia) | Permiso de Construcción | Acta de medianería | Acta de inicio de los trabajos |            | Acta de puesta en Servicio      |            |
|------|--|--|-------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------|------------|
|      |  |  |                         |                    | Prevista                       | Real       | Prevista (Modificada mayo 2020) | Real       |
| J-01 | ARTIGAS (H+C) 25 DE AGOSTO                       | 6/9/2019                                     | 12/12/2018              | 26/9/2019          | Tipo de obra                   | 17/9/2019  | 6/9/2020                        | 18/09/2020 |
| J-02 | CANELONES (I) LAS PIEDRAS                        | 6/9/2019                                     | 17/5/2019               | 12/9/2019          | 17/9/2019                      | 17/9/2019  | 12/8/2020                       | 24/08/2020 |
| J-03 | CANELONES (H+C) PROGRESO VISTA LINDA             | 6/9/2019                                     | 25/3/2019               | 12/9/2019          | 17/9/2019                      | 17/9/2019  | 12/8/2020                       |            |
| J-04 | CANELONES (H+C) LAS PIEDRAS EL DORADO            | 6/9/2019                                     | 28/3/2019               | 5/9/2019           | 17/9/2019                      | 17/9/2019  | 13/7/2020                       | 29/07/2020 |
| J-05 | CANELONES (I) LAS PIEDRAS                        | 6/9/2019                                     | 12/12/2018              | 19/9/2019          | 17/9/2019                      | 17/9/2019  | 13/7/2020                       | 23/07/2020 |
| J-06 | CANELONES (I) LOS AROMOS                         | 6/9/2019                                     | 9/7/2019                | 15/1/2020          | 15/8/2020                      | 9/12/2019  | 15/10/2020                      |            |
| J-07 | CANELONES (H+C) BARRIOS BLANCOS                  | 6/9/2019                                     | 1/7/2019                | 19/9/2019          | 17/9/2019                      | 17/9/2019  | 12/8/2020                       | 25/09/2020 |
| J-08 | CANELONES (I) LAS PIEDRAS                        | 6/9/2019                                     | 19/3/2019               | 5/9/2019           | 17/9/2019                      | 17/9/2019  | 13/7/2020                       | 27/07/2020 |
| J-09 | CERRO LARGO (I) MELÓ                             | 6/9/2019                                     | 26/3/2019               | 26/06/2020         | 15/7/2020                      | 22/06/2020 | 30/4/2021                       |            |
| J-10 | COLONIA (I) JUAN LACAZE - Villa Pancho           | 6/9/2019                                     | 14/12/2018              | 17/9/2019          | 17/9/2019                      | 17/9/2019  | 6/9/2020                        | 17/09/2020 |
| J-11 | CANELONES (I) AEROPORQUE                         | 6/9/2019                                     | Pendiente               | 4/09/2020          | 15/6/2020                      | 30/04/2020 | 31/3/2021                       |            |
| J-12 | MALDONADO (I) - HIPÓDROMO                        | 6/9/2019                                     | 1/2/2019                | 9/9/2019           | 17/9/2019                      | 17/9/2019  | 13/7/2020                       | 24/07/2020 |
| J-13 | MALDONADO (I) PIRIÁPOLIS                         | 6/9/2019                                     | 8/4/2019                | 13/02/2020         | XX/2/2020                      | 17/02/2020 | 31/10/2020                      |            |
| J-14 | MONTEVIDEO (I) - SANTIAGO VÁZQUEZ                | 6/9/2019                                     | 5/11/2018               | 17/9/2019          | 17/9/2019                      | 17/9/2019  | 6/9/2020                        | 26/08/2020 |
| J-15 | MONTEVIDEO (H+C) - MARACANÁ                      | 6/9/2019                                     | 5/11/2018               | 2/9/2019           | 17/9/2019                      | 17/9/2019  | 13/7/2020                       | 20/07/2020 |
| J-16 | MONTEVIDEO (I) - PUNTA RIBLES                    | 6/9/2019                                     | 31/10/2018              | 19/9/2019          | 17/9/2019                      | 17/9/2019  | 12/9/2020                       |            |
| J-17 | MONTEVIDEO (I) - LA PALOMA                       | 6/9/2019                                     | 12/4/2019               | 18/06/2020         | 15/8/2020                      | 15/06/2020 | 15/6/2021                       |            |
| J-18 | MONTEVIDEO (I) - CASABO                          | 6/9/2019                                     | 5/11/2018               | 2/07/2020          | 15/7/2020                      | 22/06/2020 | 15/5/2021                       |            |
| J-19 | MONTEVIDEO (I) - PARQUE GUARANI                  | 6/9/2019                                     | 26/12/2018              | 15/1/2020          | 15/6/2020                      | 9/12/2019  | 15/9/2020                       |            |
| J-20 | MONTEVIDEO (I) - PASO DE LA ARENA                | 6/9/2019                                     | 31/10/2018              | 9/9/2019           | 17/9/2019                      | 17/9/2019  | 12/8/2020                       | 17/08/2020 |
| J-21 | MONTEVIDEO (I) - PALAS BLANCAS                   | 6/9/2019                                     | 31/10/2018              | 12/9/2019          | 17/9/2019                      | 17/9/2019  | 6/9/2020                        | 14/09/2020 |
| J-22 | MONTEVIDEO (I) - Los Bulevares (Las Higuieritas) | 6/9/2019                                     | 31/10/2018              | 7/10/2019          | 30/10/2019                     | 30/10/2019 | 12/8/2020                       | 04/09/2020 |
| J-23 | MONTEVIDEO (H+C) - SAVAGO                        | 6/9/2019                                     | 1/12/2018               | 17/1/2020          | 15/12/2019                     | 9/12/2019  | 28/11/2020                      |            |
| J-24 | MONTEVIDEO (I) - MANGA                           | 29/11/2019                                   | Pendiente               | 16/07/2020         | 15/6/2020                      | 1/09/2020  | 15/3/2021                       |            |
| J-25 | MONTEVIDEO (I) - VILLA ESPAÑOLA                  | 6/9/2019                                     | 31/10/2018              | 5/9/2019           | 17/9/2019                      | 17/9/2019  | 13/7/2020                       | 17/07/2020 |
| J-26 | MONTEVIDEO (I) - BELLA ITALIA                    | 6/9/2019                                     | 31/10/2018              | 2/9/2019           | 17/9/2019                      | 17/9/2019  | 13/7/2020                       | 17/07/2020 |
| J-27 | MONTEVIDEO (I) - LAS DURANAS                     | 6/9/2019                                     | 31/10/2018              | 2/9/2019           | 17/9/2019                      | 17/9/2019  | 28/7/2020                       | 29/07/2020 |
| J-28 | MONTEVIDEO (I) - UNIÓN                           | 6/9/2019                                     | Pendiente               | 23/09/2020         | 15/6/2020                      | 28/09/2020 | 28/2/2021                       |            |
| J-29 | MONTEVIDEO (I) - LAS ACACIAS                     | 6/9/2019                                     | 11/12/2018              | 26/05/2020         | 15/7/2020                      | 25/05/2020 | 15/5/2021                       |            |
| J-30 | MONTEVIDEO (H+C) - Ruta 8 km 18                  | 6/9/2019                                     | 5/11/2018               | 2/9/2019           | 17/9/2019                      | 17/9/2019  | 28/7/2020                       | 06/08/2020 |
| J-31 | PAYSANDÚ (I) - Zona Sur                          | 6/9/2019                                     | 8/5/2019                | 17/07/2020         | 15/8/2020                      | 27/07/2020 | 15/6/2021                       |            |
| J-32 | PAYSANDÚ (I) - Velódromo                         | 6/9/2019                                     | 8/5/2019                | 17/07/2020         | 15/8/2020                      | 27/07/2020 | 15/5/2021                       |            |
| J-33 | RIVERA (I) - Barrio La Estiva                    | 6/9/2019                                     | 7/1/2019                | 7/9/2019           | 17/9/2019                      | 17/9/2019  | 13/7/2020                       | 21/07/2020 |
| J-34 | ROCHA (I) - Rocha                                | 6/9/2019                                     | 9/12/2019               | 17/07/2020         | 15/8/2020                      | 6/07/2020  | 15/5/2021                       |            |
| J-35 | SAITO (I) - Barrio Uruguay                       | 6/9/2019                                     | 22/2/2019               | 10/9/2019          | 17/9/2019                      | 17/9/2019  | 6/9/2020                        | 04/09/2020 |
| J-36 | SAITO (I) - Barrio Artigas                       | 6/9/2019                                     | 22/2/2019               | 18/07/2020         | 15/9/2020                      | 27/07/2020 | 15/6/2021                       |            |
| J-37 | SAITO (I) - Barrio Constitución                  | 6/9/2019                                     | 22/2/2019               | 18/07/2020         | 15/8/2020                      | 27/07/2020 | 15/6/2021                       |            |
| J-38 | SAITO (H+C) - La Amarilla                        | 6/9/2019                                     | 22/2/2019               | 10/9/2019          | 17/9/2019                      | 17/9/2019  | 6/9/2020                        | 18/09/2020 |
| J-39 | SAN JOSÉ (I) LIBERTAD                            | 6/9/2019                                     | 7/5/2019                | 17/9/2019          | 17/9/2019                      | 17/9/2019  | 12/8/2020                       | 26/08/2020 |
| J-40 | SAN JOSÉ (I) CIUDAD DEL PLATA - Monte Grande     | 6/9/2019                                     | 26/3/2019               | 16/07/2020         | 15/6/2020                      | 13/08/2020 | 15/3/2021                       |            |
| J-41 | SORIANO (I) CARDONA                              | 6/9/2019                                     | 27/5/2019               | 3/06/2020          | 15/8/2020                      | 6/07/2020  | 15/6/2021                       |            |
| J-42 | SORIANO (H+C) MERCEDES                           | 6/9/2019                                     | 30/4/2019               | 3/06/2020          | 15/7/2020                      | 25/05/2020 | 31/5/2021                       |            |
| J-43 | TACUAREMBO (H+C) - Barrio López                  | 6/9/2019                                     | 7/12/2018               | 5/9/2019           | 16/9/2019                      | 16/9/2019  | 6/9/2020                        | 04/09/2020 |
| J-44 | TRINIDAD Y TRES (I) - Barrio Itzaingó            | 6/9/2019                                     | 1/2/2019                | 6/06/2020          | 15/9/2020                      | 22/06/2020 | 15/6/2021                       |            |

Por otra parte, debemos destacar que existen observaciones realizadas por el equipo de Supervisión de Contrato respecto de la ejecución de obra conforme al proyecto ejecutivo no objetado, cuyo riesgo y subsanación es una responsabilidad exclusiva de la Contratista.

Las observaciones fueron comunicadas a CEPI SA, mediante las notas:

| NOTA OBSERVACIONES ANEP    |            | RESPUESTA CEPI                         |           |
|----------------------------|------------|--|-----------|
| <a href="#">Nota N°41</a>  | 24/02/2020 | <a href="#">Nota N°172</a>             | 3/4/2020  |
| <a href="#">Nota N°42</a>  | 2/3/2020   | <a href="#">Nota N°163</a>             | 11/3/2020 |
| <a href="#">Nota N°43</a>  | 6/3/2020   | <a href="#">Nota N°173</a>             | 3/4/2020  |
| <a href="#">Nota N°44</a>  | 6/3/2020   | <a href="#">Nota N°232</a>             | 10/7/2020 |
| <a href="#">Nota N°46</a>  | 9/3/2020   | <a href="#">Nota N°165</a>             | 31/3/2020 |
| <a href="#">Nota N°48</a>  | 16/3/2020  | <a href="#">Nota N°174</a>             | 3/4/2020  |
| <a href="#">Nota N°50</a>  | 16/3/2020  | <a href="#">Nota N°176</a>             | 7/4/2020  |
| <a href="#">Nota N°52</a>  | 25/3/2020  | <a href="#">Nota N°210</a>             | 23/6/2020 |
| <a href="#">Nota N°53</a>  | 25/3/2020  | <a href="#">Nota N°228</a>             | 7/7/2020  |
| <a href="#">Nota N°54</a>  | 31/3/2020  | <a href="#">Nota N°212</a>             | 25/6/2020 |
| <a href="#">Nota N°61</a>  | 24/4/2020  | <a href="#">Nota N°229</a>             | 9/7/2020  |
| <a href="#">Nota N°62</a>  | 27/4/2020  |  | 20/7/2020 |
| <a href="#">Nota N°63</a>  | 4/5/2020   | <a href="#">Nota N°239</a>             | 13/7/2020 |
| <a href="#">Nota N°67</a>  | 12/5/2020  | <a href="#">Nota N°241</a>             | 14/7/2020 |
| <a href="#">Nota N°68</a>  | 18/5/2020  | <a href="#">Nota N°236</a>             | 13/7/2020 |
| <a href="#">Nota N°69</a>  | 20/5/2020  | <a href="#">Nota N°256</a>             | 21/7/2020 |
| <a href="#">Nota N°71</a>  | 26/5/2020  | <a href="#">Nota N°242</a>             | 14/7/2020 |
| <a href="#">Nota N°73</a>  | 1/6/2020   | <a href="#">Nota N°254</a>             | 19/6/2020 |
| <a href="#">Nota N°76</a>  | 8/6/2020   | <a href="#">Nota N°238</a>             | 13/7/2020 |
| <a href="#">Nota N°79</a>  | 16/6/2020  | <a href="#">Nota N°243/244</a>         | 14/7/2020 |
| <a href="#">Nota N°82</a>  | 29/6/2020  | <a href="#">Nota N°228/240/245/248</a> | 14/7/2020 |
| <a href="#">Nota N°85</a>  | 3/7/2020   | <a href="#">Nota N°246</a>             | 14/7/2020 |
| <a href="#">Nota N°90</a>  | 10/7/2020  | <a href="#">Nota N°247</a>             | 14/7/2020 |
| <a href="#">Nota N°95</a>  | 22/7/2020  | <a href="#">Nota N°266</a>             | 28/7/2020 |
|                            |            | <a href="#">Nota N°279</a>             | 2/8/2020  |
| <a href="#">Nota N°96</a>  | 22/7/2020  | <a href="#">Nota N°267</a>             | 28/7/2020 |
| <a href="#">Nota N°97</a>  | 30/7/2020  | <a href="#">Nota N°271</a>             | 30/7/2020 |
| <a href="#">Nota N°98</a>  | 3/8/2020   |  |           |
| <a href="#">Nota N°101</a> | 12/8/2020  |  |           |
| <a href="#">Nota N°104</a> | 14/8/2020  |  |           |
| <a href="#">Nota N°105</a> | 14/8/2020  |  |           |
| <a href="#">Nota N°110</a> | 28/8/2020  |  |           |
| <a href="#">Nota N°118</a> | 9/9/2020   |  |           |
| <a href="#">Nota N°120</a> | 15/9/2020  |  |           |
| <a href="#">Nota N°128</a> | 29/9/2020  |  |           |

Esta información queda debidamente asociada a cada uno de los Centros en construcción, para ser utilizado como insumo fundamental para lograr evaluar correctamente la posible aparición de futuras patologías o incluso en eventos de servicios.

Se anexa a la presente ACTA N° 4, el resumen generado por el equipo de Supervisión del Contrato, detallando los avances totales por rubros del contrato, así como el de cada Centro.

Saluda atte.

[Ing. Pedro J. Meharu](#)

Supervisor de Contrato PPP1 – Infraestructura Educativa

Administración Nacional de Educación Pública

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

Av. Libertador Brigadier Gral. Juan Antonio Lavalleja 1409





## ACTA TRIMESTRAL INAU

**CONTRATO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO – PRIVADA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA  
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 47/2016**

**20200930 - ACTA TRIMESTRAL N° 4 - INAU**

Montevideo, 23 de setiembre de 2020

Atento a lo establecido en el Art. 10.1 se emite la presente acta y se solicita a CEPI SA, la modificación de los valores presentados en su informe trimestral, por no ajustarse a los avances físicos de las obras según las vistas de comprobación realizadas por el equipo de Supervisión de Contrato.

EL avance total acumulado reconocido al 30 de setiembre de 2020, de acuerdo con la Supervisión de Contrato asciende a UI 74:338.215 (unidades indexadas setenta y cuatro millones trescientos treinta y ocho mil doscientos quince) lo que representa un porcentaje de avance de 70.19 %.

INAU - CEPI

**RESUMEN DE INVERSION INICIAL**



| N° de Centro                 | TOTAL (UI)         | CEPI SA                       |                    | APC                            |                               |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|                              |                    | AVANCE DE OBRA Acumulado (UI) | Avance % Acumulado | Avance % Acumulado Sup de Cont | AVANCE DE OBRA Acumulado (UI) |
| 1 ARTIGAS - Artigas          | 7,114,681.75       | 7,114,682                     | 100.00%            | 99.38%                         | 7,070,825                     |
| 3 CANELONES - Vista Linda    | 7,045,678.56       | 7,045,074                     | 99.99%             | 99.61%                         | 7,017,782                     |
| 4 CANELONES - El Dorado      | 7,324,104.93       | 7,324,105                     | 100.00%            | 99.90%                         | 7,316,880                     |
| 7 CANELONES - Barros Blancos | 7,302,709.61       | 7,302,710                     | 100.00%            | 99.77%                         | 7,285,974                     |
| 15 MONTEVIDEO - Maracana     | 6,594,022.92       | 6,594,023                     | 100.00%            | 99.89%                         | 6,586,798                     |
| 23 MONTEVIDEO - Sayago       | 6,640,796.72       | 6,618,716                     | 99.67%             | 98.70%                         | 6,554,676                     |
| 30 MONTEVIDEO - Ruta 8       | 6,907,616.09       | 6,907,616                     | 100.00%            | 99.37%                         | 6,863,857                     |
| 38 SALTO - La Amarilla       | 6,934,270.86       | 6,934,271                     | 100.00%            | 99.63%                         | 6,908,899                     |
| 42 SORIANO - Mercedes        | 7,074,614.84       | 1,674,970                     | 23.68%             | 22.91%                         | 1,620,553                     |
| 43 TACUAREMBÓ - Barrio Lopez | 6,817,385.72       | 6,817,386                     | 100.00%            | 99.74%                         | 6,799,845                     |
| 45 CANELONES - La Paz        | 7,503,464.73       | 2,065,651                     | 27.53%             | 27.21%                         | 2,041,776                     |
| 46 MONTEVIDEO - Casavalle    | 6,933,747.44       | 1,932,058                     | 27.86%             | 22.10%                         | 1,532,550                     |
| 47 MONTEVIDEO Villa Española | 6,797,427.76       | 5,040,364                     | 74.15%             | 72.79%                         | 4,947,777                     |
| 48 MONTEVIDEO - Abayuba      | 7,766,766.22       | 491,983                       | 6.33%              | 5.45%                          | 423,640                       |
| 49 SALTO - Ceibal            | 7,154,705.37       | 1,371,420                     | 19.17%             | 19.10%                         | 1,366,382                     |
| <b>TOTALES</b>               | <b>105,911,994</b> | <b>75,235,029</b>             | <b>71.04%</b>      | <b>70.19%</b>                  | <b>74,338,215</b>             |

|    | OBRAS                      | Fecha de toma de posesión (Acta de Tenencia) | Permiso de Construcción | Acta de medianería | Acta de inicio de los trabajos |                   | Acta de puesta en Servicio |            |
|----|----------------------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|
|    |                            |  |                         |                    | Prevista                       | Real              | Corregida                  | Real       |
| 1  | ARTIGAS - Artigas          | 6/9/2019                                     | 12/12/2018              | 26/9/2019          | 15/9/2019                      | 17/9/2019         | <b>28/7/2020</b>           | 18/09/2020 |
| 3  | CANELONES - Vista Linda    | 6/9/2019                                     | 25/3/2019               | 12/9/2019          | 15/9/2019                      | 17/9/2019         | <b>28/7/2020</b>           | 20/09/2020 |
| 4  | CANELONES - El Dorado      | 6/9/2019                                     | 28/3/2019               | 5/9/2019           | 15/9/2019                      | 17/9/2019         | <b>28/7/2020</b>           | 10/08/2020 |
| 7  | CANELONES - Barros Blancos | 6/9/2019                                     | 1/7/2019                | 19/9/2019          | 15/9/2019                      | 17/9/2019         | <b>28/7/2020</b>           | 10/08/2020 |
| 15 | MONTEVIDEO - Maracanã      | 6/9/2019                                     | 5/11/2019               | 2/9/2019           | 15/9/2019                      | 17/9/2019         | <b>28/7/2020</b>           | 9/08/2020  |
| 23 | MONTEVIDEO - Sayago        | 6/9/2019                                     | 1/12/2018               | 17/1/2020          | 15/12/2019                     | 9/12/2019         | <b>28/7/2020</b>           |            |
| 30 | MONTEVIDEO - Ruta 6        | 6/9/2019                                     | 5/11/2018               | 2/9/2019           | 15/9/2019                      | 17/9/2019         | <b>28/7/2020</b>           | 28/07/2020 |
| 38 | SALTO - La Amarilla        | 6/9/2019                                     | 22/2/2019               | 10/9/2019          | 15/9/2019                      | 17/9/2019         | <b>28/8/2020</b>           | 21/08/2020 |
| 42 | SORIANO - Mercedes         | 6/9/2019                                     | 30/4/2019               |                    | 15/7/2020                      | 25/05/2020        | <b>28/9/2020</b>           |            |
| 43 | TACUAREMBO - Barrio López  | 6/9/2019                                     | 7/12/2018               | 5/9/2019           | 15/9/2019                      | 16/9/2019         | <b>30/9/2020</b>           | 14/08/2020 |
| 45 | CANELONES - La Paz         | 6/9/2019                                     | 22/3/2019               |                    | 15/7/2020                      |                   | 28/2/2021                  |            |
| 46 | MONTEVIDEO - Casaville     | 6/9/2019                                     | 12/12/2018              | <b>19/08/2020</b>  | 15/6/2020                      | 9/1/2020          | 31/1/2021                  |            |
| 47 | MONTEVIDEO Villa Española  | 6/9/2019                                     | 12/12/2018              | 26/2/2020          | 15/6/2020                      | 4/2/2020          | 31/1/2021                  |            |
| 48 | MONTEVIDEO - Abayuba       | 6/9/2019                                     | 26/12/2018              | <b>15/07/2020</b>  | 15/7/2020                      | <b>12/08/2020</b> | 28/2/2021                  |            |
| 49 | SALTO - Cibola             | 6/9/2019                                     | 26/8/2019               |                    | 15/7/2020                      |                   | 28/2/2021                  |            |

Por otra parte, debemos destacar que existen observaciones realizadas por el equipo de Supervisión de Contrato respecto de la ejecución de obra conforme al proyecto ejecutivo no objetado, cuyo riesgo y subsanación es una responsabilidad exclusiva de la Contratista.

Las observaciones fueron comunicadas a CEPI SA, mediante las notas:

| NOTA OBSERVACIONES INAU          |           | RESPUESTA CEPI                        |           |
|----------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| <a href="#">PPP1 - INAU - 7</a>  | 5/3/2020  | <a href="#">Nota PPPEdu1-2020-257</a> | 21/7/2020 |
|                                  |           | <a href="#">Nota PPPEdu1-2020-292</a> | 5/8/2020  |
| <a href="#">PPP1 - INAU - 8</a>  | 2/3/2020  |                                       | 20/7/2020 |
| <a href="#">PPP1 - INAU - 9</a>  | 9/3/2020  | <a href="#">Nota PPPEdu1-2020-258</a> | 22/7/2020 |
|                                  |           | <a href="#">Nota PPPEdu1-2020-262</a> | 24/7/2020 |
| <a href="#">PPP1 - INAU - 11</a> | 17/3/2020 | <a href="#">Nota PPPEdu1-2020-293</a> | 5/8/2020  |
| <a href="#">PPP1 - INAU - 12</a> | 18/3/2020 | <a href="#">Nota PPPEdu1-2020-177</a> | 13/4/2020 |
| <a href="#">PPP1 - INAU - 14</a> | 23/3/2020 | <a href="#">Nota PPPEdu1-2020-188</a> | 23/4/2020 |
| <a href="#">PPP1 - INAU - 19</a> | 21/4/2020 | <a href="#">Nota PPPEdu1-2020-189</a> | 24/4/2020 |
| <a href="#">PPP1 - INAU - 24</a> | 6/5/2020  |                                       | 20/7/2020 |
| <a href="#">PPP1 - INAU - 27</a> | 14/5/2020 |                                       | 20/7/2020 |
| <a href="#">PPP1 - INAU - 28</a> | 18/5/2020 |                                       | 20/7/2020 |
| <a href="#">PPP1 - INAU - 29</a> | 19/5/2020 |                                       | 20/7/2020 |
| <a href="#">PPP1 - INAU - 33</a> | 11/6/2020 | <a href="#">Nota PPPEdu1-2020-205</a> | 23/6/2020 |
| <a href="#">PPP1 - INAU - 35</a> | 22/6/2020 |                                       | 20/7/2020 |
| <a href="#">PPP1 - INAU - 40</a> | 7/7/2020  |                                       | 20/7/2020 |
| <a href="#">PPP1 - INAU - 41</a> | 9/7/2020  | <a href="#">Nota PPPEdu1-2020-253</a> | 20/7/2020 |
| <a href="#">PPP1 - INAU - 42</a> | 10/7/2020 | <a href="#">Nota PPPEdu1-2020-163</a> | 20/7/2020 |
| <a href="#">PPP1 - INAU - 43</a> | 10/7/2020 |                                       | 20/7/2020 |
| <a href="#">PPP1 - INAU - 45</a> | 10/7/2020 |                                       | 20/7/2020 |
| <a href="#">PPP1 - INAU - 48</a> | 2/9/2020  |                                       |           |
| <a href="#">PPP1 - INAU - 59</a> | 15/9/2020 |                                       |           |
| <a href="#">PPP1 - INAU - 60</a> | 15/9/2020 |                                       |           |
| <a href="#">PPP1 - INAU - 61</a> | 15/9/2020 |                                       |           |
| <a href="#">PPP1 - INAU - 62</a> | 15/9/2020 | <a href="#">Nota PPPEdu1-2020-356</a> | 8/9/2020  |
|                                  |           | <a href="#">Nota PPPEdu1-2020-416</a> | 28/9/2020 |
| <a href="#">PPP1 - INAU - 63</a> | 15/9/2020 |                                       |           |

Esta información queda debidamente asociada a cada uno de los Centros en construcción, para ser utilizado como insumo fundamental para lograr evaluar correctamente la posible aparición de futuras patologías o incluso en eventos de servicios.

Se anexa a la presente ACTA N°4, el resumen generado por el equipo de Supervisión del Contrato, detallando los avances totales por rubros del contrato, así como el de cada Centro.

Saluda atte.

[Ing. Pedro J. Meharu](#)

Supervisor de Contrato PPP1 – Infraestructura Educativa  
Administración Nacional de Educación Pública  
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay  
Av. Libertador Brigadier Gral. Juan Antonio Lavalleja 1409



## **ANEXO I – DETALLE AVANCE DE LA INVERSIÓN TRIMESTRAL**

**ANEXO I ANEP AT.rar**

**ANEXO I INAU AT.rar**

## **ANEXO II– INFORME TRIMESTRAL N° 4 - CEPI**

### **202009 - Trimestral 4-ANEP.rar**

PPP1 - ANEP - Informe trimestral N°4 – 202009

- 01 - Anexo I - Avance de obra
- 02 - Anexo II - Gestión ambiental
- 03 - Anexo III - Denuncias de accidentes
- 04 - Anexo IV - Estados contables
- 05 - Anexo V - Seguros RC, TRC y TRO

### **202009 - Trimestral 4-INAU.rar**

PPP1 - INAU - Informe trimestral N°4 – 202009

- 01 - Anexo I - Avance de obra
- 02 - Anexo II - Gestión ambiental
- 03 - Anexo III - Denuncias de accidentes
- 04 - Anexo IV - Estados contables
- 05 - Anexo V - Seguros RC, TRC y TRO
