

INFORME DE SITUACIÓN Y PRONÓSTICO HIDROLÓGICO N°5

Se mantienen los niveles altos en el este, centro y norte del país.

Fecha y hora de emisión: viernes, 21 de agosto de 2026


Próxima actualización: sábado, 22 de agosto de 2026

NOTA: Información elaborada por la Dirección Nacional de Aguas, único de carácter oficial en la República Oriental del Uruguay (Artículo 462° de la Ley 20.446)



**Ministerio
de Ambiente**

ADVERTENCIA HIDROLÓGICA POR INUNDACIONES

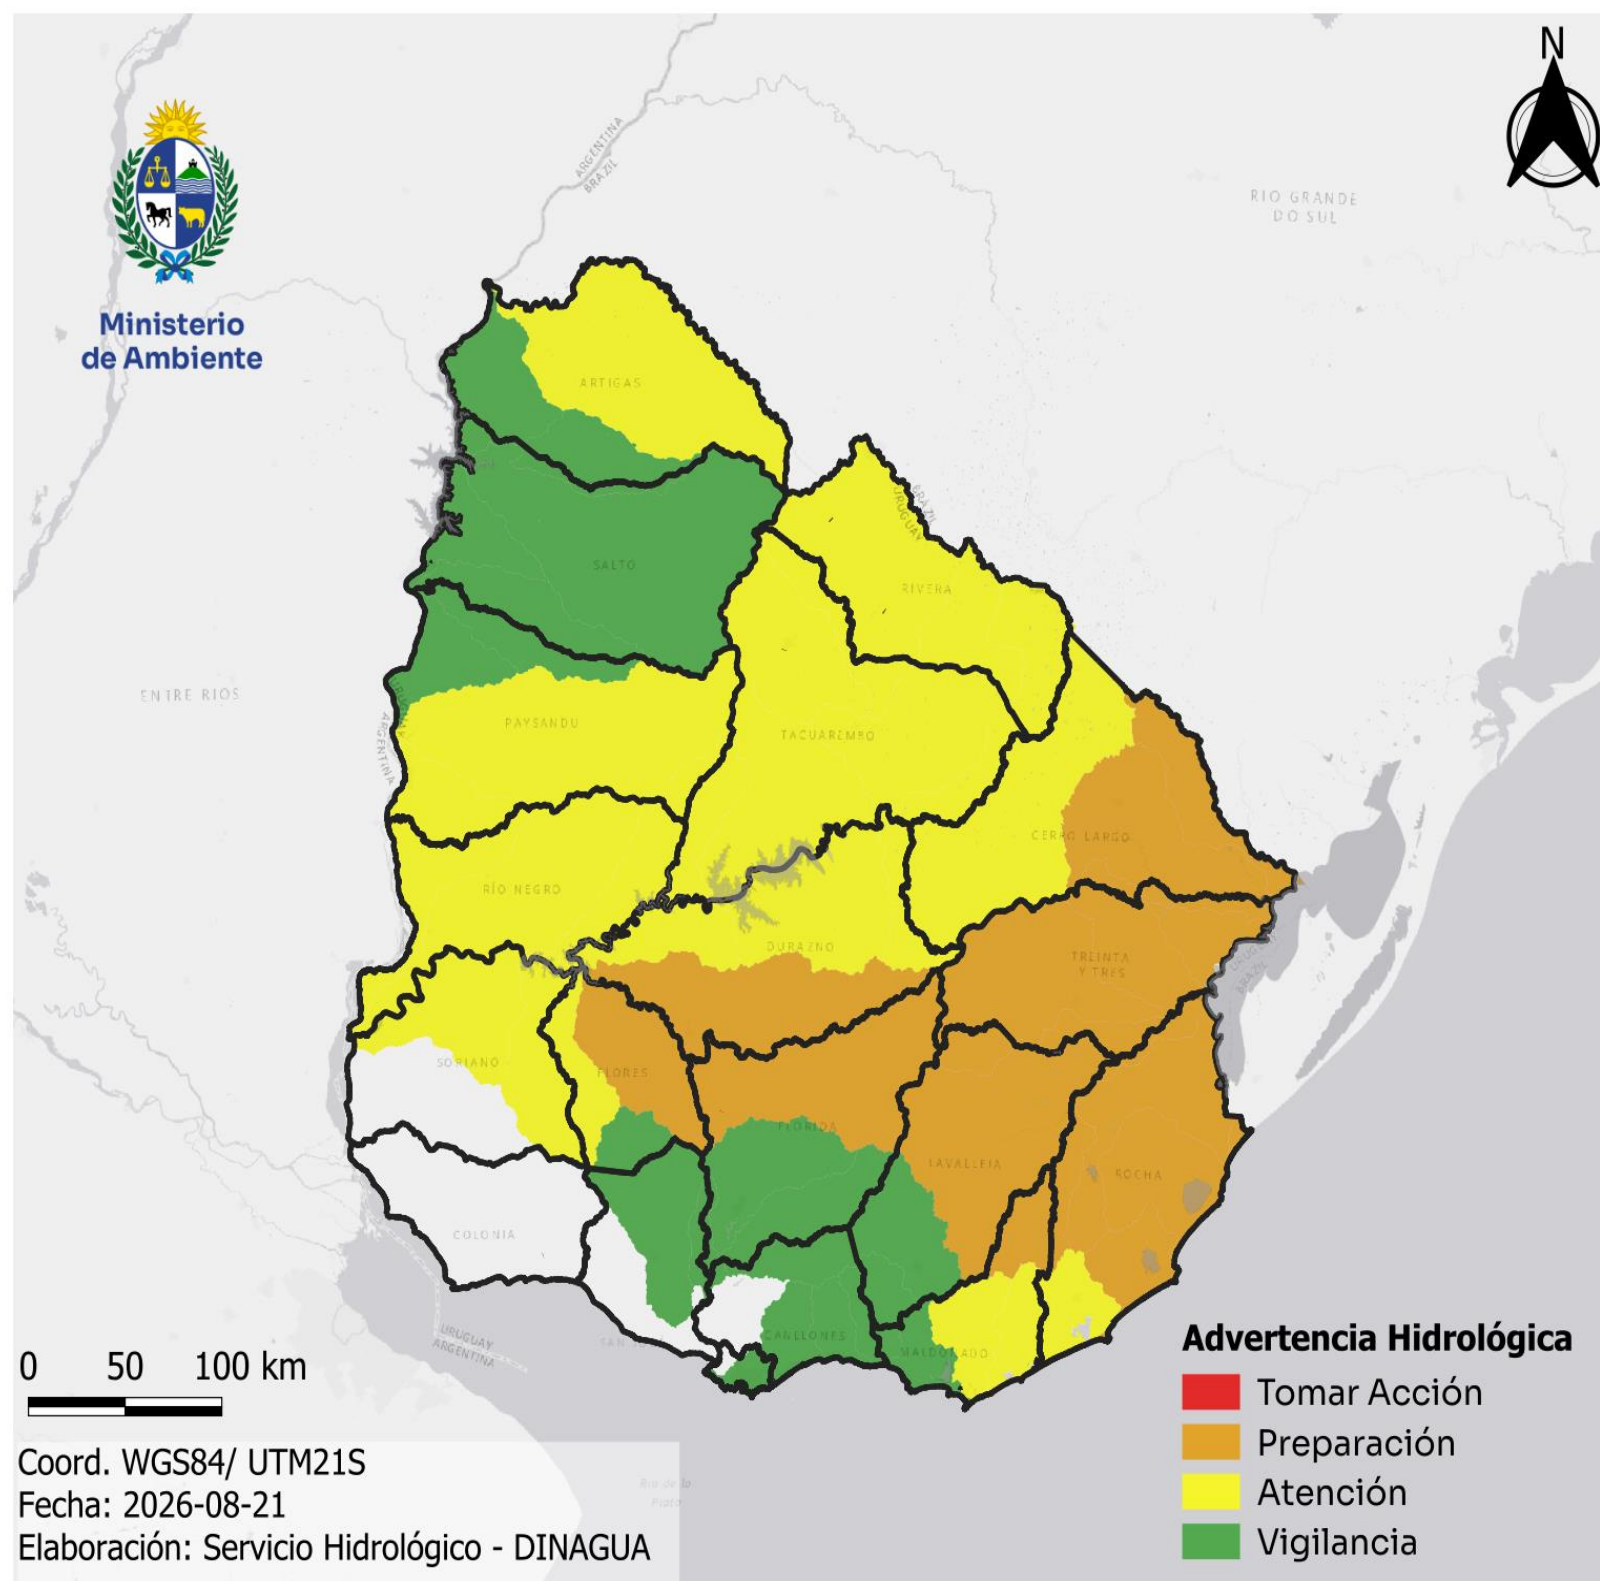

VIGILANCIA

- Se registran niveles en descenso en ríos y arroyos del sur del país.

ATENCIÓN


- Río Cuareím:** Se registran niveles en ascenso. Se espera que el nivel del río se aproxime a la cota de seguridad. No se descarta que la sobrepase levemente.
- Río Uruguay:** En Paysandú, los niveles se mantienen próximos a la cota de seguridad (6.0 m)
- Río Negro:** En Mercedes, los niveles continúan en ascenso, sin alcanzar la cota de seguridad.

PREPARACIÓN

- RÍO YI:** Se registran niveles en ascenso por encima de la cota de seguridad. Se espera que el nivel del río se mantenga en ascenso aproximándose de los 9.15 metros en puente viejo.
- Río Olimar:** Se registran niveles en descenso, todavía por encima de la cota de seguridad. Las lluvias registradas en las últimas horas deben retrasar el descenso del nivel del río.
- Ríos Cebollatí, Tacuarí y Yaguarón:** Las precipitaciones registradas en las últimas horas mantienen los niveles altos en la región.


PRONÓSTICO HIDROLÓGICO CUENCA DEL RÍO YÍ

NIVELES REGISTRADOS				
Estación	Nivel actual (m, cero local)	Tasa incremento (cm/hora)	Tendencia	Cota de seguridad
Sarandí del Yí	5.3	13.0	Sube	-
Polanco del Yí	10.2	-	Baja	-
Durazno Puente Viejo	8.7	3.0	Sube	8.20
Durazno Puente Ruta 5	9.89	3.0	Sube	9.32
PRECIPITACIONES REGISTRADAS				
Los promedios de lluvia acumulada en la cuenca del río Yí fueron las siguientes:				
● <u>Acumulado diario</u>: 27.0 mm ● <u>Acumulado 3 días</u>: 43.0 mm ● <u>Acumulado semanal</u>: 123.0 mm				
PRECIPITACIONES PRONOSTICADAS				
Según los modelos numéricos de predicción GFS y GEFS, se prevén los siguientes acumulados de lluvia sobre la cuenca				
● <u>Próximas 24 horas (Día 1)</u>: 0.0 mm ● <u>Próximos 3 días (Día 1 a 3)</u>: 0.0 mm ● <u>Próximos 7 días (Semanal)</u>: 0.0 mm				
NIVELES MÁXIMOS PRONOSTICADOS PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS				
Estación	Nivel máximo pronosticado para los próximos días		Fecha aproximada de ocurrencia	
Sarandí del Yí	-		-	
Polanco del Yí	-		-	
Durazno Puente Viejo	Alrededor de 9.15 m		Entre 21 y 23 agosto	
Durazno Puente Ruta 5	Alrededor de 10.40 m		Entre 21 y 23 agosto	
PRONÓSTICO HIDROLÓGICO				
Se observa un nuevo ascenso de niveles en el río Yí, conforme lo pronosticado el día de ayer. Actualmente el nivel del río en la ciudad de Durazno aumenta a una razón de aproximadamente 3 cm/h en el puente viejo. Con base en los niveles registrados en Polanco del Yí se espera que el nivel en la ciudad de Durazno siga en ascenso hasta el día de mañana, alcanzando un valor cercano a los 9.15 metros. Además, se observa un nuevo incremento de nivel en Sarandí del Yí, se espera que este incremento de nivel se traslade hasta la ciudad de Durazno hacia el inicio de la semana que viene, manteniendo el río en aguas altas. Se espera que el nivel del río se mantenga por encima de la cota de aviso por los próximos días.				
RECOMENDACIONES AL SINAIE				
Tomar acción antes afectaciones por inundaciones en Durazno y Santa Bernandina.				

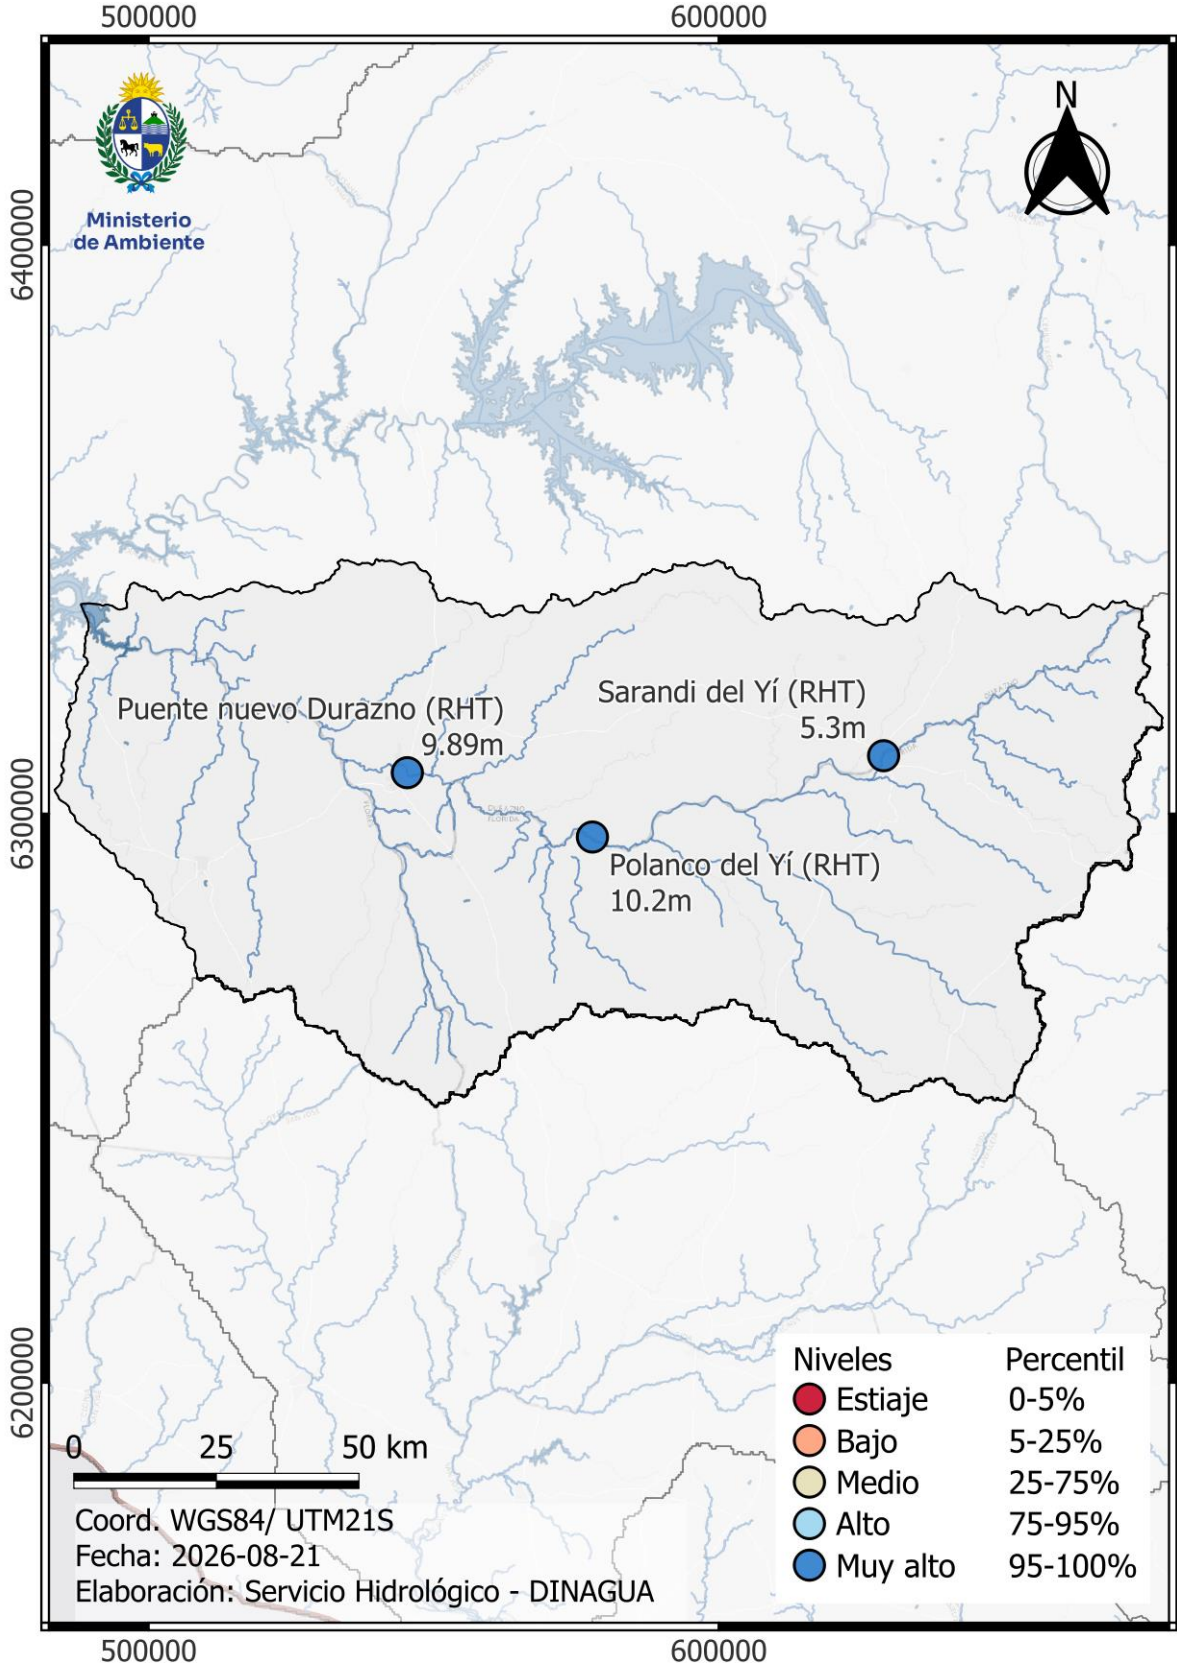


PRONÓSTICO HIDROLÓGICO CUENCA DEL RÍO CUAREIM

NIVELES REGISTRADOS				
Estación	Nivel actual (m, cero local)	Tasa incremento (cm/hora)	Tendencia	Cota de seguridad
Cuareim Río	9.35	-	Baja	-
Catalán Grande	4.79	-	Baja	-
Artigas	9.23	4.0	Sube	10.2
PRECIPITACIONES REGISTRADAS				
Los promedios de lluvia acumulada en la cuenca del río Cuareim fueron las siguientes:				
● <u>Acumulado diario</u>: 4.0 mm ● <u>Acumulado 3 días</u>: 57.0 mm ● <u>Acumulado semanal</u>: 106.0 mm				
PRECIPITACIONES PRONOSTICADAS				
Según los modelos numéricos de predicción GFS y GEFS se prevén los siguientes acumulados de lluvia sobre la cuenca				
● <u>Próximas 24 horas (Día 1)</u>: 0.0 mm ● <u>Próximos 3 días (Día 1 a 3)</u>: 0.0 mm ● <u>Próximos 7 días (Semanal)</u>: 0.0 mm				
NIVELES MÁXIMOS PRONOSTICADOS PARA LOS PRÓXIMOS DIAS				
Estación	Nivel máximo pronosticado para los próximos días		Fecha aproximada de ocurrencia	
Cuareim Río	-		-	
Catalán Grande	-		-	
Artigas	Alrededor de 9.90 m		Entre 21 y 22 agosto	
PRONÓSTICO HIDROLÓGICO				
En la noche del día 19, el río Cuareim superó la cota de aviso (8.00 m) en la ciudad de Artigas, generando inundaciones en la zona del Paseo 7 de Setiembre y alrededores. Actualmente el río se mantiene en ascenso a una tasa de incremento aproximada de 4 cm/h. Con base en los niveles alcanzados en Cuareim Río y Catalán Grande se espera que el nivel del río se acerque a la cota de seguridad (10.20 m). Si bien se espera que el nivel del río se estabilice alrededor de los 10.00 metros, no se descarta que alcance la cota de seguridad y la sobrepase levemente.				
RECOMENDACIONES AL SINAE				
Estar atentos al ascenso de río y preparados ante la posibilidad de generarse inundaciones en zona de vivienda.				

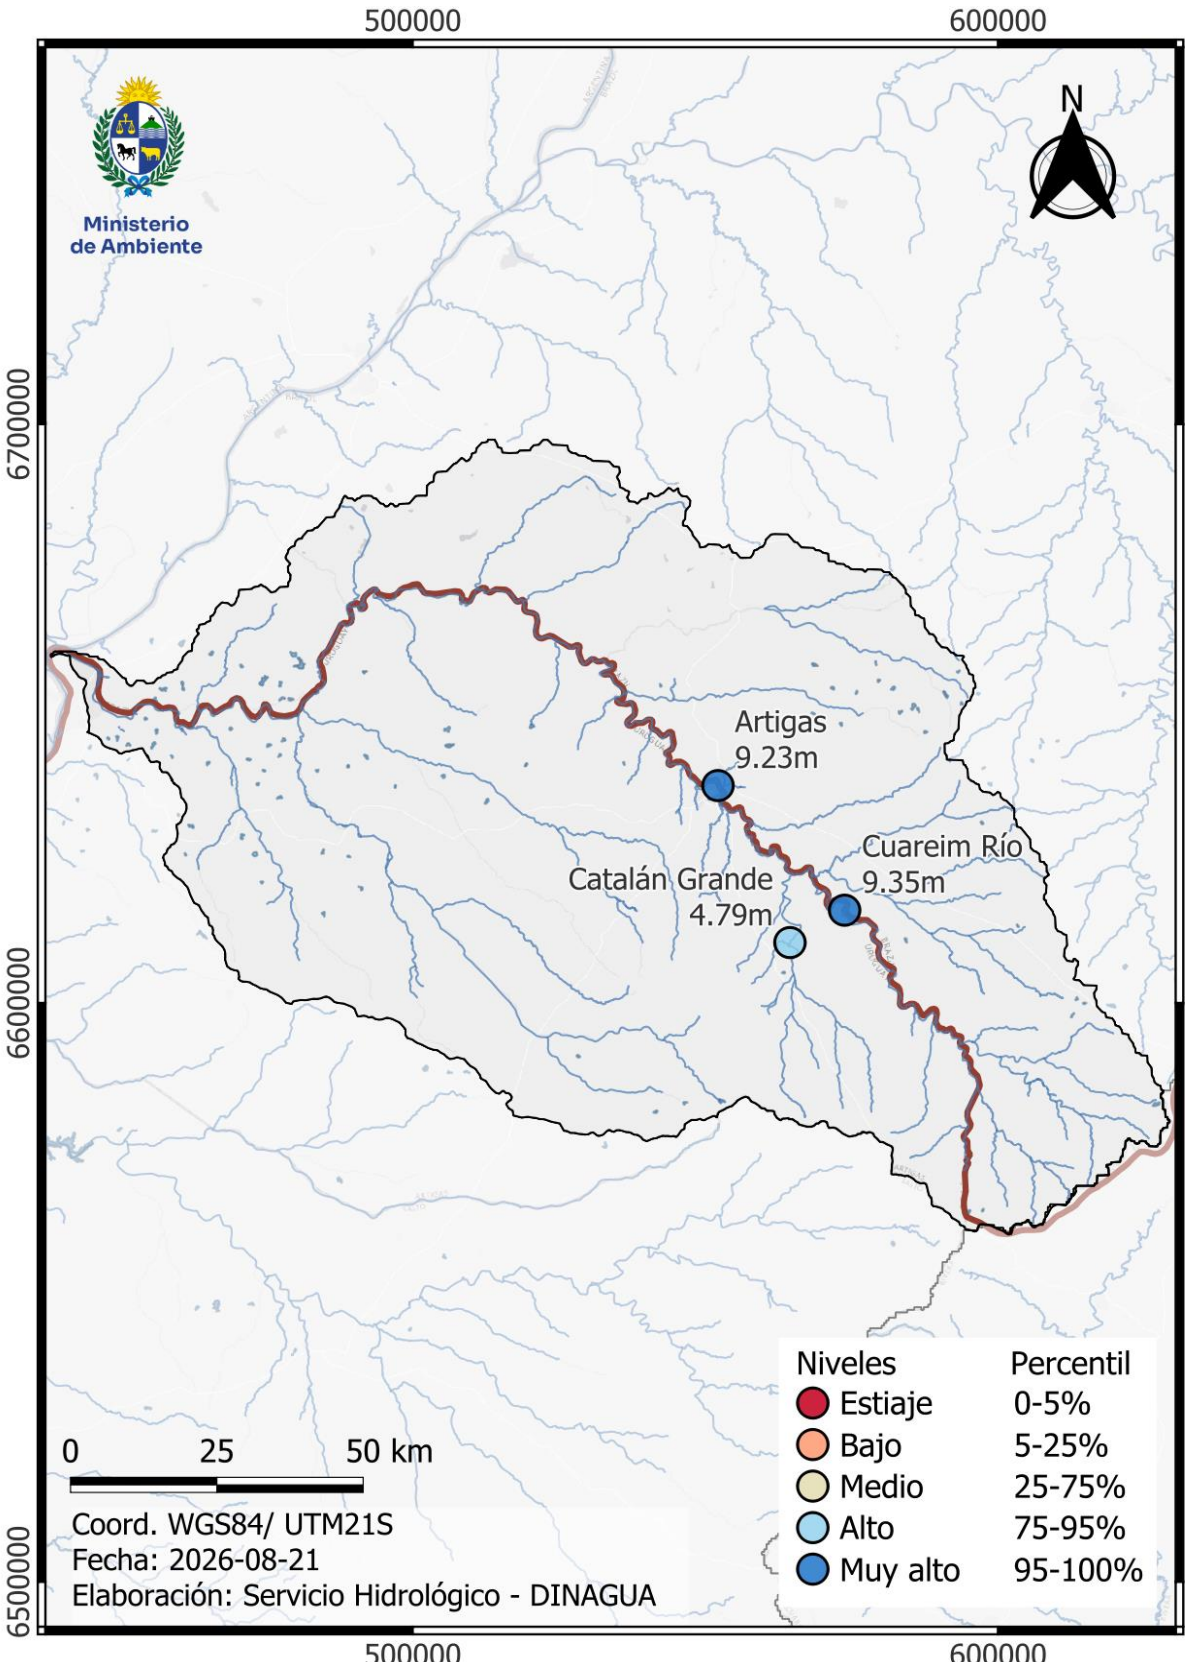

PRONÓSTICO HIDROLÓGICO CUENCA DEL RÍO NEGRO

NIVELES REGISTRADOS				
Estación	Nivel actual (m, cero local)	Tasa incremento (cm/hora)	Tendencia	Cota de seguridad
San Gregorio de Polanco	11.46	2.0	Sube	-
Puente Mercedes	6.17	1.0	Sube	6.50
CAUDALES A EVACUAR EN LAS REPRESAS DEL RÍO NEGRO				
Según el comunicado diario de UTE, se proyecta que los caudales a erogar en las centrales hidroeléctricas de Rincón del Bonete y Constitución oscilen entre 1897 y 3743 m³/s, y 4395 y 4557 m³/s, respectivamente.				
NIVELES MÁXIMOS PRONOSTICADOS PARA LOS PRÓXIMOS DIAS				
Estación	Nivel máximo pronosticado para los próximos días		Fecha aproximada de ocurrencia	
San Gregorio de Polanco	Alrededor de 12.00 m		25 de agosto	
Puente Mercedes	Alrededor de 6.10 m		22 de agosto	
PRONÓSTICO HIDROLÓGICO				
El río Negro continúa en ascenso en el tramo comprendido entre la C.H. Constitución y Mercedes. En Puente Mercedes, el nivel se encuentra actualmente en 6,17 m y continúa aumentando, asociado a los caudales erogados desde las centrales hidroeléctricas del río Negro. De acuerdo con la información de UTE, se espera que el nivel en Mercedes alcance un valor en el entorno de los 6,10 m el 22 de agosto, manteniéndose por debajo de la cota de seguridad (6,50 m). En San Gregorio de Polanco el nivel también continúa en ascenso, previéndose valores de hasta 12,55 m hacia la semana que viene.				
RECOMENDACIONES AL SINAE				
Estar atentos a los pronósticos meteorológicos que realiza el INUMET y a los próximos eventos de lluvia que se registren en la cuenca.				

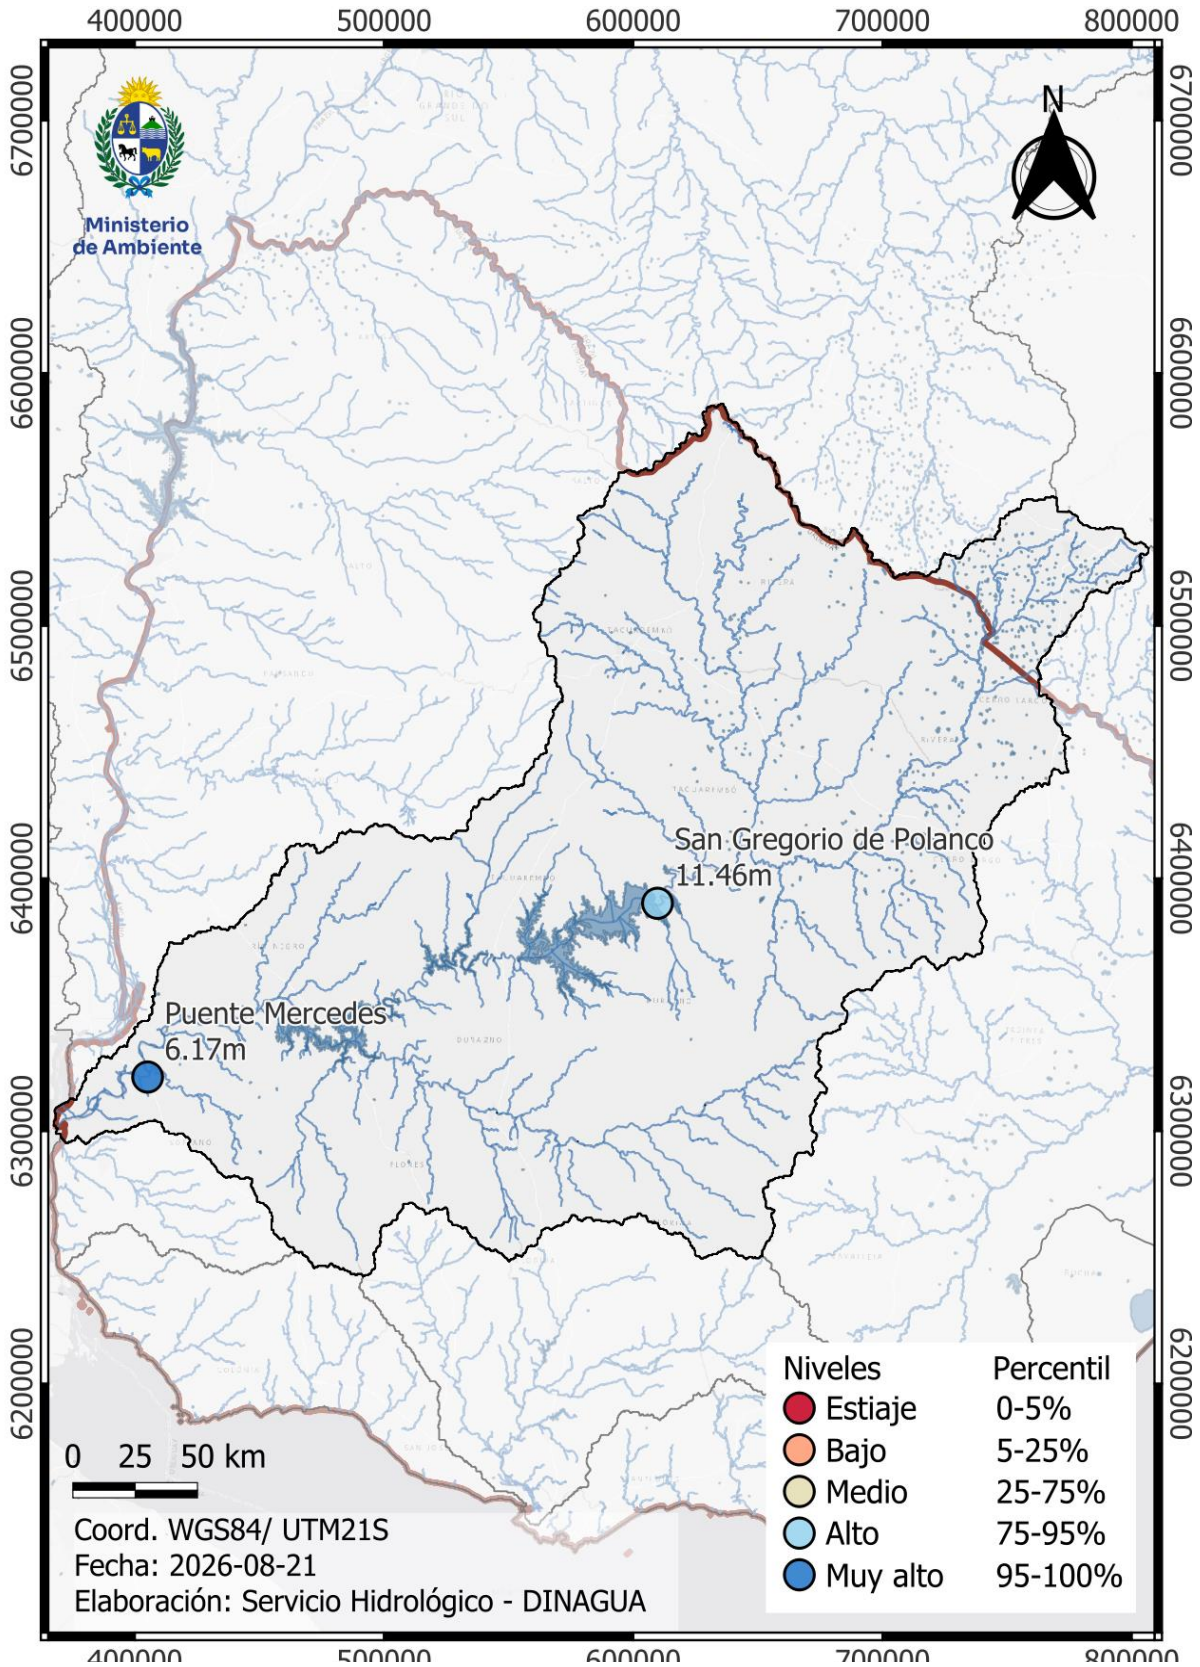

PRONÓSTICO HIDROLÓGICO CUENCA DEL RÍO OLIMAR GRANDE

NIVELES REGISTRADOS				
Estación	Nivel actual (m, cero local)	Tasa incremento (cm/hora)	Tendencia	Cota de seguridad
Treinta y Tres (R8)	7.22	-	Baja	7.00
PRECIPITACIONES REGISTRADAS				
Los promedios de lluvia acumulada en la cuenca del río Olimar fueron las siguientes:				
● <u>Acumulado diario</u>: 35.0 mm ● <u>Acumulado 3 días</u>: 70.0 mm ● <u>Acumulado semanal</u>: 242.0 mm				
PRECIPITACIONES PRONOSTICADAS				
Según los modelos numéricos de predicción GFS y GEFS, se prevén los siguientes acumulados de lluvia en la cuenca				
● <u>Próximas 24 horas (Día 1)</u>: 0.0 mm ● <u>Próximos 3 días (Día 1 a 3)</u>: 0.0 mm ● <u>Próximos 7 días (Semanal)</u>: 0.0 mm				
NIVELES MÁXIMOS PRONOSTICADOS PARA LOS PRÓXIMOS DIAS				
Estación	Nivel máximo pronosticado para los próximos días		Fecha aproximada de ocurrencia	
Treinta y Tres (R8)	-		-	
PRONÓSTICO HIDROLÓGICO				
En las últimas horas se observaron nuevas precipitaciones sobre la cuenca del río Olimar, sumando 242 mm en los últimos 5 días. Actualmente el nivel del río en la ciudad de Treinta y Tres se encuentra por encima de la cota de seguridad (7,00 m). Si bien el nivel del río Olimar se encuentra en descenso, no se espera que las precipitaciones de las últimas horas lleven el río a un nuevo ascenso. Sin embargo, se puede esperar un descenso lento, manteniendo niveles altos en los próximos días.				
RECOMENDACIONES AL SINAE				
Mantener las acciones de respuesta realizadas en la ciudad de Treinta y Tres hasta que el nivel del río descienda a su rango normal.				

