

TRACOVIA X	Nº Documento:	Fecha última revisión:	Rev:	Pág:
	PI-A-4.3.2-01	20/11/2017	00	1 de 14
Nombre del documento:				
PGA – Plan de Gestión Ambiental				

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Ruta 30, Tramo III

Acceso Este Arroyo Cuaró (61km500) - Javier de Viana (97km100)

Fecha	23/11/2018
Licitación	33/2017
Cliente	MTOP - DNV
Plazo	15 meses
Ing. Residente	Guido Saizar
Ing. Director	Juan Antonio Rodríguez

TRACOVIA X	Nº Documento:	Fecha última revisión:	Rev:	Pág:
	PI-A-4.3.2-01	20/11/2017	00	2 de 14
Nombre del documento:				
PGA – Plan de Gestión Ambiental				

1.	Objeto de la Obra	3
2.	Gestión de los componentes de la obra.....	4
3.	Procedimientos de Gestión	10
4.	Salud Ocupacional	11
5.	Seguridad	12
6.	Seguridad Vial	12
7.	Anexos.....	13
8.	Documentación.....	14

TRACOVIA X	Nº Documento:	Fecha última revisión:	Rev:	Pág:
	PI-A-4.3.2-01	20/11/2017	00	3 de 14
Nombre del documento:				
PGA – Plan de Gestión Ambiental				

1. OBJETO DE LA OBRA

El presente documento constituye el Plan de Gestión Ambiental (PGA) de la obra de **Ruta 30** (Departamento de Artigas), **Tramo III, Acceso Este Arroyo Cuaró (61km500) - Javier de Viana (97km100)**, contemplando las pautas y procedimientos concernientes a la gestión ambiental de dicha obra.

Los trabajos a realizar en la obra consisten en:

- corrección del drenaje.
- ensanche de plataforma según sección transversal tipo.
- bacheo del pavimento existente.
- escarificado, conformación y compactación de capa de base.
- colocación de una capa de material granular de recargo en espesor de 20 cm.
- colocación de una capa de base estabilizada granulométricamente de espesor 20 cm.
- ejecución de tratamiento bituminoso doble de forma tal de obtener un ancho útil de calzada de 7,20 m.
- ejecución de tratamiento bituminoso simple en 1,50 m de ancho.
- reparación en puentes.
- señalización vertical y horizontal.

TRACOVIA X	Nº Documento:	Fecha última revisión:	Rev:	Pág:
	PI-A-4.3.2-01	20/11/2017	00	4 de 14
Nombre del documento:				
PGA – Plan de Gestión Ambiental				

2. GESTIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA

Componentes de obra: Campamento/Obrador, Canteras, Plantas de producción, y hormigones.

Para la descripción y análisis de cada uno de las componentes se realizaron fichas sobre las cuales se han determinado pautas para su gestión ambiental. Estas fichas presentan la siguiente información:

- Descripción de los componentes
- Aspectos ambientales identificados
- Medidas de mitigación a ser implementadas para el manejo de dichos aspectos
- Especificaciones ambientales a ser utilizadas durante la gestión ambiental de este componente

A continuación, se presentan las fichas correspondientes de las siguientes componentes:

CODIGO	FICHAS DE COMPONENTES DE OBRA
2.1	Campamento/Obrador
2.2	Canteras
2.3	Planta Asfáltica
2.4	Planta Trituradora
2.5	Hormigones

TRACOVIA X	Nº Documento:	Fecha última revisión:	Rev:	Pág:
	PI-A-4.3.2-01	20/11/2017	00	5 de 14
Nombre del documento:				
PGA – Plan de Gestión Ambiental				

2.1 CAMPAMENTO

DESCRIPCIÓN

Infraestructura

El campamento de la obra se encuentra ubicado en la Ruta 30 102km200, del departamento de Artigas.

Servicios

El campamento de la obra requiere en su funcionamiento el suministro de los servicios básicos de un área laboral.

Comedor

Funcionará en contenedor adecuado para tal fin ubicado en obrador.

Vestuarios, baños y duchas

Funcionará en contenedor adecuado para tal fin.

Se instalarán baños químicos en frente de obra.

También están disponibles en las casas alquiladas para el personal baños y duchas.

Taller mecánico

Funcionará en contenedor adecuado para tal fin. Se consideran reparaciones sencillas.

Acopio de aceites y lubricantes

Funcionará en contenedor adecuado para tal fin, con ventilación y contención apropiada.

Laboratorio

Funcionará en contenedor adecuado para tal fin.

Agua Potable

El agua potable para el consumo del personal proviene de dispensadores de empresa SALUS.

Saneamiento

Sistema de saneamiento estático mediante pozo negro impermeable, el cual será desagotado cuando sea necesario.

Para el caso de los baños químicos, los efluentes generados serán retirados por la empresa contratada.

Residuos sólidos

En el campamento se dispondrá de tarrinas para residuos sólidos domiciliarios y residuos sólidos especiales, las que estarán pintadas de rojo y azul respectivamente para diferenciar los mismos.

TRACOVIA X	Nº Documento:	Fecha última revisión:	Rev:	Pág:
	PI-A-4.3.2-01	20/11/2017	00	6 de 14
	Nombre del documento:			
	PGA – Plan de Gestión Ambiental			

Maquinaria utilizada

- 2 palas cargadoras
- 2 motoniveladora
- 1 bulldozer
- 2 retroexcavadora
- 1 retroexcavadora combinada
- 3 equipos de compactación (suelos y asfalto)
- 12 camiones con volcadora
- 1 camión cisterna para agua
- 1 camión cisterna para combustible
- 3 vehículos utilitarios menores
- 1 camión distribuidor de asfalto
- 1 ómnibus

Se realiza un control de que todos los camiones afectados a la obra tengan el certificado del SUCTA en vigencia.

ASPECTOS AMBIENTALES PRINCIPALES

Como resultado de esta actividad se tienen como principales aspectos los siguientes:

- Generación de residuos sólidos generados en el obrador, (domiciliarios y especiales)
- Manejo de combustibles y aceites.
- Emisiones de efluentes del lavado de maquinaria, (trampa de grasas).
- Emisiones de efluentes sanitarios
- Circulación de camiones por traslado de materiales

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Se dispondrán las siguientes medidas, para la mitigación de los principales impactos derivados de la instalación y funcionamiento del campamento:

- Los residuos domésticos (generados en oficinas, comedores) se almacenan en tarrinas las que deberán estar identificadas con color rojo.
- Los residuos especiales se almacenan en tarrinas azules y serán acondicionados previamente a su disposición final.
- Se dispondrá de baldes con arena tapados en las zonas de abastecimiento de combustible y cambio de aceite.
- Los aceites se acopian en zonas con piso impermeables y diques de contención ante posibles derrames.
- Mantener humedecidas las circulaciones dentro de campamento
- La maquinaria será lavada en una zona impermeable con pendiente que conduce el efluente hacia la pileta de decantación o a una trampa de grasas.
- Los líquidos cloacales generados en el obrador, provenientes de los sanitarios serán manejados mediante fosa séptica y retiro por medio de barométrica.

TRACOVIA X	Nº Documento:	Fecha última revisión:	Rev:	Pág:
	PI-A-4.3.2-01	20/11/2017	00	7 de 14
Nombre del documento:				
PGA – Plan de Gestión Ambiental				

ESPECIFICACIONES PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL

Los lineamientos de gestión ambiental para el campamento se dan en especificaciones de gestión operativa y de gestión ambiental:

- La maquinaria tendrá un chequeo y mantenimiento según el procedimiento **Pr-A-4.4.6-03**.
- El abastecimiento del combustible y los cambios de aceite se realizará conforme a los instructivos **IT-A-4.4.6-01** y **IT-A-4.4.6-02** respectivamente.
- El lavado de la maquinaria, implicará el consumo de agua y la generación de efluentes por lo que se procederá según el instructivo **IT-A-4.4.6-03**.
- El manejo de los residuos sólidos domésticos y especiales se realizará según el procedimiento **Pr-A-4.4.6-01**, determinando las características de almacenamiento, recolección y disposición final.
- La gestión de los efluentes según el procedimiento **Pr-A-4.4.6-02**.
- El manejo de los productos químicos utilizados, desde su almacenamiento, traslado y uso, se realizará según el procedimiento **Pr-A-4.4.6-04** a los efectos de preservar la integridad de las personas, los bienes y el medio ambiente.

TRACOVIA X	Nº Documento:	Fecha última revisión:	Rev:	Pág:
	PI-A-4.3.2-01	20/11/2017	00	8 de 14
Nombre del documento:				
PGA – Plan de Gestión Ambiental				

2.2 CANTERAS

DESCRIPCIÓN

Tipo de Cantera	Ubicación
Tosca y piedra	Ruta 30 km 64.500, Padrón N° 858 de la 5° Sección Catastral del departamento de Artigas.
Tosca y piedra	Ruta 30 km 102.200, Padrón N° 1478 de la 1° Sección Catastral del departamento de Artigas.

ASPECTOS AMBIENTALES PRINCIPALES

Como resultado de esta actividad se tiene como principales aspectos los siguientes:

- Emisión de polvo y partículas
- Por la operación de máquinas hay emisiones sonoras, de gases de combustión y eventualmente de lubricantes y combustibles

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Se dispondrán las siguientes medidas:

- Mantener humedecidos los caminos de acceso a la cantera
- Efectuar el mantenimiento periódico de las máquinas de manera de mantenerlas dentro de los valores aceptables de emisión de ruido, gases, evitando derrames de lubricantes y combustibles y en condiciones seguras de operación.
- En la medida que exista, se almacena la capa de suelo fértil removida de la cantera para ser reutilizada posteriormente en la restauración de la zona.

ESPECIFICACIONES PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL

Para el caso de canteras explotadas por la empresa, se cumplirán las condiciones establecidas en la Autorización Ambiental Previa.

Si las mismas fueran canteras comerciales no corresponde dicho ítem, las medidas de gestión estarán a cargo del proveedor.

TRACOVIA X	Nº Documento:	Fecha última revisión:	Rev:	Pág:
	PI-A-4.3.2-01	20/11/2017	00	9 de 14
Nombre del documento:				
PGA – Plan de Gestión Ambiental				

2.3 PLANTA ASFÁLTICA

No aplica dicho ítem.

2.4 PLANTA TRITURADORA

DESCRIPCIÓN

La planta trituradora PT1, a instalar en el campamento es de marca Tellsmith que tiene una capacidad de producción de 110 ton/hr.

ASPECTOS AMBIENTALES PRINCIPALES

Como resultado de esta actividad se tienen como principales aspectos los siguientes:

- Emisiones de material particulado.
- Emisiones sonoras.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Se dispondrá las siguientes medidas de mitigación para minimizar la dispersión de las emisiones de material particulado derivado de la operación de la planta:

- Se instalarán aspersores en las caídas de los transportadores.

ESPECIFICACIONES PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL

No se requiere de pautas de gestión específicas.

2.5 HORMIGONES

DESCRIPCIÓN

Está previsto que los trabajos de reparación de puentes serán terciarizados con empresa de la zona.

TRACOVIA X	Nº Documento:	Fecha última revisión:	Rev:	Pág:
	PI-A-4.3.2-01	20/11/2017	00	10 de 14
Nombre del documento:				
PGA – Plan de Gestión Ambiental				

3. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

Lista de procedimientos e instructivos de trabajo, para la gestión ambiental es la siguiente:

CÓDIGO	ESPECIFICACIÓN
Pr-A-4.4.6-01	Gestión de residuos sólidos
Pr-A-4.4.6-02	Gestión de efluentes
Pr-A-4.4.6-03	Mantenimiento de maquinarias
Pr-A-4.4.6-04	Manejo de productos químicos
IT-A-4.4.6-01	Cambio de aceites
IT-A-4.4.6-02	Abastecimiento de combustibles
IT-A-4.4.6-03	Lavado de maquinaria
IT-A-4.4.6-04	Descarga y almacenamiento de cemento asfáltico

TRACOVIA X	Nº Documento:	Fecha última revisión:	Rev:	Pág:
	PI-A-4.3.2-01	20/11/2017	00	11 de 14
Nombre del documento:				
PGA – Plan de Gestión Ambiental				

4. SALUD OCUPACIONAL

- **Agua potable.** Se suministra agua potable en los diferentes frentes de trabajo.
- **Botiquines.** Se dispone de botiquines equipados con elementos de primeros auxilios en los diferentes frentes de trabajo.
- **Baños.** En el obrador se dispone de baños completos. En frente obra se utilizan baños químicos.
- **Comedores.** El obrador cuenta con contenedor destinado a comedor. En frente de obra móviles se utilizan local de resguardo.
- **Vestuarios.** En el obrador cuenta con vestuario con ducha.
- **Dormitorios temporarios.** No se dispone ya que no se prevé que los trabajadores deban pernoctar en el campamento.
- **Elementos de protección personal.** Se suministra al personal los elementos de seguridad obligatorios (casco, zapatos de seguridad, ropa de trabajo) y opcionales según la tarea que desempeña (lentes, protecciones acústicas, protección respiratoria, guantes, arnés, equipos de lluvia, etc). Los trabajadores ocupados en obras en la ruta están provistos con chalecos señalizadores de alta visibilidad y protegidos además por señales y vigías. El operario es instruido respecto al uso del elemento de seguridad que recibe, así como de la obligatoriedad de su uso.

TRACOVIA X	Nº Documento:	Fecha última revisión:	Rev:	Pág:
	PI-A-4.3.2-01	20/11/2017	00	12 de 14
Nombre del documento:				
PGA – Plan de Gestión Ambiental				

5. SEGURIDAD

- **Máquinas.** Los equipos cuentan con alarma de retroceso y adhesivos con la inscripción “Peligro. Mantengase alejado”
- **Operarios.** Los maquinistas poseen la capacitación y las autorizaciones que corresponden, (libreta, cursos, etc.), para el trabajo en las mismas.
- **Protección eléctrica.** La instalación eléctrica cuenta con puestas a tierra y llaves diferenciales termomagnética.
- **Áreas de acceso restringido.** En la planta asfáltica se delimitan las zonas restringidas a la circulación del personal por medio de cartelería con la leyenda “Solo personal autorizado” por medio de barreras físicas y/o malla de protección. La circulación dentro del campamento estará señalizada por medio de cartelería.
- **Extinguidores.** Se cuenta con extinguidores en máquinas, equipos, vehículos y en áreas del campamento en cantidad suficiente para actuar en caso de principio de incendio. Su carga es revisada periódicamente.
- **Explosivos.** Se espera no realizar voladuras, en caso de que así sea la empresa cuenta con personal habilitado.


6. SEGURIDAD VIAL

- **Personal.** El personal que trabaja en la ruta lo hace con chalecos de color fluorescente con cintas reflectivas.
- **Máquinas.** Las máquinas trabajan con las luces encendidas.
- **Zonas de trabajo.** Mientras se desarrollan los mismos están señalizadas con carteles y limitadas por conos. Asimismo, si la tarea lo requiere, se colocan banderilleros para guiar el tránsito.
- **Señalización nocturna.** Esta señalización consiste en carteles de fondo naranja reflectivo y letras negras, balizas luminosas intermitentes alimentadas por baterías y flechas luminosas, estas últimas en caso de ser necesario cerrar el tránsito media calzada. Se tiene especial cuidado de señalar cualquier desnivel o cambio de tipo de pavimento que pueda existir. Según norma de señalización vertical MTOP.

TRACOVIA X	Nº Documento:	Fecha última revisión:	Rev:	Pág:
	PI-A-4.3.2-01	20/11/2017	00	13 de 14
Nombre del documento:				
PGA – Plan de Gestión Ambiental				

7. ANEXOS

- Plano del Campamento

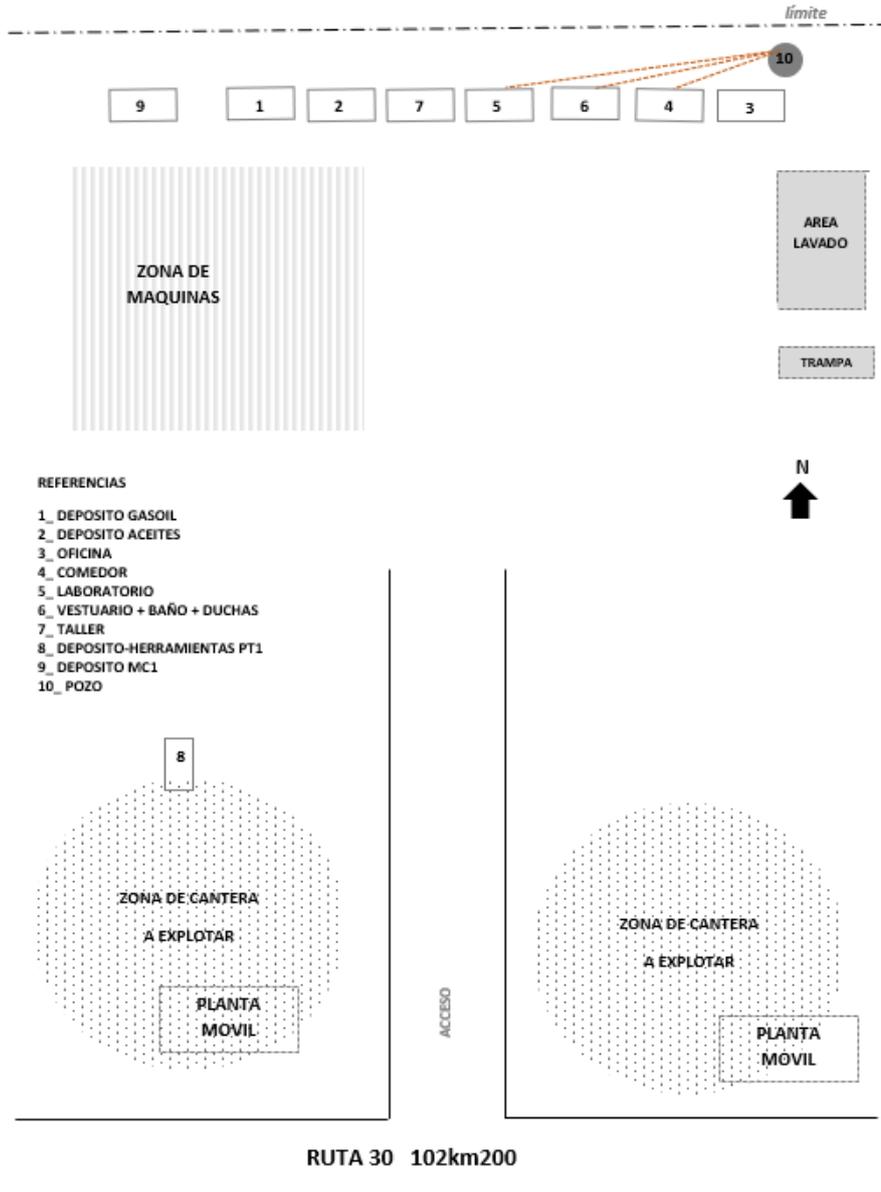

TRACOVIA X	Nº Documento:	Fecha última revisión:	Rev:	Pág:
	PI-A-4.3.2-01	20/11/2017	00	14 de 14
Nombre del documento:				
PGA – Plan de Gestión Ambiental				

8. DOCUMENTACION

Todos los procedimientos (Pr), Instructivos (IT) y Registros (Rg) mencionados anteriormente y en particular el Procedimiento de Preparación y Respuesta ante Emergencias - Plan de Contingencia Pr-A-4.4.7-01 y Gestión de las comunicaciones con partes interesadas externas Pr-A-4.4.3-01, corresponden al Sistema Integrado de Gestión de Traxpalco S.A., quedando a disposición para su consulta en la oficina de obra.

Por Traxpalco S.A.

Ing. Guido Saizar

