Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 5/2021

1	Montevideo-Progreso
2	Progreso-25 de Mayo
3	25 de Mayo-Sarandí Grande
4	Sarandí Grande-Durazno
5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración
Movimiento de Suelos	1	Terraplén/Desmonte	15+500	17+200	Excavación	La Paz	1-Feb	12-Feb	10
Movimiento de Suelos	1	Terraplén/Desmonte	25+200	30+000	Excavación	Progreso	1-Feb	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	1	Terraplén/Desmonte	23+500	25+000	Excavación	Las Piedras	1-Feb	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	1	Relleno	25+000	30+000	Relleno	Progreso	1-Feb	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	1	Relleno	+550	30+000	Relleno - Excavación para Prestamo Cantera Azul	Montevideo	1-Feb	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	31+400	35+900		E/Progreso y Juanicó	1-Feb	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	31+400	35+900		E/Progreso y Juanicó	1-Feb	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	39+500	36+000	Macromáquinas	Canelones	8-Feb	26-Feb	15
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	39+500	36+000	Macromáquinas	Canelones	8-Feb	26-Feb	15
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	48+500	51+500	Macromáquinas	Canelones	1-Feb	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	48+500	51+500	Macromáquinas	Canelones	1-Feb	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	54+000	56+500	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	1-Feb	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	54+000	56+500	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	1-Feb	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	57+800	59+800	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	1-Feb	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	57+800	59+800	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	1-Feb	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	66+500	69+000	En este intervalo hay 3 zonas entregadas que suman 720 ml	25 de Agosto	1-Feb	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	79+000	75+520		Cardal (Incluye Variantes)	1-Feb	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	79+000	75+520		Cardal (Incluye Variantes)	1-Feb	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	86+680	84+900		25 de Mayo	1-Feb	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	88+900	89+100		25 de Mayo	1-Feb	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	3	Playa de acopio de durmientes	108+000	108+000		Florida	25-Ene	19-Feb	15
Movimiento de Suelos	3	Recorte de Taludes	100+000	101+200		Florida	18-Ene	12-Feb	10
Movimiento de Suelos	3	Ejecución de cunetas	100+000	101+200		Florida	18-Ene	1-Mar	20
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	103+900	104+700		Florida	18-Ene	18-Feb	14
Movimiento de Suelos	3	PRESTAMO	101+200	101+200		Florida	25-Ene	15-Mar	20
Movimiento de Suelos	3	Tendido de capa de forma	91+400	91+680		25 de Mayo	16-Feb	18-Feb	3
Movimiento de Suelos	3	Tendido de capa de forma	91+720	91+860		25 de Mayo	23-Feb	24-Feb	2
Movimiento de Suelos	3	Retiro Capa Vegetal	107+100	107+400		Florida	1-Feb	6-Feb	5
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	105+500	105+750		Florida	18-Ene	6-Feb	5
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	108+500	108+650		Florida	25-Ene	6-Feb	5
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	107+100	107+400		Florida	9-Feb	17-Feb	7
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	107+500	108+000		Florida	22-Ene	12-Feb	10
Movimiento de Suelos	3	Perforacion en roca para voladura	120+900	121+700		Florida	1-Feb	15-Mar	20
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de Voladura	120+940	120+990		Florida	2-Feb	2-Feb	1
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de Voladura	120+990	121+030		Florida	4-Feb	4-Feb	1
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de Voladura	121+030	121+070		Florida	9-Feb	9-Feb	1
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de Voladura	121+070	121+110		Florida	11-Feb	11-Feb	1
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de Voladura	121+110	121+150		Florida	16-Feb	16-Feb	1
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de Voladura	121+150	121+190		Florida	18-Feb	18-Feb	1
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de Voladura	121+190	121+240		Florida	23-Feb	23-Feb	1
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de Voladura	121+240	121+290		Florida	25-Feb	25-Feb	1
Movimiento de Suelos	3	Desmonte / Terraplén	129+000	130+000		E/La Cruz y Pintado	25-Ene	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	3	Desmonte / Terraplén	134+000	137+000		E/La Cruz y Pintado	8-Feb	26-Feb	15
Movimiento de Suelos	3	Desmonte / Terraplén	137+500	137+700		E/La Cruz y Pintado	25-Ene	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	3	Desmonte / Terraplén	138+800	139+000		Pintado	25-Ene	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	3	Desmonte / Terraplén	141+400	143+300		E/Pintado y Sarandí Grande	25-Ene	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	3	Retiro material prestamo en Cantera	131+800			E/La Cruz y Pintado	25-Ene	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	3	Retiro material prestamo en Cantera	140+000			E/Pintado y Sarandí Grande	25-Ene	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	4	Excavaciones / Formación de terraplén	156+300	157+000		E/Sarandi y Maciel	25-Ene	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	4	Formación de Terraplén	156+600	157+000		E/Sarandí y Maciel	10-Ene	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	4	Desmonte / Terraplén	157+000	158+500	Subcontrato Grinor	E/Sarandí y Maciel	25-Ene	12-Feb	10
Movimiento de Suelos	4	Desmonte / Terraplén	163+700	164+500	Subcontrato Grinor	Variante Puntas de Maciel	25-Ene	20-Feb	15
Movimiento de Suelos	4	Desmonte / Terraplén	166+700	168+000	Subcontrato Grinor	E/Maciel y Goñi	25-Ene	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	4	Desmonte / Terraplén	168+000	170+000	Subcontrato Grinor	E/Maciel y Goñi	10-Feb	26-Feb	13
Movimiento de Suelos	4	Retiro Capa Vegetal / Desmonte	170+000	174+500	Subcontrato Diaz Álvarez	E/Maciel y Goñi	25-Ene	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	4	Desmonte / Terraplén	188+000	197+000		Durazno	10-Ene	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	4	Retiro material prestamo en Cantera	149+500		Bracco	Variante Sarandí Grande	25-Ene	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	4	Destape de cantera	150+000		Liliana B. Olariaga	Variante Sarandí Grande	25-Ene	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	4	Retiro material prestamo en Cantera	163+700		Miguel Loriero	Variante Puntas de Maciel	25-Ene	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	4	Destape de prestamo	177+000		Cortavarría	Goñi	25-Ene	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	4	Retiro material prestamo en Cantera	185+500		Vignale	Durazno	25-Ene	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	4	Retiro material prestamo en Cantera	186+000		Fabian Delgado	Durazno	25-Ene	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	4	Retiro material prestamo en Cantera	189+000		Leal	Durazno	25-Ene	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	4	Retiro material prestamo en Cantera	191+800		Antonaccio	Durazno	25-Ene	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	4	Rectificación de Caminos paralelos	149+000	197+000	Conformación de Cunetas	Variante Sarandí Grande	25-Ene	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	5	Desmonte / Terraplén	197+000	200+000		Durazno	25-Ene	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	5	Desmonte / Terraplén	205+000	Norte		E/Sta. Bernardina y C. Reyles	1-Feb	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	5	Destape/Excavación de préstamo	207+000		Préstamo Santa María - García	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	1-Feb	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	5	Destape/Excavación de préstamo	208+200		Préstamo Santa María - García 1	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	1-Feb	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	5	Destape/Excavación de préstamo	214+200		Préstamo Falcón	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	1-Feb	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	5	Desmonte / Terraplén	216+000	Norte		E/Sta. Bernardina y C. Reyles	1-Feb	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	5	Corte de Talud	229+700	Norte		E/Sta. Bernardina y C. Reyles	1-Feb	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	5	Tape/Excavación de préstamo	233+800		Préstamo Javier	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	1-Feb	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	5	Desmonte / Terraplén	238+000	Norte		Carlos Reyles	1-Feb	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	5	Tape/Excavación de préstamo	242+400		Préstamo Flores	E/C. Reyles y Centenario	1-Feb	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	5	Destape/Excavación de préstamo	247+200		Préstamo Salaberry	E/C. Reyles y Centenario	1-Feb	26-Feb	20
Movimiento de Suelos	5	Desmonte / Terraplén	250+000	Norte		E/C. Reyles y Centenario	1-Feb	26-Feb	20
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	3	Instalación de Cerco de Ley	104+000	149+000		Florida	12-Ene	31-May	20
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	3	Replanteo cerco de Ley	124+000	149+000		Florida	25-Ene	26-Feb	20
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	3	Instalación de Cerco de Ley	124+000	149+000		Florida	25-Ene	26-Feb	20
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	4	Replanteo cerco de Ley					1-Feb	26-Feb	20
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	4	Instalación de Cerco de Ley					1-Feb	26-Feb	20

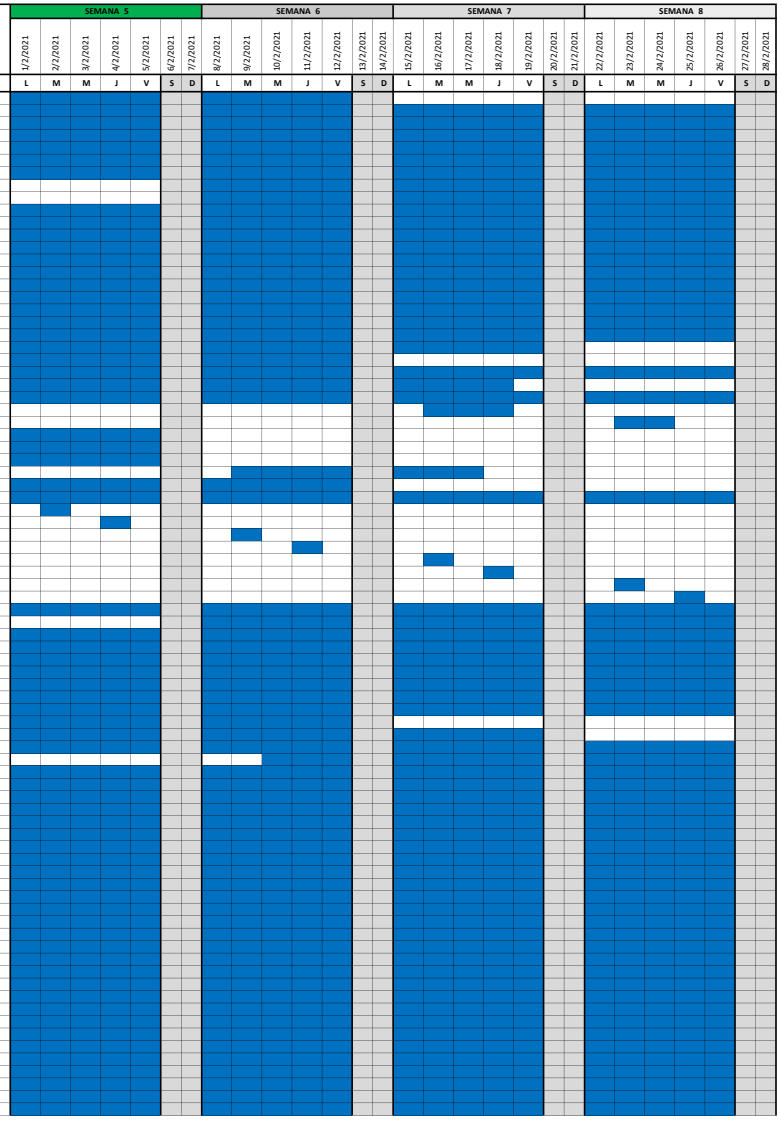

Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 5/2021

1 Montevideo-Progreso
2 Progreso-25 de Mayo
3 25 de Mayo-Sarandí Grande
4 Sarandí Grande-Durazno
5 Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración
ODT´s/Alcantarillas	1	B22 - Marco rectangular 6x6 Fernando Menck	12+347		Construcción de marco	Montevideo	1-Feb	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	1	B039 - Marco prefabricado 4x2	20+684		Sub Contrato_ Hormigón de Limpieza- Construcción	Las Piedras	1-Feb	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	2	C42 - Marco 3 - 1,5x1,5	61+080			25 de Agosto	1-Feb	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	2	C926 - Tubo 1 Ø 1000 mm	74+087			Cardal (Incluye Variantes)	1-Feb	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	2	C60 - Tubo 1 Ø 1000 mm	74+504			Cardal (Incluye Variantes)	1-Feb	5-Feb	5
ODT´s/Alcantarillas	2	C61 - Tubo 2 Ø 800 mm	74+858			Cardal (Incluye Variantes)	1-Feb	5-Feb	5
ODT´s/Alcantarillas	2	C63 - Tubo 1 Ø 1000 mm	75+350			Cardal (Incluye Variantes)	1-Feb	5-Feb	5
ODT´s/Alcantarillas	2	C64 - Marco 1 - 1,0x1,0	75+719			Cardal (Incluye Variantes)	1-Feb	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	2	C65 - Tubo 1 Ø 800 mm	76+859			Cardal (Incluye Variantes)	1-Feb	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	2	B70 - Marco 1 - 4x2	52+924		Subcontrato Ventus	Variante Santa Lucía	1-Feb	19-Feb	15
ODT´s/Alcantarillas	2	B61 - Marco 1 - 6x2	44+306		Subcontrato Ventus	Canelones	15-Feb	26-Feb	10
ODT´s/Alcantarillas	2	B60 - Marco 1 - 6x2	43+430		Subcontrato Ventus	Canelones	8-Feb	26-Feb	15
ODT´s/Alcantarillas	2	B59 - Marco 1 - 6x2	41+763		Subcontrato Ventus	Canelones	1-Feb	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	2	B53 - Marco 1 - 6x2	33+643		Subcontrato Ventus	E/Progreso y Juanicó	1-Feb	12-Feb	10
ODT´s/Alcantarillas	2	B52 - Marco 1 - 6x2	32+499		Subcontrato Ventus	E/Progreso y Juanicó	1-Feb	12-Feb	10
ODT´s/Alcantarillas	3	C079- Tubo 3 Ø 1200 mm	92+077		Encofrado de cabezales	25 de Mayo	25-Ene	5-Feb	5
ODT´s/Alcantarillas	3	B94- Tubo 3 Ø 1200 mm	98+183		Hormigonado piso Aletas	Berrondo	1-Feb	5-Feb	5
ODT´s/Alcantarillas	3	C098- Tubo 3 Ø 1200 mm	105+343		Encofrado de Muros y Losa Superior de Marco	Florida	25-Ene	5-Feb	5
ODT´s/Alcantarillas	3	C098- Tubo 3 Ø 1200 mm	105+343		Hormigonado de muros y losa superior de marco	Florida	8-Feb	13-Feb	5
ODT´s/Alcantarillas	3	C910- Tubo 3 Ø 1200 mm	105+343		Aletas	Florida	1-Feb	5-Feb	5
ODT´s/Alcantarillas	3	C102- Marco 3- 0,8x0,8	106+771		Hormigonado laterales	Florida	3-Feb	5-Feb	3
ODT´s/Alcantarillas	3	C109- Tubo 2 Ø 800 mm	112+646		Armado de cabezales	Florida	22-Feb	26-Feb	5
ODT´s/Alcantarillas	3	C111- Tubo 3 Ø 800 mm	114+543		Llenado de Aleta	Florida	28-Ene	1-Feb	1
ODT´s/Alcantarillas	3	C116- Tubo 2 Ø 800 mm	118+307		Encofrado y hormigonado aletas	Florida	8-Feb	13-Feb	5
ODT´s/Alcantarillas	3	C122- Tubo 1 Ø 800 mm	125+291		Hormigón de limpieza	La Cruz	5-Feb	9-Feb	3
ODT´s/Alcantarillas	3	C128- Tubo 3 Ø 800 mm	129+392		Armado y enconfrado hormigón de limpieza	E/La Cruz y Pintado	28-Ene	3-Feb	3
ODT´s/Alcantarillas	3	C128- Tubo 3 Ø 800 mm	129+392		Hormigonado hormigón limpieza	E/La Cruz y Pintado	3-Feb	8-Feb	4
ODT´s/Alcantarillas	3	C902 - Tubo Ø 800 mm	124+600		Construcción	Florida	25-Ene	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	3	C122 - Tubo Ø 800 mm	125+291		Construcción	La Cruz	25-Ene	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	3	C130 - Tubo 2 bocas Ø 1200 mm	131+413		Construcción	E/La Cruz y Pintado	25-Ene	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	3	C904 - Tubo Ø 800 mm	136+356		Construcción	E/La Cruz y Pintado	25-Ene	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	3	C134 - Tubo Ø 800 mm	137+225		Construcción	E/La Cruz y Pintado	25-Ene	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	4	B108 - 2-Marco 1,5x1,5	156+715		Construcción	E/Sarandí y Maciel	25-Ene	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C159 - Tubo Ø 1200 mm	157+116		Construcción	E/Sarandí y Maciel	25-Ene	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	4	B110 - Marco 2 bocas 1,5x1,5	159+193		Construcción	E/Sarandí y Maciel	25-Ene	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C952 - Tubo Ø 800 mm	160+972		Construcción	E/Sarandí y Maciel	25-Ene	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C998 - Tubo Ø 800 mm	162+660		Construcción	E/Sarandí y Maciel	25-Ene	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	4	B111 - Marco 6x3	165+234		Construcción (Subcontrato Gofinal)	Variante Puntas de Maciel	25-Ene	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	4	B112 - 2 Marcos 1,5x1,5	165+323		Construcción	Variante Puntas de Maciel	25-Ene	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C168 - Tubo Ø 800 mm	166+741		Construcción	E/Maciel y Goñi	25-Ene	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C169 - Marco 1,5x1,5	167+207		Construcción	E/Maciel y Goñi	25-Ene	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C170 - Tubo Ø 800 mm	167+479		Construcción	E/Maciel y Goñi	25-Ene	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C171 - Tubo Ø 800 mm	168+080		Construcción	E/Maciel y Goñi	25-Ene	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C172 - Tubo Ø 1200 mm	168+736		Construcción	E/Maciel y Goñi	25-Ene	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C291- Marco 1,5x1,5	169+396		Construcción	E/Maciel y Goñi	25-Ene	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C956 - Tubo 2 bocas Ø 1000 mm	173+121		Construcción	E/Maciel y Goñi	25-Ene	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C176 - Tubo Ø 800 mm	173+782		Construcción	E/Maciel y Goñi	25-Ene	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C177 - Tubo Ø 1000 mm	174+655		Construcción	E/Maciel y Goñi	25-Ene	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C178 - Tubo Ø 1000 mm	175+455		Construcción	E/Maciel y Goñi	25-Ene	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C181 - Tubo Ø 1200 mm	176+909		Construcción	E/Maciel y Goñi	25-Ene	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C959 - Tubo Ø 800 mm	177+944		Construcción	Goñi	25-Ene	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C960 - Tubo Ø 1000 mm	178+438		Construcción	E/Goñi y Durazno	25-Ene	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C182 - Marco 1,5x1,5	178+857		Terminaciones	E/Goñi y Durazno	25-Ene	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C183 - Marco 1,5x1,5	179+507		Terminaciones	E/Goñi y Durazno	25-Ene	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C184 - 2 Marcos 1,5x1,5	179+689		Construcción	E/Goñi y Durazno	25-Ene	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C185 - Marco 1,5x1,5	180+669		Terminaciones	E/Goñi y Durazno	25-Ene	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C189 - Marco 1,5x1,5	183+340		Terminaciones	Durazno	25-Ene	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C191a - Marco 1,5x1,5	185+107		Construcción	Durazno	25-Ene	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C197 - Tubo 2 bocas Ø 1000 mm	189+287		Construcción	Durazno	25-Ene	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C198 - Tubo Ø 800 mm	189+950		Construcción	Durazno	25-Ene	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C971 - Tubo Ø 800 mm	190+620		Construcción	Durazno	25-Ene	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C966 - Tubo Ø 1000 mm	191+419		Construcción	Durazno	25-Ene	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C290 - Tubo Ø 800 mm	191+616		Construcción	Durazno	25-Ene	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C200 - Marco 1x1	193+986		Construcción	Durazno	25-Ene	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C967 - Tubo Ø 800 mm	194+849		Construcción	Durazno	25-Ene	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	5	B130 - Tubo hormigón dim 1.2	214+773		Excavación/Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	1-Feb	26-Feb	20
ODT´s/Alcantarillas	5	B132 - Tubo hormigón dim 1.0	217+015		Cabezales	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	1-Feb	5-Feb	5
ODT´s/Alcantarillas	5	B144 - Tubo hormigón dim 1.2	227+928		Excavación/Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	8-Feb	26-Feb	15
ODT´s/Alcantarillas	5	C238 - Tubo hormigón dim 1.2	228+343		Excavación/Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	3-Feb	26-Feb	18
ODT´s/Alcantarillas	5	C249 - Marco 1,5 x 1,5	235+845		Cabezales	Carlos Reyles	1-Feb	12-Feb	10
ODT´s/Alcantarillas	5	C250 - Marco 1,5 x 1,5	236+124		Cabezales	Carlos Reyles	1-Feb	19-Feb	15
ODT´s/Alcantarillas	5	C265 - Tubo hormigón dim 0.8	243+596		Cabezales	E/C. Reyles y Centenario	1-Feb	12-Feb	10
ODT´s/Alcantarillas	5	C278 - Tubo hormigón dim 1.0	258+279		Construcción	Centenario-Paso de los Toros	1-Feb	19-Feb	15
ODT´s/Alcantarillas	5	C280 - Tubo hormigón dim 1.0	258+860		Construcción	Centenario-Paso de los Toros	1-Feb	12-Feb	10
Paso de Fauna	3	B928- Paso ganado 3x2	92+100		Armado y llenado estructura	25 de Mayo	1-Feb	26-Feb	20
Paso de Fauna	3	B920 - Marco 3x2	142+075		Construcción	E/Pintado y Sarandí Grande	25-Ene	26-Feb	20
Paso de Fauna	4	B929 - Marco 3x2	162+188		Construcción (Subcontrato Gofinal)	E/Sarandí y Maciel	25-Ene	26-Feb	20
Paso de Fauna	4	B930 - Marco 3x2	165+110		Construcción (Subcontrato Gofinal)	Variante Puntas de Maciel	25-Ene	26-Feb	20
Paso de Fauna	4	B914 - Marco 4x3	183+300		Construcción	Durazno	25-Ene	26-Feb	20
Paso de Fauna	4	B915 - Marco 6x4	185+751		Construcción (Subcontrato Gofinal)	Durazno	25-Ene	26-Feb	20



Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 5/2021

1	Montevideo-Progreso
2	Progreso-25 de Mayo
3	25 de Mayo-Sarandí Grande
4	Sarandí Grande-Durazno
5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración
Puentes	1	Puente ferroviario - 2 Vías 15 m - VIAF - B045	23+754	23+754	Demolición- Excavacion	Progreso	1-Feb	3-Feb	3
Puentes	1	Puente ferroviario - 2 Vías 15 m - VIAF - B045	23+754	23+754	Construcción	Progreso	5-Feb	26-Feb	16
Puentes	1	Puente vigas prefabricadas 18m 2 vías B27	17+933		Acondicionamiento Armado de Armaduras Estirbos Sur y Norte	La Paz	1-Feb	26-Feb	20
Puentes	2		42+200		Prefabricación Prelosas	Canelones	1-Feb	26-Feb	20
Puentes	2	B54	34+551		Pilotes	Juanicó	15-Feb	26-Feb	10
Puentes	2	B56	39+045		Estructura (Ferralia)	Canelones	8-Feb	26-Feb	15
Puentes	2	B57	40+547		Estructura (Ferralia)	Canelones	1-Feb	26-Feb	20
Puentes	2	B63	48+222		Pilotes	Canelones	1-Feb	5-Feb	5
Puentes	2	B63	48+222		Estructura	Canelones	1-Feb	26-Feb	20
Puentes	2	B64	48+975		Descabezado pilotes	Canelones	1-Feb	5-Feb	5
Puentes	2	B64	48+975		Estructura	Canelones	8-Feb	26-Feb	15
Puentes	2	B65	49+890		Pilotes	Canelones	1-Feb	12-Feb	10
Puentes	2	B68	51+013		Estructura	Canelones	1-Feb	26-Feb	20
Puentes	2	B69	51+854		Pilotes	Variante Santa Lucía	8-Feb	12-Feb	5
Puentes	2	B72	54+976		Vigas postensadas	Variante Santa Lucía	1-Feb	26-Feb	20
Puentes	2	B73	55+544		Estructura	Variante Santa Lucía	25-Ene	26-Feb	20
Puentes	2	B75	56+160		Estructura	Variante Santa Lucía	25-Ene	26-Feb	20
Puentes	3	B087	89+145		Armadura (bases) - Estribo 1 -2 y Pila	25 de Mayo	8-Feb	26-Feb	15
Puentes	3	B087	89+145		Llenado (bases) - Estribo 1 -2 y Pila	25 de Mayo	15-Feb	26-Feb	10
Puentes	3	B089	91+291		Armado y llenado (muro) - Estribo 1	25 de Mayo	8-Feb	26-Feb	15
Puentes	3	B089	91+291		Armadura y llenado (dintel y aletas) -Pila y Estribo 2	25 de Mayo	1-Feb	10-Feb	8
Puentes	3	B095	98+845		Armadura y llenado (muros y aletas) -Estribo 1 y 2	Berrondo	1-Feb	5-Feb	5
Puentes	3	B095	98+845		Trabajos en mesetas - Estribo 1 y 2	Berrondo	8-Feb	12-Feb	5
Puentes	3	B095	98+845		Colocacion de vigas	Berrondo	15-Feb	17-Feb	3
Puentes	3	B098	103+522		Armado y montaje de estructura	Florida	25-Ene	19-Feb	15
Puentes	3	B105 - Puente Ferroviario	131+165		Colocación de Vigas - Armadura y llenado Aletas	E/La Cruz y Pintado	25-Ene	12-Feb	10
Puentes	4	B109 - Puente Ferroviario	158+484		Plataforma para Vigas	E/Sarandí y Maciel	25-Ene	26-Feb	20
Puentes	4	B178 - Puente Ferroviario	185+032		Pilas - Dinteles	Durazno	25-Ene	26-Feb	20
Puentes	5	B147 - Vigas prefabricadas de 12m	239+353		Construcción	E/C. Reyles y Centenario	1-Feb	26-Feb	20
Puentes	5	B156 - Vigas prefabricadas de 12m	254+672		Excavación/Construcción	E/C. Reyles y Centenario	15-Feb	26-Feb	10
Puentes	5	B157 - Vigas prefabricadas de 9m	254+833		Excavación/Construcción	E/C. Reyles y Centenario	1-Feb	26-Feb	20



Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 5/2021

1	Montevideo-Progreso
2	Progreso-25 de Mayo
3	25 de Mayo-Sarandí Grande
4	Sarandí Grande-Durazno
5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Duración
Demoliciones	1	Demoliciones	4+894	4+894	Padron 41535 (Marcelino Diaz)	Montevideo	16-Feb	19-Feb	4
Demoliciones	1	Demoliciones	4+894	4+894	Padron 93410 (Invasion Marcelino Diaz)	Montevideo	15-Feb	15-Feb	1
Demoliciones	1	Demoliciones	3+008	3+040	Padron 56379-56380 (San Ramon)	Montevideo	8-Feb	12-Feb	5
Demoliciones	1	Demoliciones	20+000	20+000	Padrón 17929 (muro + deposito)	Trinchera Las Piedras	1-Feb	5-Feb	5
Demoliciones	1	Demoliciones	20+000	20+000	Padrón 210 (Muro CRAMI)	Trinchera Las Piedras	8-Feb	19-Feb	10
Demoliciones	2	Demoliciones	75+737	75+737	Padron 311 (Cardal)	Cardal (Incluye Variantes)	8-Feb	9-Feb	2
Demoliciones	3	Demoliciones	106+442	106+442	Galpon Padron 6518	Florida	15-Feb	17-Feb	3
Demoliciones	3	Demoliciones	106+440	106+440	Casa Padron 2962	Florida	18-Feb	19-Feb	2
Servicios Afectados	1	Frente Cateos	20+000	45+000	MC - ANTEL/UTE	Trinchera Las Piedras	1-Oct	26-Feb	20
Servicios Afectados	1	Frente Cateos	4+000	40+000	RR - OSE/IMM/ANCAP	Trinchera Capurro	22-Jun	26-Feb	20
Servicios Afectados	1	Frente Cateos	+726	40+000	ES - UTE	Montevideo	22-Jun	26-Feb	20
Servicios Afectados	1	Gas	4+407	4+407	Ciemsa	Montevideo	9-Feb	16-Feb	6
Servicios Afectados	1	Gas	4+664	4+664	Ciemsa	Montevideo	15-Feb	22-Feb	6
Servicios Afectados	1	Gas	9+311	9+311	Ciemsa	Montevideo	4-Feb	10-Feb	5
Servicios Afectados	1	Gas	3+003	3+003	Gofinal	Montevideo	15-Feb	18-Feb	4
Servicios Afectados	1	Gas	3+625	3+625	Gofinal	Trinchera Capurro	8-Feb	12-Feb	5
Servicios Afectados	1	Gas	4+869	4+869	Gofinal	Montevideo	1-Feb	6-Feb	5
Servicios Afectados	1	Gas	7+921	7+921	Gofinal	Montevideo	4-Feb	9-Feb	4
Servicios Afectados	1	Gas	11+300	11+300	Gofinal	Montevideo	21-Ene	4-Feb	4
Servicios Afectados	1	Gas	12+100	12+100	Gofinal	Montevideo	1-Feb	3-Feb	3
Servicios Afectados	1	Gas	19+107	19+107	Gofinal	Trinchera Las Piedras	8-Feb	15-Feb	6
Servicios Afectados	1	Gas	19+955	19+955	Gofinal	Trinchera Las Piedras	12-Feb	19-Feb	6
Servicios Afectados	2	Gas	42+265	42+265	Gofinal	Canelones	19-Feb	26-Feb	6
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	+893	+893	Electrosistemas	Montevideo	1-Feb	11-Feb	9
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	4+683	4+683	Electrosistemas	Montevideo	1-Feb	26-Feb	20
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	4+863	4+863	Electrosistemas	Montevideo	1-Feb	26-Feb	20
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	4+888	4+888	Electrosistemas	Montevideo	1-Feb	26-Feb	20
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	8+849	8+849	Electrosistemas	Montevideo	18-Ene	2-Feb	2
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	12+744	12+744	Electrosistemas	Montevideo	12-Ene	1-Feb	1
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	15+997	15+997	Electrosistemas	La Paz	1-Feb	16-Feb	12
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	19+233	19+233	Electrosistemas	Trinchera Las Piedras	1-Feb	6-Feb	5
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	24+499	24+499	Electrosistemas	Progreso	1-Feb	16-Feb	12
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	25+857	25+857	Electrosistemas	Progreso	22-Ene	6-Feb	5
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	26+878	26+878	Electrosistemas	Progreso	18-Ene	2-Feb	2
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	27+485	27+485	Electrosistemas	Progreso	1-Feb	9-Feb	7
Servicios Afectados	2	Telecomunicaciones	61+737	61+737	Oriteceno	25 de Agosto	25-Ene	15-Feb	11
Servicios Afectados	4	Telecomunicaciones	196+393	196+393	Oriteceno	Durazno	15-set	15-Feb	11
Servicios Afectados	4	Telecomunicaciones	197+955	197+955	Cietel	Durazno	1-Feb	5-Feb	5
Servicios Afectados	4	Telecomunicaciones	198+220	198+220	Cietel	Durazno	8-Feb	15-Feb	6
Servicios Afectados	5	Telecomunicaciones	256+349	256+349	Cietel	Desvio UPM 2	1-Feb	5-Feb	5
Servicios Afectados	5	Telecomunicaciones	257+896	257+896	Cietel	Desvio UPM 2	1-Feb	5-Feb	5
Servicios Afectados	5	Telecomunicaciones	261+301	261+301	Cietel	Centenario-Paso de los Toros	16-Feb	18-Feb	3



Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 5/2021

1	Montevideo-Progreso
2	Progreso-25 de Mayo
3	25 de Mayo-Sarandí Grande
4	Sarandí Grande-Durazno
5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración
Servicios Afectados	3	Agua Potable y Saneamiento	104+114	104+114	Insaco	Florida	15-Ene	1-Feb	1
Servicios Afectados	3	Agua Potable y Saneamiento	104+115	104+115	Insaco	Florida	15-Ene	3-Feb	3
Servicios Afectados	3	Agua Potable y Saneamiento	104+397	104+397	Insaco	Florida	21-Ene	5-Feb	5
Servicios Afectados	3	Agua Potable y Saneamiento	106+477	106+477	Insaco	Florida	14-set	11-Feb	9
Servicios Afectados	3	Agua Potable y Saneamiento	106+479	106+479	Insaco	Florida	10-set	11-Feb	9
Servicios Afectados	3	Agua Potable y Saneamiento	107+980	107+980	Insaco	Florida	1-Feb	8-Feb	6
Servicios Afectados	3	Agua Potable y Saneamiento	111+701	111+701	Insaco	Florida	4-Feb	9-Feb	4
Servicios Afectados	3	Agua Potable y Saneamiento	111+702	111+702	Insaco	Florida	3-Feb	10-Feb	6
Servicios Afectados	3	Agua Potable y Saneamiento	111+800	111+800	Insaco	Florida	26-Oct	3-Feb	3
Servicios Afectados	3	Agua Potable y Saneamiento	111+700	111+700	Insaco	Florida	15-Dic	4-Feb	4
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	195+505	195+505	Insaco	Durazno	18-Feb	28-Feb	7
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	195+845	195+845	Insaco	Durazno	21-Feb	10-Mar	5
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	196+967	196+967	Insaco	Durazno	18-Feb	10-Mar	7
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	196+975	196+975	Insaco	Durazno	23-Feb	15-Mar	4
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	197+275	197+275	Insaco	Durazno	19-Feb	1-Mar	6
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	197+956	197+956	Insaco	Durazno	18-Feb	28-Feb	7
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	3+001	3+001	Saceem	Montevideo	8-Feb	20-Feb	10
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	3+004	3+004	Saceem	Montevideo	8-Feb	20-Feb	10
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	3+005	3+005	Saceem	Montevideo	8-Feb	20-Feb	10
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	3+885	3+885	Saceem	Trinchera Capurro	3-Feb	10-Mar	18
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	19+240	19+240	Saceem	Trinchera Las Piedras	10-Nov	22-Feb	16
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	19+241	19+241	Saceem	Trinchera Las Piedras	10-Nov	22-Feb	16
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	19+300	19+300	Saceem	Trinchera Las Piedras	30-Nov	22-Feb	16
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	1+145	1+145	Ciemsa	Montevideo	8-Feb	13-Feb	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	1+245	1+245	Ciemsa	Montevideo	8-Feb	13-Feb	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	1+354	1+354	Ciemsa	Montevideo	11-Feb	14-Feb	2
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	1+355	1+355	Ciemsa	Montevideo	11-Feb	14-Feb	2
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	2+235	2+235	Ciemsa	Montevideo	4-Feb	9-Feb	4
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	9+798	9+798	Ciemsa	Montevideo	3-Feb	13-Feb	8
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	9+276	9+276	Ciemsa	Montevideo	3-Feb	13-Feb	8
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	4+777	4+777	Ciemsa	Montevideo	20-Feb	26-Feb	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	6+460	6+460	Ciemsa	Montevideo	24-Feb	1-Mar	3
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	4+697	4+697	Ciemsa	Montevideo	3-Feb	8-Feb	4
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	4+724	4+724	Ciemsa	Montevideo	4-Feb	9-Feb	4
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	5+461	5+461	Ciemsa	Montevideo	8-Feb	13-Feb	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	5+098	5+098	Ciemsa	Montevideo	11-Feb	16-Feb	4
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	5+099	5+099	Ciemsa	Montevideo	11-Feb	16-Feb	4
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	5+131	5+131	Ciemsa	Montevideo	15-Feb	20-Feb	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	5+663	5+663	Ciemsa	Montevideo	17-Feb	22-Feb	4
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	5+752	5+752	Ciemsa	Montevideo	19-Feb	24-Feb	4
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	5+770	5+770	Ciemsa	Montevideo	23-Feb	28-Feb	4
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	23+600	23+600	Ciemsa	Progreso	8-Feb	13-Feb	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	23+660	23+660	Ciemsa	Progreso	10-Feb	15-Feb	4
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	21+940	21+940	Insaco	Las Piedras	8-Feb	13-Feb	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	7+913	7+913	Insaco	Montevideo	1-Feb	11-Feb	9
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	6+966	6+966	Insaco	Montevideo	29-Ene	8-Feb	6
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	1+133	1+133	Insaco	Montevideo	1-Feb	8-Feb	6
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	5+106	5+106	Insaco	Montevideo	1-Feb	8-Feb	6
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	6+119	6+119	Insaco	Montevideo	8-Feb	23-Feb	12
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	6+458	6+458	Insaco	Montevideo	8-Feb	28-Feb	15
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	16+478	16+478	Insaco	La Paz	8-Feb	15-Feb	6
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	20+194	20+194	Ventus	Trinchera Las Piedras	25-Ene	24-Jun	20
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	34+900	34+900	Gofinal	Juanicó	20-Ene	9-Feb	7
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	35+433	35+433	Gofinal	Juanicó	15-Ene	4-Feb	4
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	35+434	35+434	Gofinal	Juanicó	15-Ene	4-Feb	4
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	35+554	35+554	Gofinal	Juanicó	15-Ene	4-Feb	4
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	44+988	44+988	Gofinal	Canelones	24-Feb	3-Mar	3
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+263	42+263	Gofinal	Canelones	24-Feb	4-Mar	3
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	8+147	8+147	Gofinal	Montevideo	25-Feb	2-Mar	2
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	26+041	26+041	Gofinal	Progreso	8-Feb	18-Feb	9
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	25+800	25+800	Gofinal	Progreso	12-Feb	19-Feb	6
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	15+701	15+701	Gofinal	La Paz	1-Feb	16-Feb	12
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	15+895	15+895	Gofinal	La Paz	18-Ene	6-Feb	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	10+125	10+125	Gofinal	Montevideo	20-Feb	27-Feb	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	10+626	10+626	Gofinal	Montevideo	1-Feb	7-Feb	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	11+048	11+048	Gofinal	Montevideo	13-Feb	19-Feb	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	11+164	11+164	Gofinal	Montevideo	22-Feb	25-Feb	4
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	11+265	11+265	Gofinal	Montevideo	7-Feb	13-Feb	5



Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 5/2021

1	Montevideo-Progreso
2	Progreso-25 de Mayo
3	25 de Mayo-Sarandí Grande
4	Sarandí Grande-Durazno
5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+726	+726	SACEEM	Montevideo	12-Feb	19-Feb	6
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+942	+942	SACEEM	Montevideo	12-Feb	19-Feb	6
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+229	1+229	SARLUX	Montevideo	25-Ene	20-Feb	15
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+323	1+323	SARLUX	Montevideo	3-Feb	10-Feb	6
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+420	1+420	SACEEM	Montevideo	3-Feb	20-Feb	13
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+428	1+428	SACEEM	Montevideo	3-Feb	5-Feb	3
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+429	1+429	SARLUX	Montevideo	9-Nov	5-Feb	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+433	1+433	SARLUX	Montevideo	30-Ene	10-Mar	20
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+448	1+448	SACEEM	Montevideo	3-Feb	25-Feb	17
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+491	1+491	SARLUX	Montevideo	9-Nov	5-Feb	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+522	1+522	SARLUX	Montevideo	1-Feb	20-Feb	15
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+540	1+540	SACEEM	Montevideo	3-Feb	15-Feb	9
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+615	1+615	SACEEM	Montevideo	3-Feb	5-Feb	3
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+652	1+652	SARLUX	Montevideo	9-Nov	5-Feb	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+860	1+860	SACEEM	Montevideo	1-Feb	20-Feb	15
Servicios Afectados	1	Eléctrica	3+338	3+338	SACEEM	Trinchera Capurro	1-Feb	23-Feb	17
Servicios Afectados	1	Eléctrica	3+806	3+806	SACEEM	Trinchera Capurro	25-Ene	15-Mar	20
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+307	4+307	SACEEM	Montevideo	3-Feb	23-Feb	15
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+404	4+404	SARLUX	Montevideo	3-Feb	23-Feb	15
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+674	4+674	SARLUX	Montevideo	20-Ene	20-Feb	15
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+675	4+675	SARLUX	Montevideo	30-Ene	18-Feb	14
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+687	4+687	SARLUX	Montevideo	30-Ene	18-Feb	14
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+797	4+797	SACEEM	Montevideo	3-Feb	18-Feb	12
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+906	4+906	SACEEM	Montevideo	3-Feb	5-Feb	3
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+937	4+937	SACEEM	Montevideo	25-Ene	5-Feb	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	5+346	5+346	SACEEM	Montevideo	25-Ene	5-Feb	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	5+400	5+400	SARLUX	Montevideo	20-Ene	23-Feb	17
Servicios Afectados	1	Eléctrica	5+590	5+590	SACEEM	Montevideo	2-Feb	3-Mar	19
Servicios Afectados	1	Eléctrica	6+298	6+298	SACEEM	Montevideo	20-Ene	23-Feb	17
Servicios Afectados	1	Eléctrica	6+820	6+820	SACEEM	Montevideo	30-Ene	15-Feb	11
Servicios Afectados	1	Eléctrica	7+908	7+908	SARLUX	Montevideo	30-Ene	15-Feb	11
Servicios Afectados	1	Eléctrica	7+909	7+909	SARLUX	Montevideo	12-Ene	14-Feb	10
Servicios Afectados	1	Eléctrica	7+917	7+917	SARLUX	Montevideo	12-Ene	14-Feb	10
Servicios Afectados	1	Eléctrica	8+204	8+204	SARLUX	Montevideo	27-Ago	8-Feb	6
Servicios Afectados	1	Eléctrica	8+809	8+809	SACEEM	Montevideo	27-Ago	8-Feb	6
Servicios Afectados	1	Eléctrica	8+852	8+852	SARLUX	Montevideo	27-Ago	8-Feb	6
Servicios Afectados	1	Eléctrica	9+254	9+254	SACEEM	Montevideo	8-Feb	8-Mar	15
Servicios Afectados	1	Eléctrica	9+316	9+316	SACEEM	Montevideo	25-Ene	23-Feb	17
Servicios Afectados	1	Eléctrica	9+356	9+356	SACEEM	Montevideo	7-set	5-Feb	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	9+841	9+841	SACEEM	Montevideo	30-Nov	5-Feb	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	10+070	10+070	SACEEM	Montevideo	12-Ene	23-Feb	17
Servicios Afectados	1	Eléctrica	10+112	S10112	SARLUX	Montevideo	13-Ene	23-Feb	17
Servicios Afectados	1	Eléctrica	10+112	10+112	SACEEM	Montevideo	12-Ene	14-Feb	10
Servicios Afectados	1	Eléctrica	10+116	10+116	SACEEM	Montevideo	14-Dic	5-Feb	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	10+215	10+215	SACEEM	Montevideo	25-Ene	12-Feb	10
Servicios Afectados	1	Eléctrica	11+281	11+281	SACEEM	Montevideo	30-Nov	5-Feb	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	11+282	11+282	SACEEM	Montevideo	25-Ene	31-Mar	20
Servicios Afectados	1	Eléctrica	12+090	12+090	SACEEM	Montevideo	12-Ene	12-Feb	10
Servicios Afectados	1	Eléctrica	12+091	12+091	SACEEM	Montevideo	12-Ene	15-Feb	11
Servicios Afectados	1	Eléctrica	12+741	12+741	SACEEM	Montevideo	12-Ene	15-Feb	11
Servicios Afectados	1	Eléctrica	13+619	13+619	SACEEM	La Paz	3-Oct	10-Feb	8
Servicios Afectados	1	Eléctrica	14+273	14+273	SARLUX	La Paz	5-Feb	10-Feb	4
Servicios Afectados	1	Eléctrica	14+937	14+937	SACEEM	La Paz	30-Nov	5-Feb	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	15+694	15+694	SACEEM	La Paz	27-Oct	8-Mar	20
Servicios Afectados	1	Eléctrica	15+984	15+984	SACEEM	La Paz	25-Ene	8-Mar	20
Servicios Afectados	1	Eléctrica	17+393	17+393	SARLUX	La Paz	30-Nov	5-Feb	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	18+795	18+795	SACEEM	Trinchera Las Piedras	8-set	5-Feb	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	19+093	19+093	SACEEM	Trinchera Las Piedras	5-Feb	10-Feb	4
Servicios Afectados	1	Eléctrica	19+347	19+347	SACEEM	Trinchera Las Piedras	7-Dic	15-Feb	11
Servicios Afectados	1	Eléctrica	21+875	21+875	SARLUX	Las Piedras	16-Nov	8-Mar	20
Servicios Afectados	1	Eléctrica	26+003	26+003	SARLUX	Progreso	30-Nov	20-Feb	15
Servicios Afectados	1	Eléctrica	26+094	26+094	SARLUX	Progreso	20-Ene	3-Feb	3
Servicios Afectados	1	Eléctrica	26+535	26+535	SARLUX	Progreso	14-set	25-Feb	19
Servicios Afectados	2	Eléctrica	35+015	35+015	ORITECNO	Juanicó	25-Ene	25-Feb	19
Servicios Afectados	2	Eléctrica	35+271	35+271	ORITECNO	Juanicó	8-Oct	15-Feb	11
Servicios Afectados	2	Eléctrica	37+632	37+632	ORITECNO	Canelones	18-Ene	5-Feb	5
Servicios Afectados	2	Eléctrica	40+104	40+104	ORITECNO	Canelones	13-Oct	15-Feb	11
Servicios Afectados	2	Eléctrica	42+572	42+572	ORITECNO	Canelones	3-Nov	5-Feb	5
Servicios Afectados	2	Eléctrica	42+868	42+868	ORITECNO	Canelones	13-Ene	13-Feb	10
Servicios Afectados	2	Eléctrica	43+535	43+535	ORITECNO	Canelones	30-Nov	1-Mar	20
Servicios Afectados	2	Eléctrica	43+885	43+885	ORITECNO	Canelones	30-Nov	1-Mar	20
Servicios Afectados	2	Eléctrica	43+892	43+892	ORITECNO	Canelones	30-Nov	1-Mar	20
Servicios Afectados	2	Eléctrica	44+348	44+348	ORITECNO	Canelones	15-Ene	15-Feb	11
Servicios Afectados	2	Eléctrica	45+603	45+603	ORITECNO	Canelones	15-Ene	15-Feb	11
Servicios Afectados	2	Eléctrica	66+649	66+649	ORITECNO	25 de Agosto	27-Ago	1-Mar	20
Servicios Afectados	2	Eléctrica	75+518	75+518	ORITECNO	Cardal (Incluye Variantes)	1-Feb	1-Mar	20
Servicios Afectados	3	Eléctrica	89+820	89+820	BERKES	25 de Mayo	25-Ene	1-Mar	20
Servicios Afectados	3	Eléctrica	106+310	106+310	BERKES	Florida	1-Feb	1-Mar	20
Servicios Afectados	3	Eléctrica	132+842	132+842	BERKES	E/La Cruz y Pintado	15-Ene	15-Feb	11
Servicios Afectados	3	Eléctrica	132+843	132+843	BERKES	E/La Cruz y Pintado	25-Ene	15-Feb	11
Servicios Afectados	4	Eléctrica	152+148	152+148	BERKES	Variante Sarandí Grande	30-Nov	5-Feb	5
Servicios Afectados	4	Eléctrica	152+149	152+149	BERKES	Variante Sarandí Grande	15-Ene	15-Feb	11
Servicios Afectados	4	Eléctrica	152+150	152+150	BERKES	Variante Sarandí Grande	23-Nov	5-Feb	5
Servicios Afectados	4	Eléctrica	153+023	153+023	BERKES	Variante Sarandí Grande	15-Ene	15-Feb	11
Servicios Afectados	4	Eléctrica	191+907	191+907	BERKES	Durazno	30-Nov	5-Feb	5
Servicios Afectados	4	Eléctrica	192+141	192+141	BERKES	Durazno	1-Feb	1-Mar	20
Servicios Afectados	4	Eléctrica	194+530	194+530	BERKES	Durazno	15-Ene	15-Feb	11
Servicios Afectados	4	Eléctrica	195+578	195+578	BERKES	Durazno	15-Feb	16-Feb	2
Servicios Afectados	4	Eléctrica	198+245	198+245	BERKES	Durazno	15-Feb	16-Feb	2
Servicios Afectados	5	Eléctrica	201+793	201+793	BERKES	Santa Bernardina	15-Feb	16-Feb	2
Servicios Afectados	5	Eléctrica	235+706	235+706	BERKES	Carlos Reyles	15-Feb	16-Feb	2
Servicios Afectados	5	Eléctrica	235+905	235+905	BERKES	Carlos Reyles	15-Feb	16-Feb	2
Servicios Afectados	5	Eléctrica	236+177	236+177	BERKES	Carlos Reyles	24-Feb	24-Feb	1
Servicios Afectados	5	Eléctrica	249+435	249+435	BERKES	E/C. Reyles y Centenario	1-Feb	2-Feb	2
Servicios Afectados	5	Eléctrica	256+726	256+726	BERKES	Desvío UPM 2	1-Feb	2-Feb	2
Servicios Afectados	5	Eléctrica	256+730	256+730	BERKES	Desvío UPM 2	2-Feb	3-Feb	2
Servicios Afectados	5	Eléctrica	256+950	256+950	BERKES	Desvío UPM 2	9-Feb	18-Feb	8
Servicios Afectados	5	Eléctrica	261+315	261+315	BERKES	Centenario-Paso de los Toros	9-Feb	18-Feb	8
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	4+417	4+417	SARLUX	Montevideo	10-Feb	12-Feb	3
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	4+418	4+418	SARLUX	Montevideo	11-Feb	12-Feb	2
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	7+910	7+910	SARLUX	Montevideo	23-Ene	5-Feb	5
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	15+572	15+572	SARLUX	La Paz	23-Ene	5-Feb	5
Servicios Afectados	4	Alumbrado y TV Cable	196+940	196+940	SARLUX	Durazno	8-Feb	9-Feb	2
Servicios Afectados	4	Alumbrado y TV Cable	196+941	196+941	SARLUX	Durazno	3-Feb	17-Feb	11



Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 5/2021

1	Montevideo-Progreso
2	Progreso-25 de Mayo
3	25 de Mayo-Sarandí Grande
4	Sarandí Grande-Durazno
5	Durazno-Paso de los Toros
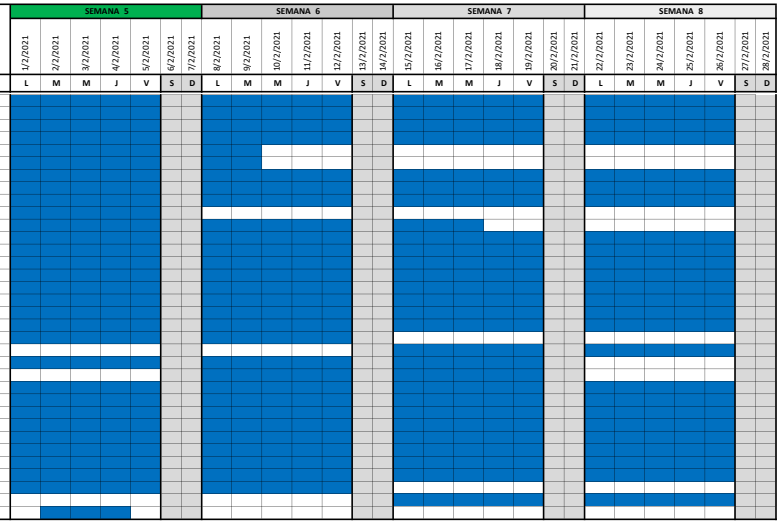
Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración
Balasto y Sub-balasto de Vía	4	Acopio de Balasto / subbalasto	149+000			Variante Sarandí Grande	25-Ene	26-Feb	20
Balasto y Sub-balasto de Vía	4	Acopio de Balasto / subbalasto	192+500			Durazno	25-Ene	26-Feb	20
Balasto y Sub-balasto de Vía	5	Acopio de Balasto / Subbalasto	221+200		Acopio El Remanso	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	1-Feb	26-Feb	20
Balasto y Sub-balasto de Vía	5	Acopio de Balasto / Subbalasto	234+000		Acopio Campo Javier	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	1-Feb	26-Feb	20
Trinchera Capurro	1	Muros de Contención	3+150	3+150	Construcción Muro de Contención- Bvar artigas a Pk -	Trinchera Capurro	1-Feb	9-Feb	7
Trinchera Capurro	1	Muros de Contención	4+100	4+100	Construcción Muro de Contención- Uruguayana a Pk +	Trinchera Capurro	1-Feb	9-Feb	7
Trinchera Capurro	1	Pilotaje	4+100		PK 4+100 Uruguayana a PK-	Trinchera Capurro	1-Feb	26-Feb	20
Trinchera Capurro	1	Pilotaje	3+537		Zona Entre Bvar Artigas y Capurro	Trinchera Capurro	1-Feb	26-Feb	20
Trinchera Capurro	1	Desvío	4+000		Desvío Uruguayana	Trinchera Capurro	1-Feb	26-Feb	20
Trinchera Capurro	1	Cerramiento	4+000		Construcción cerramiento provisorio de obra	Trinchera Capurro	1-Feb	5-Feb	5
Trinchera Capurro	1	Muro Guía	4+000		Construcción Muro Guía	Trinchera Capurro	1-Feb	17-Feb	13
Trinchera Las Piedras	1	Pasos Superiores	19+340		B037- Liber Seregñi- Desvíos	Trinchera Las Piedras	1-Feb	26-Feb	20
Trinchera Las Piedras	1	Pasos Superiores	19+340		B037- Liber Seregñi- Acondicionamiento Base Fondo, Hormigón de Limpieza y Lo	Trinchera Las Piedras	1-Feb	26-Feb	20
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	19+950		Pilotera 1 - Pk 19+950_ B036 Aldunate a Pk +	Trinchera Las Piedras	1-Feb	26-Feb	20
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	19+480		Pilotera 2 - Pk 19+480_ B031 y B032	Trinchera Las Piedras	1-Feb	26-Feb	20
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	19+860		Pilotera 3- 18+860_ Inicio Trinchera a Pk +	Trinchera Las Piedras	1-Feb	26-Feb	20
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	19+220		Pilotera 4- _ 19+220- B029- A Pk -	Trinchera Las Piedras	1-Feb	26-Feb	20
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	19+850		Desmoche - B034 a B035	Trinchera Las Piedras	1-Feb	26-Feb	20
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	19+850		Desmoche - B030 a B031	Trinchera Las Piedras	1-Feb	26-Feb	20
Trinchera Las Piedras	1	Cerramiento	19+650		Construcción cerramiento provisorio de obra Zona Hospital	Trinchera Las Piedras	1-Feb	12-Feb	10
Trinchera Las Piedras	1	Cerramiento	19+650		Demolición de muro Zona Hospital	Trinchera Las Piedras	15-Feb	26-Feb	10
Trinchera de Usher- Calleros	3	Conformación de desvio-Transito	106+470	106+470		Florida	1-Feb	19-Feb	15
Trinchera de Usher- Calleros	3	Servicios afectados- OSE	106+400	106+470		Florida	8-Feb	20-Feb	10
Trinchera de Usher- Calleros	3	Demoliciones	106+400	106+470	tramites	Florida	25-Ene	28-Feb	20
Obradores	4	Obrador Durazno	192+500		Carga, descarga y transporte de materiales	Durazno	25-Ene	26-Feb	20
Obradores	4	Obrador Durazno	192+500		Fabricación prelosas	Durazno	25-Ene	26-Feb	20
Obradores	4	Obrador Durazno	192+500		Fabricación Aletas	Durazno	25-Ene	26-Feb	20
Reposición de Caminos	4	Mantenimiento de accesos y caminos			Todo el tramo		1-Feb	26-Feb	20
Vías	3	Producción de durmientes	109+000		Planta de durmientes	Florida	1-Feb	26-Feb	20
Vías	3	Preparación de fijaciones	109+000		Planta de durmientes	Florida	1-Feb	26-Feb	20
Vías	3	Producción de soldaduras eléctricas	109+000		Planta de soldadura eléctrica	Florida	1-Feb	26-Feb	20
Vías	3	Bateo manual, nivelación y alineación vía secundaria	109+000		Planta de soldadura eléctrica	Florida	1-Feb	12-Feb	10
Vías	3	Carga, transporte y descarga de ADV's	109+000		Planta de soldadura eléctrica	Florida	15-Feb	26-Feb	10
Vías	1	Retiro de vía en PAN - Montevideo	4+778	10+100	PAN en Montevideo	Montevideo	2-Feb	4-Feb	3
