Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 7/2021

1	Montevideo-Progreso
2	Progreso-25 de Mayo
3	25 de Mayo-Sarandí Grande
4	Sarandí Grande-Durazno
5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración
Movimiento de Suelos	1	Terraplén/Desmonte	15+500	17+200	Excavación	La Paz	15-Feb	17-Feb	3
Movimiento de Suelos	1	Terraplén/Desmonte	5+000	7+000	Excavación	Montevideo	18-Feb	12-Mar	17
Movimiento de Suelos	1	Terraplén/Desmonte	25+200	30+000	Excavación	Progreso	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	1	Terraplén/Desmonte	23+500	25+000	Excavación	Las Piedras	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	1	Relleno	25+000	30+000	Relleno	Progreso	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	1	Relleno	9+000	30+000	Trabajo en Cantera- Azul	Montevideo	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	31+400	35+900		E/Progreso y Juanicó	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	31+400	35+900		E/Progreso y Juanicó	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	39+500	36+000	Macromáquinas	Canelones	22-Feb	12-Mar	15
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	39+500	36+000	Macromáquinas	Canelones	22-Feb	12-Mar	15
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	48+500	51+500	Macromáquinas	Canelones	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	48+500	51+500	Macromáquinas	Canelones	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	54+000	56+500	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	54+000	56+500	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	57+800	59+800	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	57+800	59+800	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	62+900	63+200		25 de Agosto	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	62+900	63+200		25 de Agosto	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	66+500	69+000	En este intervalo hay 3 zonas entregadas que suman 720 ml	25 de Agosto	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	79+000	75+520		Cardal (Incluye Variantes)	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	79+000	75+520		Cardal (Incluye Variantes)	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	86+680	85+750		25 de Mayo	15-Feb	26-Feb	10
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	88+900	89+100		25 de Mayo	8-Mar	12-Mar	5
Movimiento de Suelos	3	Reconstrucción de taludes	100+000	101+200		Florida	18-Ene	15-Feb	1
Movimiento de Suelos	3	Reconstrucción de taludes y desagües	91+400	97+100		25 de Mayo	8-Feb	5-Mar	15
Movimiento de Suelos	3	Retiro Capa Vegetal	103+900	104+700		Florida	18-Ene	18-Feb	4
Movimiento de Suelos	3	Confección de protocolos de sub-rasante	91+400	97+100		25 de Mayo	8-Feb	15-Mar	20
Movimiento de Suelos	3	Capa de Forma	91+400	92+600		25 de Mayo	1-Mar	15-Mar	10
Movimiento de Suelos	3	Bloque Técnico C90	98+971			Berrondo	4-Mar	8-Mar	3
Movimiento de Suelos	3	Playa de acopio de durmientes	110+000	110+000		Florida	18-Ene	17-Feb	3
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	103+900	104+700		Florida	18-Feb	5-Mar	12
Movimiento de Suelos	3	Retiro Capa Vegetal	106+800	107+100		Florida	15-Feb	23-Feb	7
Movimiento de Suelos	3	Retiro Capa Vegetal	106+500	106+800		Florida	22-Feb	1-Mar	6
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	106+800	107+100		Florida	22-Feb	8-Mar	11
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	107+100	107+400		Florida	12-Feb	23-Feb	7
Movimiento de Suelos	3	Perforacion en roca para voladura	120+900	121+700		Florida	1-Feb	15-Mar	20
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	120+990	121+030		Florida	16-Feb	16-Feb	1
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	121+030	121+070		Florida	18-Feb	18-Feb	1
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	121+070	121+110		Florida	23-Feb	23-Feb	1
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	121+110	121+150		Florida	25-Feb	25-Feb	1
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	121+150	121+190		Florida	2-Mar	2-Mar	1
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	121+190	121+240		Florida	4-Mar	4-Mar	1
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	121+240	121+290		Florida	9-Mar	9-Mar	1
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	121+290	121+340		Florida	11-Mar	11-Mar	1
Movimiento de Suelos	3	Desmonte / Terraplén	129+000	130+000		E/La Cruz y Pintado	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	3	Desmonte / Terraplén	134+000	137+000		E/La Cruz y Pintado	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	3	Desmonte / Terraplén	137+500	137+700		E/La Cruz y Pintado	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	3	Desmonte / Terraplén	138+800	139+000		Pintado	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	3	Desmonte / Terraplén	141+400	143+300		E/Pintado y Sarandí Grande	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	3	Retiro material prestamo en Cantera	131+800			E/La Cruz y Pintado	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	3	Retiro material prestamo en Cantera	140+000			E/Pintado y Sarandí Grande	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	4	Excavaciones / Formación de terraplén	156+300	157+000		E/Sarandí y Maciel	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	4	Formación de Terraplén	156+600	157+000		E/Sarandí y Maciel	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	4	Desmonte / Terraplén	157+000	158+500	Subcontrato Grinor	E/Sarandí y Maciel	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	4	Desmonte / Terraplén	163+700	164+500	Subcontrato Grinor	Variante Puntas de Maciel	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	4	Desmonte / Terraplén	166+700	168+000	Subcontrato Grinor	E/Maciel y Goñi	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	4	Desmonte / Terraplén	168+000	170+000	Subcontrato Grinor	E/Maciel y Goñi	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	4	Retiro Capa Vegetal / Desmonte	170+000	174+500	Subcontrato Diaz Álvarez	E/Maciel y Goñi	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	4	Desmonte / Terraplén	188+000	197+000		Durazno	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	4	Retiro material prestamo en Cantera	149+500		Bracco	Variante Sarandí Grande	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	4	Destape de cantera	150+000		Liliana B. Olariaga	Variante Sarandí Grande	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	4	Retiro material prestamo en Cantera	163+700		Miguel Loriero	Variante Puntas de Maciel	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	4	Destape de prestamo	175+000		Fosatti	E/Maciel y Goñi	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	4	Destape de prestamo	177+000		Cortabarria	Goñi	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	4	Retiro material prestamo en Cantera	185+500		Vignale	Durazno	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	4	Retiro material prestamo en Cantera	186+000		Fabian Delgado	Durazno	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	4	Retiro material prestamo en Cantera	189+000		Leal	Durazno	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	4	Retiro material prestamo en Cantera	191+800		Antonaccio	Durazno	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	4	Rectificación de Caminos paralelos	149+000	197+000	Conformación de Cunetas	Variante Sarandí Grande	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	5	Desmonte / Terraplén	197+000	200+000		Durazno	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	5	Desmonte / Terraplén	205+000	Norte		E/Sta. Bernardina y C. Reyles	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	5	Destape/Excavación de préstamo	207+000		Préstamo Santa María - García	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	5	Destape/Excavación de préstamo	208+200		Préstamo Santa María - García 1	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	5	Destape/Excavación de préstamo	214+200		Préstamo Falcón	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	5	Desmonte / Terraplén	216+000	Norte		E/Sta. Bernardina y C. Reyles	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	5	Corte de Talud	231+000	Norte		E/Sta. Bernardina y C. Reyles	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	5	Tape/Excavación de préstamo	233+800		Préstamo Javier	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	5	Desmonte / Terraplén	238+000	Norte		Carlos Reyles	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	5	Tape/Excavación de préstamo	242+400		Préstamo Flores	E/C. Reyles y Centenario	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	5	Destape/Excavación de préstamo	247+200		Préstamo Salaberry	E/C. Reyles y Centenario	15-Feb	12-Mar	20
Movimiento de Suelos	5	Desmonte / Terraplén	250+000	Norte		E/C. Reyles y Centenario	15-Feb	12-Mar	20
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	3	Instalación de Cerco de Ley	104+000	149+000		Florida	12-Ene	31-May	20
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	3	Replanteo cerco de Ley	124+000	149+000		Florida	15-Feb	12-Mar	20
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	3	Instalación de Cerco de Ley	124+000	149+000		Florida	15-Feb	12-Mar	20
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	4	Replanteo cerco de Ley					15-Feb	12-Mar	20
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	4	Instalación de Cerco de Ley					15-Feb	12-Mar	20



Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 7/2021

1	Montevideo-Progreso
2	Progreso-25 de Mayo
3	25 de Mayo-Sarandí Grande
4	Sarandí Grande-Durazno
5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración
ODT´s/Alcantarillas	1	B14 - Marco 3 bocas 1,5x1,5	7+000		Construcción alcantarilla	Montevideo	15-Feb	25-Feb	9
ODT´s/Alcantarillas	1	B22 - Marco rectangular 6x6 Fernando Menck	12+347		Construcción de marco	Montevideo	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	1	B039 - Marco prefabricado 4x2	20+684		Sub Contrato_ Hormigón de Limpieza- Construcción	Las Piedras	15-Feb	5-Mar	15
ODT´s/Alcantarillas	2	C42 - Marco 3 - 1,5x1,5	61+080			25 de Agosto	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	2	C934 - Marco 3 - 1,5x1,5	61+080			25 de Agosto	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	2	C926 - Tubo 1 Ø 1000 mm	74+087			Cardal (Incluye Variantes)	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	2	C64 - Marco 1 - 1,0x1,0	75+719			Cardal (Incluye Variantes)	15-Feb	19-Feb	5
ODT´s/Alcantarillas	2	C65 - Tubo 1 Ø 800 mm	76+859			Cardal (Incluye Variantes)	15-Feb	5-Mar	15
ODT´s/Alcantarillas	2	B70 - Marco 1 - 4x2	52+924		Subcontrato Ventus	Variante Santa Lucía	15-Feb	26-Feb	10
ODT´s/Alcantarillas	2	B61 - Marco 1 - 6x2	44+306		Subcontrato Ventus	Canelones	1-Mar	12-Mar	10
ODT´s/Alcantarillas	2	B60 - Marco 1 - 6x2	43+430		Subcontrato Ventus	Canelones	22-Feb	12-Mar	15
ODT´s/Alcantarillas	2	B59 - Marco 1 - 6x2	41+763		Subcontrato Ventus	Canelones	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	2	B53 - Marco 1 - 6x2	33+643		Subcontrato Ventus	E/Progreso y Juanicó	15-Feb	5-Mar	15
ODT´s/Alcantarillas	2	B52 - Marco 1 - 6x2	32+499		Subcontrato Ventus	E/Progreso y Juanicó	15-Feb	5-Mar	15
ODT´s/Alcantarillas	3	C079- Tubo 3 Ø 1200 mm	92+077		Encofrado de cabezales	25 de Mayo	22-Feb	26-Feb	5
ODT´s/Alcantarillas	3	C079- Tubo 3 Ø 1200 mm	92+077		Hormigonado de cabezales	25 de Mayo	1-Mar	5-Mar	5
ODT´s/Alcantarillas	3	B94-Tubo 3 Ø 1200 mm	98+183		Hormigonado piso Aletas	Berrondo	24-Feb	1-Mar	4
ODT´s/Alcantarillas	3	B94-Tubo 3 Ø 1200 mm	98+183		Colcación de Aletas	Berrondo	1-Mar	5-Mar	5
ODT´s/Alcantarillas	3	C098- Tubo 3 Ø 1200 mm	105+343		Encofrado de Muros y Losa Superior de Marco	Florida	8-Mar	12-Mar	5
ODT´s/Alcantarillas	3	C098- Tubo 3 Ø 1200 mm	105+343		Hormigonado de muros y losa superior de marco	Florida	8-Mar	12-Mar	5
ODT´s/Alcantarillas	3	C101- Tubo 3 Ø 1000 mm	106+476		Hormigonado piso Aletas	Florida	15-Feb	19-Feb	5
ODT´s/Alcantarillas	3	C101- Tubo 3 Ø 1000 mm	106+476		Armado de cabezales	Florida	18-Feb	19-Feb	2
ODT´s/Alcantarillas	3	C101- Tubo 3 Ø 1000 mm	106+476		Encofrado de cabezales	Florida	22-Feb	23-Feb	2
ODT´s/Alcantarillas	3	C101- Tubo 3 Ø 1000 mm	106+476		Hormigonado de cabezales	Florida	24-Feb	26-Feb	3
ODT´s/Alcantarillas	3	C104- Tubo 2 Ø 1000 mm	108+701		Hormigonado piso Aletas	Florida	15-Feb	19-Feb	5
ODT´s/Alcantarillas	3	C104- Tubo 2 Ø 1000 mm	108+701		Encofrado de cabezales	Florida	18-Feb	19-Feb	2
ODT´s/Alcantarillas	3	C104- Tubo 2 Ø 1000 mm	108+701		Hormigonado de cabezales	Florida	22-Feb	23-Feb	2
ODT´s/Alcantarillas	3	C109- Tubo 2 Ø 800 mm	112+646		Armado de cabezales	Florida	22-Feb	26-Feb	5
ODT´s/Alcantarillas	3	C110- Tubo 3 Ø 800 mm	113+018		Hormigonado de cabezales	Florida	25-Feb	26-Feb	2
ODT´s/Alcantarillas	3	C111- Tubo 3 Ø 800 mm	114+543		Llenado de Aleta	Florida	15-Feb	19-Feb	5
ODT´s/Alcantarillas	3	B103	116+858		Armado de cabezales	Florida	15-Feb	17-Feb	3
ODT´s/Alcantarillas	3	C902 - Tubo Ø 800 mm	124+600		Construcción	Florida	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	3	C122 - Tubo Ø 800 mm	125+291		Construcción	La Cruz	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	3	C127 - Tubo 2 bocas Ø 800 mm	128+980		Excavaciones - Hormigón de Limpieza	E/La Cruz y Pintado	18-Feb	12-Mar	17
ODT´s/Alcantarillas	3	C128 - Tubo 3 bocas Ø 800 mm	129+392		Construcción	E/La Cruz y Pintado	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	3	C130 - Tubo 2 bocas Ø 1200 mm	131+413		Construcción	E/La Cruz y Pintado	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	3	C904 - Tubo Ø 800 mm	136+356		Construcción	E/La Cruz y Pintado	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	3	C134 - Tubo Ø 800 mm	137+225		Construcción	E/La Cruz y Pintado	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	4	B108 - 2-Marco 1,5x1,5	156+715		Construcción	E/Sarandí y Maciel	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C159 - Tubo Ø 1200 mm	157+116		Construcción	E/Sarandí y Maciel	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	4	B110 - Marco 2 bocas 1,5x1,5	159+193		Construcción	E/Sarandí y Maciel	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C952 - Tubo Ø 800 mm	160+972		Construcción	E/Sarandí y Maciel	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C998 - Tubo Ø 800 mm	162+660		Construcción	E/Sarandí y Maciel	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	4	B111 - Marco 6x3	165+234		Construcción (Subcontrato Gofinal)	Variante Puntas de Maciel	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	4	B112 - 2 Marcos 1,5x1,5	165+323		Construcción	Variante Puntas de Maciel	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C168 - Tubo Ø 800 mm	166+741		Construcción	E/Maciel y Goñi	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C169 - Marco 1,5x1,5	167+207		Construcción	E/Maciel y Goñi	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C170 - Tubo Ø 800 mm	167+479		Construcción	E/Maciel y Goñi	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C171 - Tubo Ø 800 mm	168+080		Construcción	E/Maciel y Goñi	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C172 - Tubo Ø 1200 mm	168+736		Construcción	E/Maciel y Goñi	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C291- Marco 1,5x1,5	169+396		Construcción	E/Maciel y Goñi	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C956 - Tubo 2 bocas Ø 1000 mm	173+121		Construcción	E/Maciel y Goñi	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C176 - Tubo Ø 800 mm	173+782		Construcción	E/Maciel y Goñi	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C177 - Tubo Ø 1000 mm	174+655		Construcción	E/Maciel y Goñi	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C178 - Tubo Ø 1000 mm	175+455		Construcción	E/Maciel y Goñi	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C181 - Tubo Ø 1200 mm	176+909		Construcción	E/Maciel y Goñi	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C959 - Tubo Ø 800 mm	177+944		Construcción	Goñi	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C960 - Tubo Ø 1000 mm	178+438		Construcción	E/Goñi y Durazno	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C182 - Marco 1,5x1,5	178+857		Terminaciones	E/Goñi y Durazno	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C183 - Marco 1,5x1,5	179+507		Terminaciones	E/Goñi y Durazno	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C184 - 2 Marcos 1,5x1,5	179+689		Construcción	E/Goñi y Durazno	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C185 - Marco 1,5x1,5	180+669		Terminaciones	E/Goñi y Durazno	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C189 - Marco 1,5x1,5	183+340		Terminaciones	Durazno	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C191a - Marco 1,5x1,5	185+107		Construcción	Durazno	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C197 - Tubo 2 bocas Ø 1000 mm	189+287		Construcción	Durazno	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C198 - Tubo Ø 800 mm	189+950		Construcción	Durazno	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C971 - Tubo Ø 800 mm	190+620		Construcción	Durazno	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C966 - Tubo Ø 1000 mm	191+419		Construcción	Durazno	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C290 - Tubo Ø 800 mm	191+616		Construcción	Durazno	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C200 - Marco 1x1	193+986		Construcción	Durazno	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	4	C967 - Tubo Ø 800 mm	194+849		Construcción	Durazno	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	5	C216 - Tubo de hormigón 1.0	205+074		Cabezales	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	15-Feb	19-Feb	5
ODT´s/Alcantarillas	5	B130 - Tubo hormigón dim 1.2	214+773		Excavación/Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	15-Feb	5-Mar	15
ODT´s/Alcantarillas	5	C228 - Tubo hormigón 1.0	217+165		Cabezales	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	15-Feb	19-Feb	5
ODT´s/Alcantarillas	5	B175 - Tubo hormigón 1.0	218+718		Cabezales	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	15-Feb	26-Feb	10
ODT´s/Alcantarillas	5	B140 - Marco 6 x 2	223+040		Construcción (SubCtto Gofinal)	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	15-Feb	12-Mar	20
ODT´s/Alcantarillas	5	B144 - Tubo hormigón dim 1.2	227+928		Excavación/Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	15-Feb	5-Mar	15
ODT´s/Alcantarillas	5	C238 - Tubo hormigón dim 1.2	228+343		Excavación/Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	22-Feb	12-Mar	15
ODT´s/Alcantarillas	5	C239 - Marco 1,5 x 1,5	228+875		Excavación/Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	1-Mar	12-Mar	10
ODT´s/Alcantarillas	5	C244 - Tubo hormigón dim 1.2	231+548		Cabezales	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	15-Feb	26-Feb	10
ODT´s/Alcantarillas	5	C253 - Tubo hormigón dim 1.2	236+860		Excavación/Construcción	Carlos Reyles	15-Feb	5-Mar	15
ODT´s/Alcantarillas	5	C278 - Tubo hormigón dim 1.0	258+279		Cabezales	Centenario-Paso de los Toros	15-Feb	26-Feb	10
ODT´s/Alcantarillas	5	C280 - Tubo hormigón dim 1.0	258+860		Cabezales	Centenario-Paso de los Toros	15-Feb	26-Feb	10
Paso de Fauna	3	C928- Paso ganado 3x2	92+100		Armado y llenado estructura	25 de Mayo	8-Feb	12-Mar	20
Paso de Fauna	3	B920 - Marco 3x2	142+075		Construcción	E/Pintado y Sarandí Grande	15-Feb	12-Mar	20
Paso de Fauna	4	B929 - Marco 3x2	162+188		Construcción (Subcontrato Gofinal)	E/Sarandí y Maciel	15-Feb	12-Mar	20
Paso de Fauna	4	B930 - Marco 3x2	165+110		Construcción (Subcontrato Gofinal)	Variante Puntas de Maciel	15-Feb	12-Mar	20
Paso de Fauna	4	B914 - Marco 4x3	183+300		Construcción	Durazno	15-Feb	12-Mar	20
Paso de Fauna	4	B915 - Marco 6x4	185+751		Construcción (Subcontrato Gofinal)	Durazno	15-Feb	12-Mar	20



Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 7/2021

1	Montevideo-Progreso
2	Progreso-25 de Mayo
3	25 de Mayo-Sarandí Grande
4	Sarandí Grande-Durazno
5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración
Puentes	1	Puente ferroviario - 2 Vías 15 m - VIAF - B045	23+754	23+754	Construcción	Progreso	15-Feb	12-Mar	20
Puentes	1	Puente vigas prefabricadas 18m 2 vías B27	17+933		Acondicionamiento Meseta Apoyo	La Paz	24-Feb	12-Mar	13
Puentes	2		42+200		Prefabricación Prelosas	Canelones	15-Feb	12-Mar	20
Puentes	2	B54	34+551		Pilotes	Juanicó	2-Mar	12-Mar	9
Puentes	2	B56	39+045		Estructura (Ferralia)	Canelones	22-Feb	12-Mar	15
Puentes	2	B57	40+547		Estructura (Ferralia)	Canelones	15-Feb	12-Mar	20
Puentes	2	B63	48+222		Pilotes	Canelones	15-Feb	19-Feb	5
Puentes	2	B63	48+222		Estructura	Canelones	22-Feb	12-Mar	15
Puentes	2	B64	48+975		Estructura	Canelones	15-Feb	12-Mar	20
Puentes	2	B65	49+890		Pilotes	Canelones	15-Feb	1-Mar	11
Puentes	2	B67	50+686		Pilotes	Canelones	15-Feb	1-Mar	11
Puentes	2	B68	51+013		Estructura	Canelones	15-Feb	12-Mar	20
Puentes	2	B69	51+854		Pilotes	Variante Santa Lucía	22-Feb	26-Feb	5
Puentes	2	B72	54+976		Vigas postensadas	Variante Santa Lucía	15-Feb	12-Mar	20
Puentes	2	B73	55+544		Estructura	Variante Santa Lucía	15-Feb	12-Mar	20
Puentes	2	B75	56+160		Estructura	Variante Santa Lucía	15-Feb	12-Mar	20
Puentes	3	B089	91+291		Trabajos en mesetas - Estribo 2 y pila	25 de Mayo	11-Feb	19-Feb	5
Puentes	3	B089	91+291		Armadura y llenado (muro y aletas) -Estribo 1	25 de Mayo	22-Feb	5-Mar	10
Puentes	3	B089	91+291		Armadura y llenado (dintel y aletas) -Pila y Estribo 2	25 de Mayo	3-Mar	12-Mar	8
Puentes	3	B093	95+515		Pilotes	25 de Mayo	22-Feb	5-Mar	10
Puentes	3	B093	95+515		Estribos	25 de Mayo	8-Mar	12-Mar	5
Puentes	3	B095	98+845		Armadura y llenado (muros y aletas) -Estribo 1 y 2	Berrondo	8-Feb	26-Feb	10
Puentes	3	B095	98+845		Trabajos en mesetas - Estribo 1 y 2	Berrondo	22-Feb	26-Feb	5
Puentes	3	B095	98+845		Colocacion de vigas	Berrondo	1-Mar	5-Mar	5
Puentes	3	B097	102+688		Pilotes	Florida	12-Feb	19-Feb	5
Puentes	3	B097	102+688		Estribos	Florida	22-Feb	12-Mar	15
Puentes	3	B098	103+522		Armado y montaje de estructura	Florida	8-Feb	12-Mar	20
Puentes	3	B105 - Puente Ferroviario	131+165		Armadura y llenado Aletas	E/La Cruz y Pintado	15-Feb	12-Mar	20
Puentes	4	B109 - Puente Ferroviario	158+484		Plataforma para Vigas	E/Sarandí y Maciel	15-Feb	12-Mar	20
Puentes	4	B178 - Puente Ferroviario	185+032		Pilas - Dinteles	Durazno	15-Feb	12-Mar	20
Puentes	5	B155 - Vigas prefabricadas de 18m	254+437		Excavación/Construcción	E/C. Reyles y Centenario	15-Feb	12-Mar	20
Puentes	5	B156 - Vigas prefabricadas de 12m	254+672		Excavación/Construcción	E/C. Reyles y Centenario	15-Feb	12-Mar	20
Puentes	5	B157 - Vigas prefabricadas de 9m	254+833		Excavación/Construcción	E/C. Reyles y Centenario	15-Feb	12-Mar	20
Demoliciones	1	Demoliciones	4+894	4+894	Padron 41535 (Marcelino Diaz)	Montevideo	2-Mar	5-Mar	4
Demoliciones	1	Demoliciones	4+894	4+894	Padron 93410 (Invasion Marcelino Diaz)	Montevideo	1-Mar	1-Mar	1
Demoliciones	1	Demoliciones	3+008	3+040	Padron 56379-56380 (San Ramon)	Montevideo	22-Feb	27-Feb	5
Demoliciones	1	Demoliciones	20+000	20+000	Padrón 17929 (demolicion muro y deposito + nuevo muro)	Trinchera Las Piedras	24-Feb	12-Mar	13
Demoliciones	1	Demoliciones	20+000	20+000	Padrón 359 (demolicion muro + nuevo muro) - Escuela	Trinchera Las Piedras	15-Feb	26-Feb	10
Demoliciones	1	Demoliciones	20+000	20+000	Padrón 210 (demolicion muro + nuevo muro) - CRAMI	Trinchera Las Piedras	17-Feb	19-Feb	3
Demoliciones	2	Demoliciones	75+737	75+737	Padron 311 (Cardal)	Cardal (Incluye Variantes)	1-Mar	3-Mar	3
Demoliciones	3	Demoliciones	106+442	106+442	Galpon Padron 6518	Florida	22-Feb	24-Feb	3
Demoliciones	3	Demoliciones	106+440	106+440	Casa Padron 2962 (parcial)	Florida	25-Feb	26-Feb	2
Demoliciones	3	Demoliciones	106+440	106+440	Galpon Padron 6881	Florida	1-Mar	3-Mar	3
Servicios Afectados	1	Frente Cateos	4+000	45+000	RR - OSE/IMM/ANCAP	Trinchera Capurro	22-Jun	12-Mar	20
Servicios Afectados	1	Frente Cateos	+726	21+000	ES - UTE	Montevideo	22-Jun	12-Mar	20
Servicios Afectados	1	Gas	4+407	4+407	Ciemsa	Montevideo	17-Feb	24-Feb	6
Servicios Afectados	1	Gas	4+664	4+664	Ciemsa	Montevideo	24-Feb	27-Feb	3
Servicios Afectados	1	Gas	9+250	9+250	Ciemsa	Montevideo	27-Feb	4-Mar	4
Servicios Afectados	1	Gas	9+311	9+311	Ciemsa	Montevideo	4-Mar	9-Mar	4
Servicios Afectados	1	Gas	14+804	14+804	Ciemsa	La Paz	9-Mar	14-Mar	4
Servicios Afectados	1	Gas	3+003	3+003	Gofinal	Montevideo	25-Feb	5-Mar	7
Servicios Afectados	1	Gas	3+625	3+625	Gofinal	Trinchera Capurro	8-Mar	18-Mar	5
Servicios Afectados	1	Gas	4+869	4+869	Gofinal	Montevideo	4-Mar	12-Mar	7
Servicios Afectados	1	Gas	7+921	7+921	Gofinal	Montevideo	11-Mar	17-Mar	2
Servicios Afectados	1	Gas	11+300	11+300	Gofinal	Montevideo	21-Ene	17-Feb	3
Servicios Afectados	1	Gas	12+100	12+100	Gofinal	Montevideo	17-Feb	19-Feb	3
Servicios Afectados	1	Gas	19+107	19+107	Gofinal (vaina en espera)	Trinchera Las Piedras	24-Feb	3-Mar	6
Servicios Afectados	1	Gas	19+955	19+955	Gofinal	Trinchera Las Piedras	4-Mar	11-Mar	6
Servicios Afectados	2	Gas	42+265	42+265	Gofinal	Canelones	17-Feb	26-Feb	8
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	+893	+893	Electrosistemas	Montevideo	1-Mar	11-Mar	9
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	4+683	4+683	Electrosistemas	Montevideo	1-Mar	26-Mar	10
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	4+863	4+863	Electrosistemas	Montevideo	1-Mar	26-Mar	10
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	4+888	4+888	Electrosistemas	Montevideo	1-Mar	26-Mar	10
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	8+849	8+849	Electrosistemas	Montevideo	22-Feb	9-Mar	12
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	19+233	19+233	Electrosistemas	Trinchera Las Piedras	15-Feb	20-Feb	5
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	24+499	24+499	Electrosistemas	Progreso	15-Feb	2-Mar	12
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	29+624	29+624	Electrosistemas	E/Progreso y Juanicó	15-Feb	23-Feb	7
Servicios Afectados	2	Telecomunicaciones	35+476	35+476	Oriteceno	Juanicó	20-Feb	15-Mar	15
Servicios Afectados	2	Telecomunicaciones	38+480	38+480	Oriteceno	Canelones	15-Feb	12-Mar	20
Servicios Afectados	3	Telecomunicaciones	120+956	120+956	Oriteceno	Florida	28-Feb	30-Mar	10
Servicios Afectados	3	Telecomunicaciones	121+949	121+949	Oriteceno	Florida	25-Feb	25-Abr	12
Servicios Afectados	3	Telecomunicaciones	122+865	122+865	Oriteceno	Florida	28-Feb	15-Abr	10
Servicios Afectados	3	Telecomunicaciones	123+427	123+427	Oriteceno	Florida	28-Feb	30-Mar	10
Servicios Afectados	3	Telecomunicaciones	124+777	124+777	Oriteceno	Florida	15-Feb	15-Mar	20
Servicios Afectados	4	Telecomunicaciones	194+761	194+761	Oriteceno	Durazno	9-Feb	15-Mar	20
Servicios Afectados	4	Telecomunicaciones	195+520	195+520	Oriteceno	Durazno	4-Feb	17-Feb	3
Servicios Afectados	4	Telecomunicaciones	196+124	196+124	Oriteceno	Durazno	4-Feb	26-Feb	10
Servicios Afectados	4	Telecomunicaciones	196+393	196+393	Oriteceno	Durazno	15-set	15-Mar	20
Servicios Afectados	5	Telecomunicaciones	198+220	198+220	Cietel	Durazno	15-Feb	19-Feb	5
Servicios Afectados	5	Telecomunicaciones	229+526	229+526	Cietel	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	22-Feb	5-Mar	10
Servicios Afectados	5	Telecomunicaciones	230+389	230+389	Cietel	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	22-Feb	5-Mar	10



Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 7/2021

1	Montevideo-Progreso
2	Progreso-25 de Mayo
3	25 de Mayo-Sarandí Grande
4	Sarandí Grande-Durazno
5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración
Servicios Afectados	3	Agua Potable y Saneamiento	105+772	105+772	Insaco	Florida	22-Feb	26-Feb	5
Servicios Afectados	3	Agua Potable y Saneamiento	106+477	106+477	Insaco	Florida	14-set	20-Feb	5
Servicios Afectados	3	Agua Potable y Saneamiento	106+479	106+479	Insaco	Florida	10-set	20-Feb	5
Servicios Afectados	3	Agua Potable y Saneamiento	108+870	108+870	Insaco	Florida	15-Feb	22-Feb	6
Servicios Afectados	3	Agua Potable y Saneamiento	107+980	107+980	Insaco	Florida	15-Feb	22-Feb	6
Servicios Afectados	3	Agua Potable y Saneamiento	110+514	110+514	Insaco	Florida	12-Feb	19-Feb	5
Servicios Afectados	3	Agua Potable y Saneamiento	111+701	111+701	Insaco	Florida	4-Feb	19-Feb	5
Servicios Afectados	3	Agua Potable y Saneamiento	111+702	111+702	Insaco	Florida	10-Feb	28-Feb	10
Servicios Afectados	3	Agua Potable y Saneamiento	111+800	111+800	Insaco	Florida	26-Oct	15-Feb	1
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	195+505	195+505	Insaco	Durazno	1-Mar	11-Mar	9
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	195+845	195+845	Insaco	Durazno	4-Mar	21-Mar	7
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	195+870	195+870	Insaco	Durazno	11-Mar	28-Mar	2
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	196+967	196+967	Insaco	Durazno	1-Mar	21-Mar	10
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	196+975	196+975	Insaco	Durazno	6-Mar	26-Mar	5
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	196+991	196+991	Insaco	Durazno	11-Mar	25-Abr	2
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	196+993	196+993	Insaco	Durazno	11-Mar	25-Abr	2
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	3+001	3+001	Saceem	Montevideo	1-Mar	13-Mar	10
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	3+004	3+004	Saceem	Montevideo	1-Mar	13-Mar	10
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	3+005	3+005	Saceem	Montevideo	1-Mar	13-Mar	10
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	3+885	3+885	Saceem	Trinchera Capurro	10-Feb	17-Mar	20
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	3+950	3+950	Saceem	Trinchera Capurro	10-Feb	7-Mar	15
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	19+240	19+240	Saceem	Trinchera Las Piedras	10-Nov	26-Feb	10
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	19+241	19+241	Saceem	Trinchera Las Piedras	10-Nov	26-Feb	10
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	19+300	19+300	Saceem	Trinchera Las Piedras	30-Nov	26-Feb	10
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	1+145	1+145	Ciemsa	Montevideo	22-Feb	27-Feb	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	1+245	1+245	Ciemsa	Montevideo	22-Feb	27-Feb	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	1+354	1+354	Ciemsa	Montevideo	1-Mar	4-Mar	4
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	1+355	1+355	Ciemsa	Montevideo	1-Mar	4-Mar	4
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	2+235	2+235	Ciemsa	Montevideo	22-Feb	27-Feb	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	9+798	9+798	Ciemsa	Montevideo	15-Feb	25-Feb	9
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	9+276	9+276	Ciemsa	Montevideo	15-Feb	25-Feb	9
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	4+777	4+777	Ciemsa	Montevideo	20-Feb	26-Feb	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	6+460	6+460	Ciemsa	Montevideo	14-Feb	19-Feb	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	10+694	10+694	Ciemsa	Montevideo	18-Feb	23-Feb	4
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	4+697	4+697	Ciemsa	Montevideo	15-Feb	23-Feb	7
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	4+724	4+724	Ciemsa	Montevideo	14-Feb	19-Feb	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	5+461	5+461	Ciemsa	Montevideo	18-Feb	23-Feb	4
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	5+098	5+098	Ciemsa	Montevideo	11-Feb	16-Feb	2
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	5+099	5+099	Ciemsa	Montevideo	11-Feb	16-Feb	2
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	5+131	5+131	Ciemsa	Montevideo	15-Feb	20-Feb	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	5+663	5+663	Ciemsa	Montevideo	17-Feb	22-Feb	4
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	5+752	5+752	Ciemsa	Montevideo	19-Feb	24-Feb	4
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	5+770	5+770	Ciemsa	Montevideo	23-Feb	28-Feb	4
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	6+426	6+426	Ciemsa	Montevideo	19-Feb	24-Feb	4
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	6+095	6+095	Ciemsa	Montevideo	27-Feb	4-Mar	4
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	55+370	55+370	Insaco	Variante Santa Lucía	15-Feb	27-Feb	10
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	21+940	21+940	Insaco	Las Piedras	15-Feb	27-Feb	10
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	10+300	10+300	Insaco	Montevideo	26-Feb	5-Mar	6
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	8+850	8+850	Insaco	Montevideo	22-Feb	4-Mar	9
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	7+913	7+913	Insaco	Montevideo	9-Feb	19-Feb	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	6+966	6+966	Insaco	Montevideo	19-Feb	1-Mar	7
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	2+884	2+884	Insaco	Montevideo	17-Feb	24-Feb	6
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	4+663	4+663	Insaco	Montevideo	24-Feb	8-Mar	9
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	5+106	5+106	Insaco	Montevideo	1-Feb	16-Feb	2
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	6+119	6+119	Insaco	Montevideo	7-Mar	22-Mar	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	6+458	6+458	Insaco	Montevideo	15-Feb	7-Mar	15
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	16+478	16+478	Insaco	La Paz	16-Feb	23-Feb	6
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	20+194	20+194	Ventus	Trinchera Las Piedras	25-Ene	24-Jun	20
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	34+900	34+900	Gofinal	Juanicó	15-Feb	20-Feb	5
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	35+433	35+433	Gofinal	Juanicó	11-Feb	22-Feb	6
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	35+434	35+434	Gofinal	Juanicó	11-Feb	22-Feb	6
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	35+554	35+554	Gofinal	Juanicó	11-Feb	22-Feb	6
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	44+988	44+988	Gofinal	Canelones	26-Feb	5-Mar	6
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+263	42+263	Gofinal	Canelones	24-Feb	4-Mar	7
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	43+242	43+242	Gofinal	Canelones	5-Mar	10-Mar	4
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	26+316	26+316	Gofinal	Progreso	18-Feb	25-Feb	6
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	26+041	26+041	Gofinal	Progreso	3-Feb	18-Feb	4
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	25+800	25+800	Gofinal	Progreso	2-Feb	17-Feb	3
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	18+972	18+972	Gofinal	Trinchera Las Piedras	8-Mar	15-Mar	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	15+701	15+701	Gofinal	La Paz	18-Feb	7-Mar	12
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	10+125	10+125	Gofinal	Montevideo	20-Feb	27-Feb	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	10+626	10+626	Gofinal	Montevideo	22-Feb	28-Feb	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	11+048	11+048	Gofinal	Montevideo	1-Mar	7-Mar	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	11+265	11+265	Gofinal	Montevideo	7-Mar	13-Mar	5



Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 7/2021

1	Montevideo-Progreso
2	Progreso-25 de Mayo
3	25 de Mayo-Sarandí Grande
4	Sarandí Grande-Durazno
5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+726	+726	SACEEM	Montevideo	15-Feb	8-Mar	16
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+942	+942	SACEEM	Montevideo	15-Feb	8-Mar	16
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+219	1+219	SACEEM	Montevideo	17-Feb	8-Mar	14
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+229	1+229	SARLUX	Montevideo	18-Feb	26-Feb	7
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+320	1+320	SARLUX	Montevideo	18-Feb	26-Feb	7
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+323	1+323	SARLUX	Montevideo	29-Ene	28-Feb	10
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+420	1+420	SACEEM	Montevideo	9-Nov	18-Feb	4
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+428	1+428	SACEEM	Montevideo	9-Nov	18-Feb	4
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+429	1+429	SARLUX	Montevideo	11-Feb	20-Mar	20
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+448	1+448	SACEEM	Montevideo	9-Nov	25-Feb	9
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+491	1+491	SARLUX	Montevideo	15-Feb	15-Mar	20
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+540	1+540	SACEEM	Montevideo	9-Nov	25-Feb	9
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+615	1+615	SACEEM	Montevideo	9-Nov	25-Feb	9
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+652	1+652	SARLUX	Montevideo	18-Feb	1-Mar	8
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+860	1+860	SACEEM	Montevideo	15-Feb	23-Feb	7
Servicios Afectados	1	Eléctrica	2+225	2+225	SACEEM	Montevideo	17-Feb	17-Feb	1
Servicios Afectados	1	Eléctrica	2+320	2+320	SACEEM	Montevideo	15-Feb	22-Feb	6
Servicios Afectados	1	Eléctrica	2+886	2+886	SACEEM	Montevideo	8-Feb	8-Mar	16
Servicios Afectados	1	Eléctrica	3+338	3+338	SACEEM	Trinchera Capurro	8-Feb	15-Mar	20
Servicios Afectados	1	Eléctrica	3+806	3+806	SACEEM	Trinchera Capurro	8-Feb	23-Feb	7
Servicios Afectados	1	Eléctrica	3+879	3+879	SACEEM	Trinchera Capurro	20-Feb	8-Mar	11
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+307	4+307	SACEEM	Montevideo	8-Feb	8-Mar	16
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+404	4+404	SARLUX	Montevideo	20-Ene	25-Feb	9
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+674	4+674	SARLUX	Montevideo	18-Ene	15-Mar	20
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+675	4+675	SARLUX	Montevideo	18-Ene	15-Mar	20
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+687	4+687	SARLUX	Montevideo	18-Ene	15-Mar	20
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+797	4+797	SACEEM	Montevideo	9-Feb	16-Feb	2
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+906	4+906	SACEEM	Montevideo	1-Feb	16-Feb	2
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+937	4+937	SACEEM	Montevideo	1-Feb	17-Feb	3
Servicios Afectados	1	Eléctrica	5+346	5+346	SACEEM	Montevideo	20-Ene	23-Feb	7
Servicios Afectados	1	Eléctrica	5+400	5+400	SARLUX	Montevideo	9-Feb	12-Mar	20
Servicios Afectados	1	Eléctrica	5+590	5+590	SACEEM	Montevideo	20-Ene	23-Feb	7
Servicios Afectados	1	Eléctrica	5+893	5+893	SARLUX	Montevideo	15-Feb	16-Mar	20
Servicios Afectados	1	Eléctrica	5+894	5+894	SARLUX	Montevideo	15-Feb	16-Mar	20
Servicios Afectados	1	Eléctrica	6+298	6+298	SACEEM	Montevideo	12-Ene	18-Feb	4
Servicios Afectados	1	Eléctrica	6+820	6+820	SACEEM	Montevideo	12-Ene	18-Feb	4
Servicios Afectados	1	Eléctrica	7+908	7+908	SARLUX	Montevideo	27-Ago	20-Feb	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	7+909	7+909	SARLUX	Montevideo	27-Ago	20-Feb	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	7+917	7+917	SARLUX	Montevideo	27-Ago	20-Feb	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	8+204	8+204	SARLUX	Montevideo	15-Feb	8-Mar	16
Servicios Afectados	1	Eléctrica	9+254	9+254	SACEEM	Montevideo	30-Nov	19-Feb	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	9+316	9+316	SACEEM	Montevideo	8-Feb	23-Feb	7
Servicios Afectados	1	Eléctrica	9+356	9+356	SACEEM	Montevideo	13-Ene	23-Feb	7
Servicios Afectados	1	Eléctrica	9+841	9+841	SACEEM	Montevideo	14-Dic	16-Feb	2
Servicios Afectados	1	Eléctrica	10+070	10+070	SACEEM	Montevideo	25-Ene	22-Feb	6
Servicios Afectados	1	Eléctrica	10+112	S10112	SARLUX	Montevideo	30-Nov	17-Feb	3
Servicios Afectados	1	Eléctrica	10+116	10+116	SACEEM	Montevideo	25-Ene	31-Mar	20
Servicios Afectados	1	Eléctrica	10+215	10+215	SACEEM	Montevideo	12-Ene	22-Feb	6
Servicios Afectados	1	Eléctrica	11+281	11+281	SACEEM	Montevideo	12-Ene	22-Feb	6
Servicios Afectados	1	Eléctrica	11+282	11+282	SACEEM	Montevideo	12-Ene	25-Feb	9
Servicios Afectados	1	Eléctrica	12+090	12+090	SACEEM	Montevideo	3-Oct	25-Feb	9
Servicios Afectados	1	Eléctrica	13+268	13+268	SACEEM	La Paz	1-Mar	19-Abr	10
Servicios Afectados	1	Eléctrica	13+619	13+619	SACEEM	La Paz	30-Nov	25-Feb	9
Servicios Afectados	1	Eléctrica	14+273	14+273	SARLUX	La Paz	8-set	25-Feb	9
Servicios Afectados	1	Eléctrica	15+694	15+694	SACEEM	La Paz	7-Dic	23-Feb	7
Servicios Afectados	1	Eléctrica	15+984	15+984	SACEEM	La Paz	16-Nov	8-Mar	16
Servicios Afectados	1	Eléctrica	17+393	17+393	SARLUX	La Paz	30-Nov	20-Feb	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	18+975	18+975	SACEEM	Trinchera Las Piedras	20-Ene	19-Feb	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	19+093	19+093	SACEEM	Trinchera Las Piedras	14-set	25-Feb	9
Servicios Afectados	1	Eléctrica	19+347	19+347	SACEEM	Trinchera Las Piedras	8-Feb	25-Feb	9
Servicios Afectados	1	Eléctrica	21+875	21+875	SARLUX	Las Piedras	8-Oct	23-Feb	7
Servicios Afectados	1	Eléctrica	24+503	24+503	SARLUX	Progreso	1-Mar	2-Mar	2
Servicios Afectados	1	Eléctrica	26+003	26+003	SARLUX	Progreso	13-Oct	25-Feb	9
Servicios Afectados	1	Eléctrica	26+094	26+094	SARLUX	Progreso	3-Nov	19-Feb	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	26+535	26+535	SARLUX	Progreso	13-Ene	25-Feb	9
Servicios Afectados	2	Eléctrica	35+015	35+015	ORITECNO	Juanicó	15-Feb	30-Mar	20
Servicios Afectados	2	Eléctrica	35+271	35+271	ORITECNO	Juanicó	30-Nov	30-Mar	20
Servicios Afectados	2	Eléctrica	35+580	35+580	ORITECNO	Juanicó	15-Feb	30-Abr	20
Servicios Afectados	2	Eléctrica	37+632	37+632	ORITECNO	Canelones	15-Ene	15-Mar	20
Servicios Afectados	2	Eléctrica	40+104	40+104	ORITECNO	Canelones	15-Ene	15-Mar	20
Servicios Afectados	2	Eléctrica	42+572	42+572	ORITECNO	Canelones	1-Feb	1-Mar	11
Servicios Afectados	2	Eléctrica	42+868	42+868	ORITECNO	Canelones	27-Ago	1-Mar	11
Servicios Afectados	2	Eléctrica	43+535	43+535	ORITECNO	Canelones	15-Feb	1-Mar	11
Servicios Afectados	2	Eléctrica	43+885	43+885	ORITECNO	Canelones	1-Feb	1-Mar	11
Servicios Afectados	2	Eléctrica	43+892	43+892	ORITECNO	Canelones	15-Feb	30-Mar	20
Servicios Afectados	2	Eléctrica	44+348	44+348	ORITECNO	Canelones	1-Feb	30-Mar	20
Servicios Afectados	2	Eléctrica	45+603	45+603	ORITECNO	Canelones	15-Feb	15-Mar	20
Servicios Afectados	2	Eléctrica	66+649	66+649	ORITECNO	25 de Agosto	28-Feb	30-Mar	10
Servicios Afectados	2	Eléctrica	70+138	70+138	ORITECNO	E/Independencia y Cardal	30-Nov	25-Feb	9
Servicios Afectados	2	Eléctrica	75+518	75+518	ORITECNO	Cardal (Incluye Variantes)	1-Feb	1-Mar	11
Servicios Afectados	3	Eléctrica	89+820	89+820	BERKES	25 de Mayo	4-Mar	4-Mar	1
Servicios Afectados	3	Eléctrica	102+855	102+855	BERKES	Florida	10-Feb	22-Feb	6
Servicios Afectados	3	Eléctrica	106+310	106+310	BERKES	Florida	8-Mar	9-Mar	2
Servicios Afectados	3	Eléctrica	109+360	109+360	BERKES	Florida	8-Mar	9-Mar	2
Servicios Afectados	3	Eléctrica	132+842	132+842	BERKES	E/La Cruz y Pintado	15-Feb	16-Feb	2
Servicios Afectados	3	Eléctrica	132+843	132+843	BERKES	E/La Cruz y Pintado	15-Feb	16-Feb	2
Servicios Afectados	4	Eléctrica	152+149	152+149	BERKES	Variante Sarandí Grande	17-Feb	18-Feb	2
Servicios Afectados	4	Eléctrica	152+150	152+150	BERKES	Variante Sarandí Grande	17-Feb	18-Feb	2
Servicios Afectados	4	Eléctrica	191+907	191+907	BERKES	Durazno	15-Feb	17-Feb	3
Servicios Afectados	4	Eléctrica	192+141	192+141	BERKES	Durazno	15-Feb	17-Feb	3
Servicios Afectados	4	Eléctrica	194+530	194+530	BERKES	Durazno	11-Mar	11-Mar	1
Servicios Afectados	4	Eléctrica	198+245	198+245	BERKES	Durazno	26-Feb	12-Mar	11
Servicios Afectados	5	Eléctrica	235+706	235+706	BERKES	Carlos Reyles	12-Mar	13-Mar	1
Servicios Afectados	5	Eléctrica	235+905	235+905	BERKES	Carlos Reyles	3-Mar	3-Mar	1
Servicios Afectados	5	Eléctrica	236+177	236+177	BERKES	Carlos Reyles	17-Feb	18-Feb	2
Servicios Afectados	5	Eléctrica	249+435	249+435	BERKES	E/C. Reyles y Centenario	1-Mar	2-Mar	2
Servicios Afectados	5	Eléctrica	256+726	256+726	BERKES	Desvío UPM 2	2-Mar	2-Mar	1
Servicios Afectados	5	Eléctrica	256+730	256+730	BERKES	Desvío UPM 2	4-Mar	4-Mar	1
Servicios Afectados	5	Eléctrica	256+950	256+950	BERKES	Desvío UPM 2	5-Mar	5-Mar	1
Servicios Afectados	5	Eléctrica	261+315	261+315	BERKES	Centenario-Paso de los Toros	8-Mar	9-Mar	2



Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 7/2021

1	Montevideo-Progreso
2	Progreso-25 de Mayo
3	25 de Mayo-Sarandí Grande
4	Sarandí Grande-Durazno
5	Durazno-Paso de los Toros
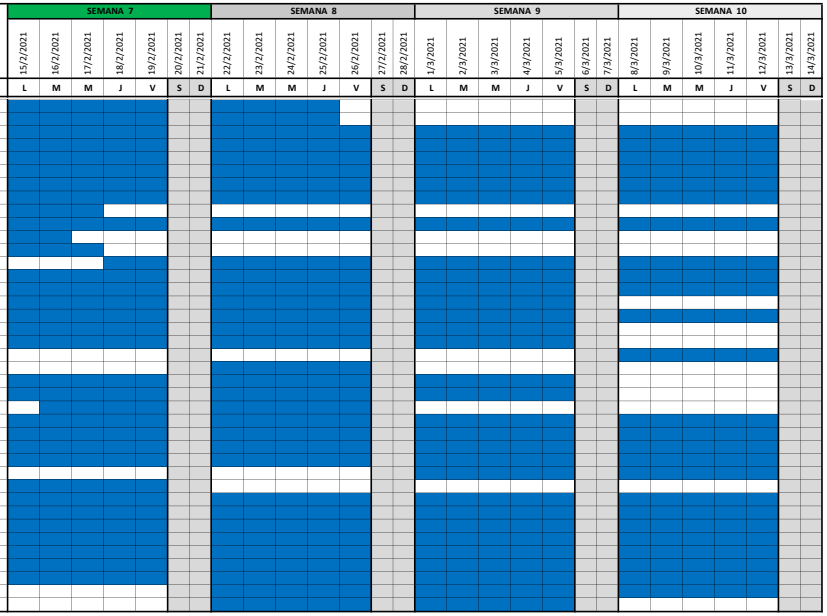
Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	4+417	4+417	SARLUX	Montevideo	9-Dic	25-Feb	9
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	4+418	4+418	SARLUX	Montevideo	9-Dic	25-Feb	9
Balasto y Sub-balasto de Vía	4	Acopio de Balasto / subbalasto	149+000			Variante Sarandí Grande	15-Feb	12-Mar	20
Balasto y Sub-balasto de Vía	4	Acopio de Balasto / subbalasto	192+500			Durazno	15-Feb	12-Mar	20
Balasto y Sub-balasto de Vía	5	Acopio de Balasto / Subbalasto	221+200		Acopio El Remanso	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	15-Feb	12-Mar	20
Balasto y Sub-balasto de Vía	5	Acopio de Balasto / Subbalasto	234+000		Acopio Campo Javier	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	15-Feb	12-Mar	20
Trinchera Capurro	1	Muros de Contención	4+100	4+100	Construcción Muro de Contención- Uruguayana a Pk +	Trinchera Capurro	15-Feb	12-Mar	20
Trinchera Capurro	1	Pilotaje	4+100		PK 4+100 Uruguayana a PK-	Trinchera Capurro	15-Feb	12-Mar	20
Trinchera Capurro	1	Pilotaje	3+537		Zona Entre Bvar Artigas y Capurro	Trinchera Capurro	15-Feb	17-Feb	3
Trinchera Capurro	1	Desvío	4+000		Desvío Uruguayana	Trinchera Capurro	15-Feb	12-Mar	20
Trinchera Capurro	1	Cerramiento	4+000		Construcción cerramiento provisorio de obra	Trinchera Capurro	15-Feb	16-Feb	2
Trinchera Capurro	1	Muro Guía	4+000		Construcción Muro Guía	Trinchera Capurro	15-Feb	17-Feb	3
Trinchera Capurro	1	Vigas de Atado	3+357		Vigas de Atado	Trinchera Capurro	18-Feb	12-Mar	17
Trinchera Las Piedras	1	Desvios	19+340		B037- Liber Seregñi- Desvíos	Trinchera Las Piedras	15-Feb	12-Mar	20
Trinchera Las Piedras	1	Muros de Trinchera	19+340		B037- Liber Seregñi- Acondicionamiento Base Fondo, Hormigón de Limpieza y Lo	Trinchera Las Piedras	15-Feb	12-Mar	20
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	19+480		Pilotera 2 - Pk 19+480_ B031 y B032	Trinchera Las Piedras	15-Feb	5-Mar	15
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	19+860		Pilotera 3- 18+860_ Inicio Trinchera a Pk +	Trinchera Las Piedras	15-Feb	12-Mar	20
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	19+220		Pilotera 4- _ 19+220- B029- A Pk -	Trinchera Las Piedras	15-Feb	5-Mar	15
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	19+850		Desmoche - B034 a B035	Trinchera Las Piedras	15-Feb	5-Mar	15
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	19+850		Desmoche - B030 a B031	Trinchera Las Piedras	8-Mar	12-Mar	5
Trinchera Las Piedras	1	Cerramiento	19+650		Construcción cerramiento provisorio de obra Zona Hospital	Trinchera Las Piedras	22-Feb	26-Feb	5
Trinchera Las Piedras	1	Cerramiento	19+650		Demolición de muro Zona Hospital	Trinchera Las Piedras	15-Feb	5-Mar	15
Trinchera de Usher- Calleros	3	Conformación de desvio-Transito	106+470		APOYO NUEVOS DESVIOS	Florida	1-Feb	5-Mar	15
Trinchera de Usher- Calleros	3	servicios afectados- OSE	106+470	106+470		Florida	16-Feb	26-Feb	9
Trinchera de Usher- Calleros	3	Demoliciones	106+470	106+470	tramites DEMOLICION 17/2	Florida	15-Feb	12-Mar	20
Trinchera de Usher- Calleros	3	Marco Guia	106+470	106+470	rearmdo y nuevos	Florida	15-Feb	28-Mar	20
Trinchera de Usher- Calleros	3	Vaciado de Marco Guia	106+470	106+470	tramites	Florida	9-Feb	29-Mar	20
Trinchera de Usher- Calleros	3	Replanteo	106+470	106+470	tramites	Florida	9-Feb	28-Jun	20
Trinchera de Usher- Calleros	3	Pilotaje	106+470	106+470	tramites	Florida	1-Mar	28-Jun	10
Trinchera de Usher- Calleros	3	Extraccion Tanque Gasoil	106+470	106+470	SUBCONTRATO BIPLA - EXTRAE TANQUES VIEJOS	Florida	15-Feb	19-Feb	5
Obradores	4	Obrador Durazno	192+500		Carga, descarga y transporte de materiales	Durazno	15-Feb	12-Mar	20
Obradores	4	Obrador Durazno	192+500		Fabricación prelosas	Durazno	15-Feb	12-Mar	20
Obradores	4	Obrador Durazno	192+500		Fabricación Aletas	Durazno	15-Feb	12-Mar	20
Reposición de Caminos	4	Mantenimiento de accesos y caminos			Todo el tramo		15-Feb	12-Mar	20
Vías	3	Producción de durmientes	109+000		Planta de durmientes	Florida	15-Feb	12-Mar	20
Vías	3	Preparación de fijaciones	109+000		Planta de durmientes	Florida	15-Feb	12-Mar	20
Vías	3	Producción de soldaduras eléctricas	109+000		Planta de soldadura eléctrica	Florida	15-Feb	12-Mar	20
Vías	3	Montaje de via secundaria - Planta de Soldadura	109+000		Planta de soldadura eléctrica	Florida	22-Feb	12-Mar	15
Vías	3	Carga, transporte y descarga de ADV's	109+000		Planta de soldadura eléctrica	Florida	22-Feb	5-Mar	10
