Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 28/2021

1	Montevideo-Progreso
2	Progreso-25 de Mayo
3	25 de Mayo-Sarandí Grande
4	Sarandí Grande-Durazno
5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración
Servicios Afectados	1	Frente Cateos	+726	30+000	RR - OSE/IMM	Montevideo	22-Jun	6-Ago	20
Servicios Afectados	1	Frente Cateos	+726	3+000	ES - UTE	Montevideo	22-Jun	6-Ago	20
Servicios Afectados	1	Frente Cateos	+726	40+000	MC - OSE/ANTEL/ANTENA	Montevideo	22-Jun	6-Ago	20
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+726	+726	SARLUX	Montevideo	31-May	23-Jul	10
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	+735	+735	Insaco	Montevideo	20-Jul	30-Jul	9
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+942	+942	SARLUX	Montevideo	31-May	24-Jul	10
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+120	1+120	SARLUX	Montevideo	31-May	25-Jul	10
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	1+133	1+133	Insaco	Montevideo	26-Jul	2-Ago	6
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	1+145	1+145	Ciemsa	Montevideo	19-Jul	24-Jul	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+219	1+219	SARLUX	Montevideo	31-May	26-Jul	11
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+229	1+229	SARLUX	Montevideo	12-May	26-Jul	11
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	1+245	1+245	Ciemsa	Montevideo	19-Jul	24-Jul	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+323	1+323	SARLUX	Montevideo	29-Ene	30-Jul	15
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	1+354	1+354	Ciemsa	Montevideo	23-Jul	26-Jul	2
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	1+355	1+355	Ciemsa	Montevideo	23-Jul	26-Jul	2
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+420	1+420	SACEEM	Montevideo	20-May	15-Jul	4
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+427	1+427	SARLUX	Montevideo	31-May	30-Jul	15
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+428	1+428	SACEEM	Montevideo	20-May	15-Jul	4
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+429	1+429	SARLUX	Montevideo	19-Abr	30-Jul	15
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+433	1+433	SARLUX	Montevideo	12-Abr	26-Jul	11
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+448	1+448	SACEEM	Montevideo	20-May	15-Jul	4
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+491	1+491	SARLUX	Montevideo	13-Abr	26-Jul	11
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+540	1+540	SACEEM	Montevideo	20-May	15-Jul	4
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+615	1+615	SACEEM	Montevideo	20-May	15-Jul	4
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+652	1+652	SARLUX	Montevideo	14-Abr	26-Jul	11
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+860	1+860	SARLUX	Montevideo	6-May	26-Jul	11
Servicios Afectados	1	Eléctrica	2+003	2+003	SARLUX	Montevideo	10-May	26-Jul	11
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	2+223	2+223	Gofinal	Montevideo	2-Ago	20-Ago	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	2+320	2+320	SARLUX	Montevideo	10-May	26-Jul	11
Servicios Afectados	1	Eléctrica	2+340	2+340	SACEEM	Montevideo	28-Abr	30-Jul	15
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	2+884	2+884	Insaco	Montevideo	26-Jul	2-Ago	6
Servicios Afectados	1	Eléctrica	2+886	2+886	SACEEM	Montevideo	15-Mar	20-Jul	7
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	3+001	3+001	Saceem	Montevideo	13-Jul	31-Jul	14
Servicios Afectados	1	Gas	3+003	3+003	Gofinal	Montevideo	12-Jul	18-Jul	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	3+004	3+004	Saceem	Montevideo	13-Jul	31-Jul	14
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	3+005	3+005	Saceem	Montevideo	13-Jul	31-Jul	14
Trinchera Capurro	1	Prefabricados drenajes longitudinales	3+100		Canales abiertos de Trinchera Capurro	Trinchera Capurro	12-Jul	6-Ago	20
Trinchera Capurro	1	Pilotaje	3+200		Pantallas transversales entre Bvar Artigas y Capurro / Pilotes Hnos Gil (P3)	Trinchera Capurro	19-Jul	6-Ago	15
Trinchera Capurro	1	Pilotaje	3+200		Pantallas transversales entre Capurro y PK 4+100 y pilotaje entre PK 3+880 y 3+5	Trinchera Capurro	19-Jul	6-Ago	15
Trinchera Capurro	1	Puente B004 - Hnos Gil	3+340		Losa puente	Trinchera Capurro	12-Jul	14-Jul	3
Trinchera Capurro	1	Pilotaje	3+600		Zona Entre Flanghini y Fco Gomez (P3)	Trinchera Capurro	12-Jul	16-Jul	5
Servicios Afectados	1	Gas	3+625	3+625	Gofinal	Trinchera Capurro	19-Jul	30-Jul	10
Trinchera Capurro	1	Vigas de Atado	3+640		Vigas de Atado entre Flangini y Fco Gomez	Trinchera Capurro	12-Jul	6-Ago	20
Demoliciones	1	Demolición/Muro	3+775	3+775	Padrón 56705 (muro nuevo)	Trinchera Capurro	5-Jul	14-Jul	3
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	3+830	3+830	Saceem	Trinchera Capurro	18-Feb	18-Jul	5
Demoliciones	1	Demolición/Muro	3+857	3+857	Padrón 56695 (muro nuevo)	Trinchera Capurro	14-Jul	23-Jul	8
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	3+878	3+878	Saceem	Trinchera Capurro	20-Jul	25-Jul	4
Servicios Afectados	1	Eléctrica	3+879	3+879	SACEEM	Trinchera Capurro	1-Jun	20-Jul	7
Demoliciones	1	Demolición/Muro	3+934	3+934	Padrón 118902 (muro nuevo bajo + reja)	Trinchera Capurro	26-Jul	6-Ago	10
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	3+950	3+950	Saceem	Trinchera Capurro	4-Mar	23-Jul	10
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	3+950	3+950	Saceem	Trinchera Capurro	5-Jul	1-Ene	20
Trinchera Capurro	1	Desvío	4+000		Desvío Uruguayana	Trinchera Capurro	12-Jul	6-Ago	20
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+307	4+307	SACEEM	Montevideo	16-Feb	20-Jul	7
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	4+310	4+310	Saceem	Montevideo	11-Jul	22-Jul	9
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+404	4+404	SARLUX	Montevideo	20-Ene	30-Jul	15
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	4+663	4+663	Insaco	Montevideo	26-Jul	7-Ago	10
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	4+781	4+781	Insaco	Montevideo	26-Jul	7-Ago	10
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	4+787	4+787	Insaco	Montevideo	2-Ago	14-Ago	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+797	4+797	SARLUX	Montevideo	4-Jun	21-Jul	8
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+894	4+894	SACEEM	Montevideo	21-Jul	30-Ago	13
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	4+897	4+897	Insaco	Montevideo	14-Jul	26-Jul	9
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+906	4+906	SARLUX	Montevideo	31-May	21-Jul	8
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+937	4+937	SARLUX	Montevideo	31-May	21-Jul	8
Servicios Afectados	1	Eléctrica	5+590	5+590	SACEEM	Montevideo	20-Ene	15-Jul	4
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	6+119	6+119	Insaco	Montevideo	12-Jul	4-Ago	18
Servicios Afectados	1	Eléctrica	6+298	6+298	SARLUX	Montevideo	17-May	21-Jul	8
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	6+458	6+458	Insaco	Montevideo	12-Jul	5-set	20
Servicios Afectados	1	Eléctrica	6+820	6+820	SARLUX	Montevideo	31-May	21-Jul	8
Servicios Afectados	1	Eléctrica	6+969	6+969	SACEEM	Montevideo	19-Jul	24-Ago	15
Demoliciones	1	Demolición/Muro	6+985	6+985	Padrón 51210 (muro nuevo)	Montevideo	19-Jul	19-Jul	1
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	6+985	6+985	Saceem	Montevideo	22-Jul	4-Ago	10
Movimiento de Suelos	1	Desmonte	7+000	9+000	Excavación Frente 2, en traza y bifurcación Peñarol	Montevideo	12-Jul	6-Ago	20
Servicios Afectados	1	Eléctrica	7+371	7+371	SACEEM	Montevideo	26-Jul	30-Ago	10
Servicios Afectados	1	Gas	7+447	7+447	Gofinal	Montevideo	26-Jul	6-Ago	10
Servicios Afectados	1	Gas	7+448	7+448	Gofinal	Montevideo	26-Jul	6-Ago	10
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	7+463	7+463	Insaco	Montevideo	21-Jul	31-Jul	8
Servicios Afectados	1	Gas	7+921	7+921	Gofinal	Montevideo	19-Jun	14-Jul	3
Movimiento de Suelos	1	Terraplén	8+200	8+300	Relleno (Sub Contr- Grinor)	Montevideo	12-Jul	30-Jul	15
Balasto y Sub balasto de Vía	1	Acopio de Balasto	8+200		Acopio Obrador Sayago	Montevideo	12-Jul	6-Ago	20
Movimiento de Suelos	1	Terraplén Ramal Peñarol Eje 360	8+500	8+500	Relleno (Sub Contr- Grinor) - Eje 360 Ramal del PK 0+250 a 0+460	Montevideo	12-Jul	16-Jul	5
Movimiento de Suelos	1	Terraplén Ramal Peñarol Eje 362	8+500	8+500	Relleno (Sub Contr- Grinor) - Eje 362 Ramal del PK 0+220 a 0+720	Montevideo	12-Jul	5-Ago	19
Servicios Afectados	1	Eléctrica	8+809	8+809	SACEEM	Montevideo	31-May	20-Jul	7
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	8+838	8+838	Gofinal	Montevideo	22-Jun	23-Jul	10
Vías	1	Carga, transporte y descarga de durmientes en obrador de Sayago	9+000		Planta de durmientes	Montevideo	12-Jul	6-Ago	20
Servicios Afectados	1	Gas	9+250	9+250	Ciemsa	Montevideo	26-Jul	6-Ago	10
Servicios Afectados	1	Gas	9+279	9+279	Gofinal	Montevideo	26-Jul	30-Jul	5
Servicios Afectados	1	Gas	9+311	9+311	Ciemsa	Montevideo	20-Jul	27-Jul	6
Servicios Afectados	1	Eléctrica	9+316	9+316	SACEEM	Montevideo	8-Abr	18-Jul	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	9+356	9+356	SACEEM	Montevideo	13-Ene	19-Jul	6
Servicios Afectados	1	Eléctrica	9+837	9+837	SACEEM	Montevideo	24-May	26-Ago	20
Servicios Afectados	1	Eléctrica	9+841	9+841	SACEEM	Montevideo	14-Dic	15-Jul	4
Servicios Afectados	1	Eléctrica	10+070	10+070	SARLUX	Montevideo	4-Jun	30-Jul	15
Servicios Afectados	1	Eléctrica	10+116	10+116	SACEEM	Montevideo	25-Ene	15-Jul	4
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	10+125	10+125	Gofinal	Montevideo	13-Jul	28-Jul	12
Servicios Afectados	1	Gas	10+166	10+166	Gofinal	Montevideo	14-Jul	20-Jul	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	10+215	10+215	SACEEM	Montevideo	12-Ene	30-Jul	15
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	10+626	10+626	Gofinal	Montevideo	23-Jul	2-Ago	7
Servicios Afectados	1	Eléctrica	11+281	11+281	SACEEM	Montevideo	12-Ene	21-Jul	8
Servicios Afectados	1	Eléctrica	11+282	11+282	SACEEM	Montevideo	12-Ene	21-Jul	8
Movimiento de Suelos	1	B022- Cuña Transición	12+347		Frente Cuña de transición	Montevideo	4-Ago	6-Ago	3
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	13+100	13+100	Saceem	Montevideo	8-Abr	30-Jul	15

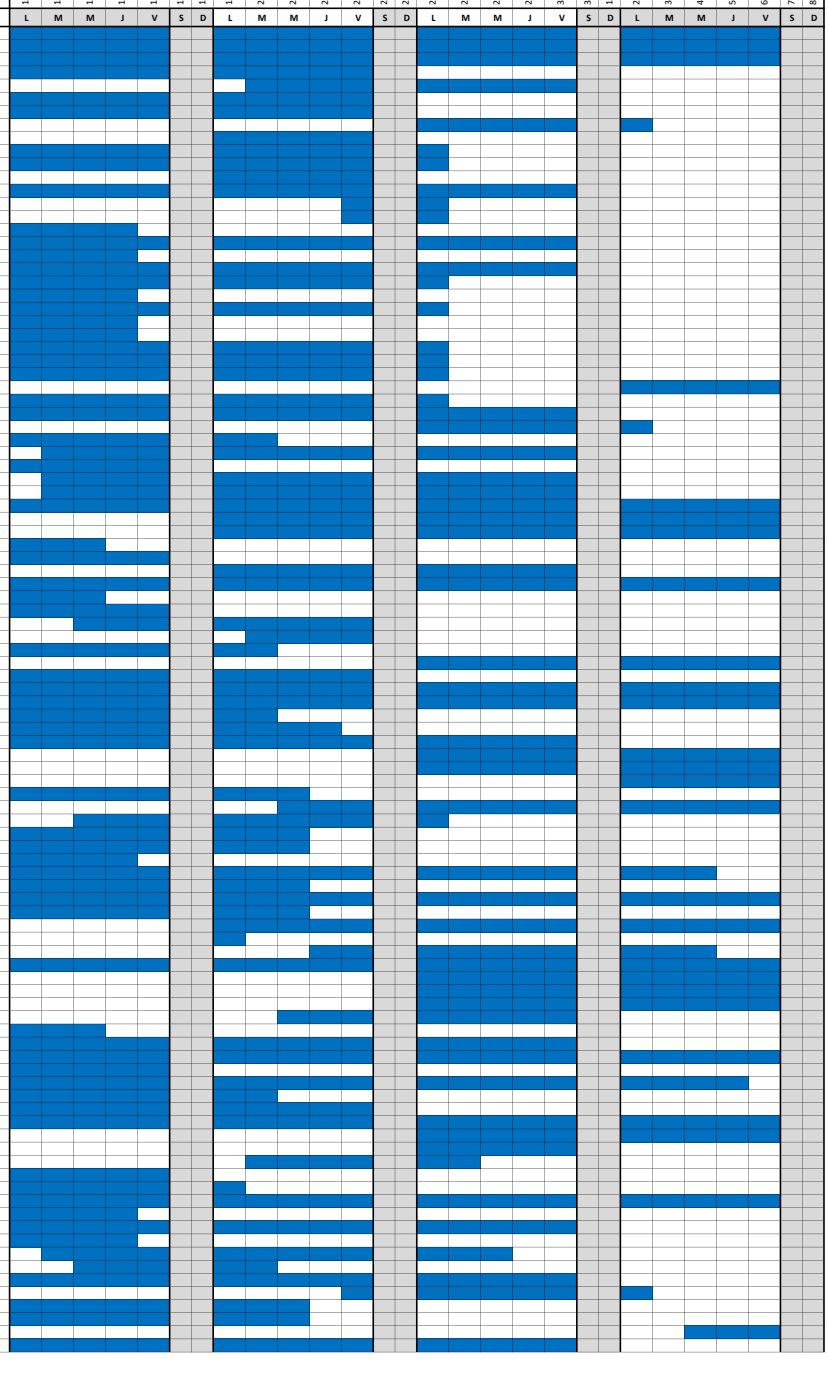

Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 28/2021

1	Montevideo-Progreso
2	Progreso-25 de Mayo
3	25 de Mayo-Sarandí Grande
4	Sarandí Grande-Durazno
5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	13+199	13+199	Saceem	Montevideo	8-Abr	30-Jul	15
Trinchera Ruta 102	1	Preparación de terreno	13+200		Para pilotera, mixer y muro guía	La Paz	12-Jul	6-Ago	20
Trinchera Ruta 102	1	Desmoche	13+200		Desmoche pilotes M5	La Paz	12-Jul	21-Jul	8
Trinchera Ruta 102	1	Desmoche	13+200		Desmoche pilotes M4 noroeste	La Paz	22-Jul	6-Ago	12
Trinchera Ruta 102	1	Viga de atado	13+200		Viga de atado M5	La Paz	12-Jul	6-Ago	20
Trinchera Ruta 102	1	Pilotaje	13+200		Ejecución de pilotes M4 Oeste	La Paz	12-Jul	6-Ago	20
Trinchera Ruta 102	1	Muro Guía	13+200		Ejecución de muro guía - M4 oeste	La Paz	12-Jul	21-Jul	8
Trinchera Ruta 102	1	Muros de Contención	13+200		Muro de contención M5 Este - Excavación/Saneo/Hormigonado	La Paz	12-Jul	6-Ago	20
Trinchera Ruta 102	1	Desvios	13+200		MD5 de desvios provisorios Noroeste	La Paz	14-Jul	6-Ago	18
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	13+203	13+203	Gofinal	La Paz	24-May	23-Jul	10
Servicios Afectados	1	Eléctrica	13+268	13+268	SACEEM	La Paz	5-Abr	23-Ago	20
Servicios Afectados	1	Eléctrica	13+619	13+619	SACEEM	La Paz	30-Nov	25-Jul	10
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	14+794	14+794	Insaco	La Paz	26-Jul	1-Ago	5
Servicios Afectados	1	Gas	14+804	14+804	Ciemsa	La Paz	15-Jul	19-Jul	3
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	15+683	15+683	Ciemsa	La Paz	26-Jul	2-Ago	6
Servicios Afectados	1	Eléctrica	15+694	15+694	SACEEM	La Paz	7-Dic	30-Jul	15
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	15+701	15+701	Gofinal	La Paz	26-Jul	12-Ago	10
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	1	B026 - Marco rectandular 3x3 De la Merced	16+972		Construcción- (Sub Contr- Ferralia) -Aletas	La Paz	12-Jul	23-Jul	10
Servicios Afectados	1	Eléctrica	17+393	17+393	SARLUX	La Paz	30-Nov	23-Jul	10
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	18+870		Pilotera 5- Pantalla pilotes transversales	Trinchera Las Piedras	12-Jul	5-Ago	19
Trinchera Las Piedras	1	Drenajes	18+870		Inicio PK 18+870 a B028 (Etapa 1)	Trinchera Las Piedras	12-Jul	6-Ago	20
Trinchera Las Piedras	1	Excavación en trinchera	18+870		Inicio PK 18+870 a B182 (Etapa 1)	Trinchera Las Piedras	26-Jul	6-Ago	10
Servicios Afectados	1	Eléctrica	19+093	19+093	SACEEM	Trinchera Las Piedras	14-set	30-Jul	15
Trinchera Las Piedras	1	Viga de atado	19+102		Desmoche B182 a B029	Trinchera Las Piedras	12-Jul	6-Ago	20
Trinchera Las Piedras	1	Viga de atado	19+102		B182 a B029 (Etapa 1)	Trinchera Las Piedras	12-Jul	6-Ago	20
Servicios Afectados	1	Gas	19+107	19+107	Gofinal	Trinchera Las Piedras	28-Jun	13-Jul	2
Servicios Afectados	1	Eléctrica	19+228	19+228	SACEEM	Trinchera Las Piedras	21-Jun	30-Jul	15
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	19+237	19+237	Saceem	Trinchera Las Piedras	25-Jun	16-Jul	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	19+240	19+240	Saceem	Trinchera Las Piedras	5-Jul	25-Jul	10
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	19+241	19+241	Saceem	Trinchera Las Piedras	5-Jul	25-Jul	10
Trinchera Las Piedras	1	B029 - Aparicio Saravia	19+255		Losas de veredas con canalizaciones	Trinchera Las Piedras	12-Jul	20-Jul	7
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	19+300	19+300	Saceem	Trinchera Las Piedras	18-Jun	25-Jul	10
Servicios Afectados	1	Eléctrica	19+347	19+347	SACEEM	Trinchera Las Piedras	17-May	22-Jul	9
Trinchera Las Piedras	1	Desvios	19+360		B030 - Baltasar Brum	Trinchera Las Piedras	19-Jul	6-Ago	15
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	19+360		Pilotera 1- B030_ Baltasar Brum	Trinchera Las Piedras	19-Jul	30-Jul	10
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	19+548	19+548	Saceem	Trinchera Las Piedras	15-Jul	29-Ago	17
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	19+550	19+550	Saceem	Trinchera Las Piedras	15-Jul	28-Ago	17
Trinchera Las Piedras	1	B032- Av. Instrucciones	19+565		Losas de veredas con canalizaciones	Trinchera Las Piedras	29-Jul	6-Ago	7
Servicios Afectados	1	Eléctrica	19+676	19+676	SACEEM	Trinchera Las Piedras	19-Jun	23-Jul	10
Trinchera Las Piedras	1	Desvios	19+771		B034- Batlle y Ordoñez	Trinchera Las Piedras	12-Jul	6-Ago	20
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	19+771		Pilotera 1- B034_ Batlle y Ordoñez	Trinchera Las Piedras	12-Jul	16-Jul	5
Trinchera Las Piedras	1	Viga de atado	19+771		Desmoche B034	Trinchera Las Piedras	15-Jul	20-Jul	4
Trinchera Las Piedras	1	Viga de atado	19+771		Desmoche B030	Trinchera Las Piedras	29-Jul	3-Ago	4
Trinchera Las Piedras	1	B034 - Batlle y Ordoñez	19+771		Losa vehicular	Trinchera Las Piedras	21-Jul	30-Jul	8
Trinchera Las Piedras	1	B035 - Luis Alberto Herrera	19+872		Losas de veredas con canalizaciones	Trinchera Las Piedras	21-Jul	28-Jul	6
Servicios Afectados	1	Gas	19+955	19+955	Gofinal	Trinchera Las Piedras	19-Jul	30-Jul	10
Demoliciones	1	Demolición/Muro	19+973	19+973	Padrón 14843 (muro nuevo)	Trinchera Las Piedras	5-Jul	23-Jul	10
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	19+977		Pilotera 4- W.F. Aldunate a Seregni	Trinchera Las Piedras	12-Jul	6-Ago	20
Demoliciones	1	Demolición/Muro	19+984	19+984	Padrón 80 (demolición muro + nuevo muro)	Trinchera Las Piedras	19-Jul	30-Jul	10
Demoliciones	1	Demolición/Muro	20+000	20+000	Padrón 79 (demolición muro + nuevo muro)	Trinchera Las Piedras	26-Jul	6-Ago	10
Demoliciones	1	Demolición/Muro	20+016	20+016	Padrón 5752 (demolición muro + nuevo muro)	Trinchera Las Piedras	2-Ago	16-Ago	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	20+194	20+194	Ventus	Trinchera Las Piedras	25-Ene	2-Oct	20
Servicios Afectados	1	Eléctrica	20+220	20+220	SACEEM	Trinchera Las Piedras	27-Jul	30-Ago	9
Trinchera Las Piedras	1	Desvios	20+228		B037- Liber Seregni- Desvíos	Trinchera Las Piedras	12-Jul	6-Ago	20
Trinchera Las Piedras	1	Muros de Trinchera	20+228		Muro U3- Zona Pk 20100-Construcción- Muro de Trinchera	Trinchera Las Piedras	12-Jul	23-Jul	10
Trinchera Las Piedras	1	Muros de Trinchera	20+228		Muro U3- Zona Pk 20100-Construcción- Solera	Trinchera Las Piedras	26-Jul	6-Ago	10
Trinchera Las Piedras	1	B037- Seregni	20+228		Losas de veredas con canalizaciones	Trinchera Las Piedras	19-Jul	30-Jul	10
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	20+300		Pilotera 3 - Muro U3 a Final	Trinchera Las Piedras	12-Jul	6-Ago	20
Movimiento de Suelos	1	B039- Cuña Transición	20+700		Frente Cuña de transición	Las Piedras	19-Jul	3-Ago	12
Movimiento de Suelos	1	Prestamo	21+600		Prestamo para Relleno	Las Piedras	12-Jul	6-Ago	20
Servicios Afectados	1	Eléctrica	21+875	21+875	SARLUX	Las Piedras	8-Oct	23-Jul	10
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	21+940	21+940	Insaco	Las Piedras	19-Jul	31-Jul	10
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	22+226	22+226	Electrosistemas	Las Piedras	1-Jun	12-Jul	1
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	22+863	22+863	Electrosistemas	Las Piedras	26-Abr	15-Jul	4
Puentes	1	B045-Puente ferroviario - 2 Vías 15 m - VIAF -	23+574		Construcción Estribo Sur - Desencofrado y reparaciones menores	Las Piedras	12-Jul	16-Jul	5
Movimiento de Suelos	1	B046 - Cuña Transición	23+750		Frente Cuña de transición	Progreso	12-Jul	16-Jul	5
Movimiento de Suelos	1	Terraplén	24+000	25+000	Relleno Frentes	Progreso	26-Jul	6-Ago	10
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	1	B047 - Marco rectangular 4x5 Florencio Sanchez	24+090		Construcción- (Sub Contr- Ventus) - Marcos y aletas	Progreso	12-Jul	6-Ago	20
Movimiento de Suelos	1	Desmonte	24+500	25+000	Excavación Frente 1	Progreso	12-Jul	6-Ago	20
Demoliciones	1	Demolición/Muro	25+725	25+725	Padrón 4840 (demolición muros + nuevo muro)	Progreso	26-Jul	26-Ago	10
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	26+042	26+042	SARLUX	Progreso	22-Jun	30-Jul	15
Servicios Afectados	1	Eléctrica	26+535	26+535	SARLUX	Progreso	13-Ene	23-Jul	10
Movimiento de Suelos	1	Terraplén	27+500	25+500	Relleno Frentes	Progreso	12-Jul	6-Ago	20
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	30+000	36+000		E/Progreso y Juanicó	12-Jul	6-Ago	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	30+000	36+000		E/Progreso y Juanicó	12-Jul	6-Ago	20
Puentes	2	B54	34+551		Estructura	Juanicó	16-Jul	27-Jul	8
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	36+000	36+500		Juanicó	12-Jul	30-Jul	15
Movimiento de Suelos	2	B939- Paso a Ganado	36+637		Excavacion	Juanicó	12-Jul	10-Ago	20
Puentes	2	B55	36+637		Montaje vigas prefabricadas, prelosas y armado de tableros.	Juanicó	16-Jul	22-Jul	5
Servicios Afectados	2	Eléctrica	40+104	40+104	ORITECNO	Canelones	15-Ene	15-Ago	20
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+200	42+200	Gofinal	Canelones	26-Jul	13-Ago	10
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+222	42+222	Gofinal	Canelones	29-Jul	15-Ago	7
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+223	42+223	Gofinal	Canelones	29-Jul	15-Ago	7
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+226	42+226	Gofinal	Canelones	1-Ago	11-Ago	5
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+232	42+232	Gofinal	Canelones	1-Ago	11-Ago	5
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+247	42+247	Gofinal	Canelones	6-Ago	16-Ago	1
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+263	42+263	Gofinal	Canelones	26-Jul	5-Ago	9
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+263	42+264	Gofinal	Canelones	26-Jul	5-Ago	9
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	43+242	43+242	Gofinal	Canelones	5-Ago	11-Ago	2
Servicios Afectados	2	Eléctrica	43+892	43+892	ORITECNO	Canelones	15-Feb	15-Ago	20
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	44+988	44+988	Gofinal	Canelones	19-Jul	26-Jul	6
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	46+473	46+473	Gofinal	Canelones	12-Jul	19-Jul	6
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	46+618	46+618	Gofinal	Canelones	12-Jul	19-Jul	6
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	47+500	50+200	Macromáquinas	Canelones	12-Jul	6-Ago	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	47+500	50+200	Macromáquinas	Canelones	12-Jul	6-Ago	20
Puentes	2	B63	48+222		Montaje vigas prefabricadas, prelosas y armado de tableros.	Canelones	16-Jul	30-Jul	11
Puentes	2	B64	48+975		Estructura	Canelones	16-Jul	30-Jul	11
Puentes	2	B65	49+890		Pilotes	Canelones	13-Jul	14-Jul	2
Puentes	2	B65	49+890		Estructura	Canelones	16-Jul	30-Jul	11
Puentes	2	B67	50+696		Estructura	Canelones	12-Jul	16-Jul	5
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	51+000	51+500	Macromáquinas	Canelones	12-Jul	19-Jul	6

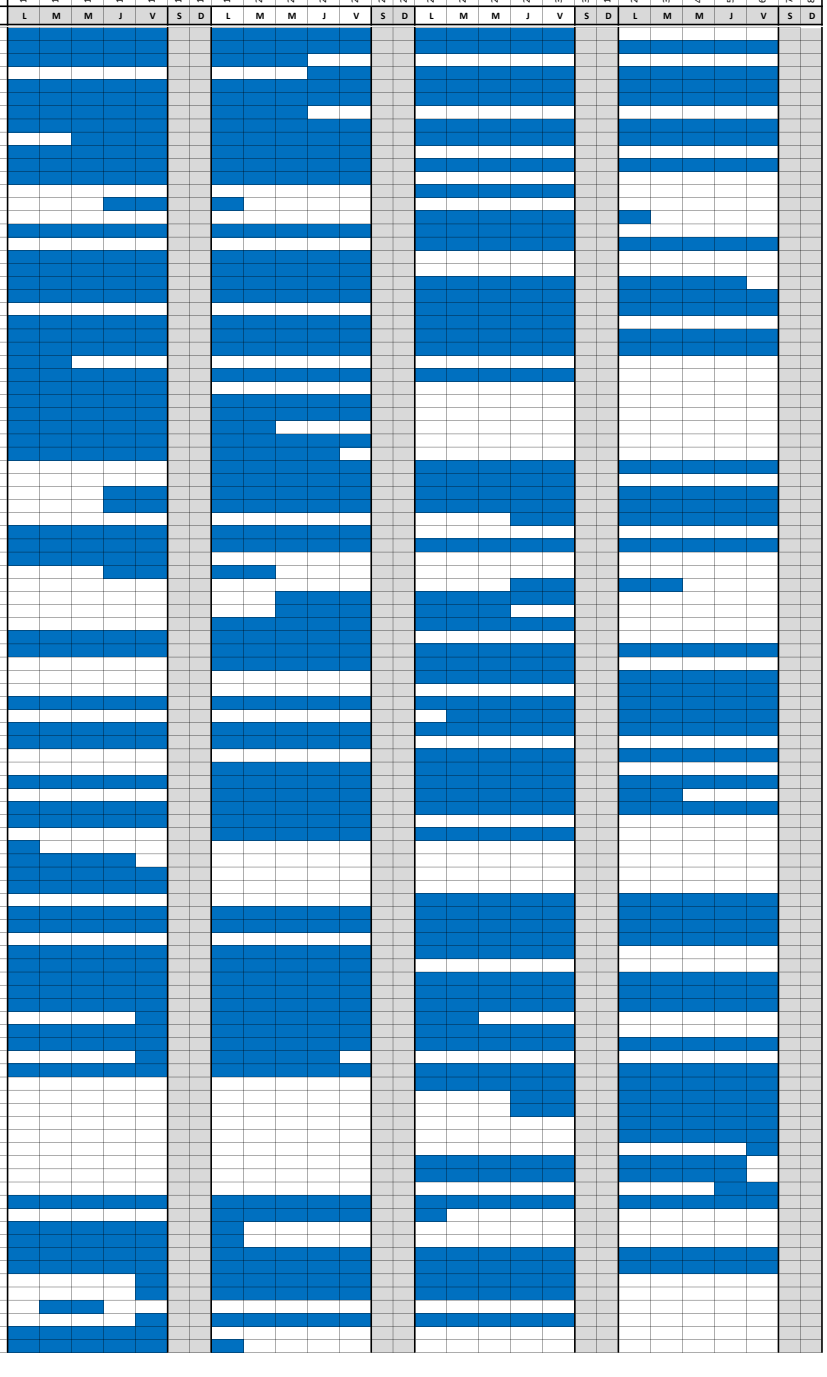

Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 28/2021

1	Montevideo-Progreso
2	Progreso-25 de Mayo
3	25 de Mayo-Sarandí Grande
4	Sarandí Grande-Durazno
5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	51+000	51+500	Macromáquinas	Canelones	12-Jul	6-Ago	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte en vías segundarias	51+300	51+700	Macromáquinas	Canelones	12-Jul	30-Jul	15
Puentes	2	B69	51+854		Estructura	Variante Santa Lucía	19-Jul	6-Ago	15
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	52+000	53+000	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	12-Jul	6-Ago	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	55+500	57+000	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	12-Jul	6-Ago	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	57+800	59+755	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	12-Jul	30-Jul	15
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	2	B077 - Marco 2 - 6x4	57+875			Variante Santa Lucía	12-Jul	6-Ago	20
Servicios Afectados	2	Alumbrado y TV Cable	60+885	60+885	SARLUX	25 de Agosto	21-Jun	15-Jul	4
Servicios Afectados	2	Alumbrado y TV Cable	60+920	60+920	SARLUX	25 de Agosto	21-Jun	15-Jul	4
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	2	C046 - Marco 3 0.8x0.8	62+295			25 de Agosto	12-Jul	6-Ago	20
Movimiento de Suelos	2	Préstamo	62+700		Préstamo	25 de Agosto	12-Jul	28-Jul	13
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	64+000	62+000		25 de Agosto	12-Jul	31-Jul	15
Servicios Afectados	2	Eléctrica	64+680	64+680	ORITECNO	25 de Agosto	29-Jun	20-Jul	7
Servicios Afectados	2	Eléctrica	64+840	64+840	ORITECNO	25 de Agosto	23-Nov	30-Jul	15
Movimiento de Suelos	2	PR 24	66+000	64+000	RUTA 77	25 de Agosto	12-Jul	10-Ago	20
Servicios Afectados	2	Eléctrica	66+649	66+649	ORITECNO	25 de Agosto	28-Feb	30-Jul	15
Paso de Fauna	2	B939	66+861		Estructura	Variante Independencia	15-Jul	6-Ago	17
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	2	B080 - Marco 1 - 6x4.8	67+490			Variante Independencia	15-Jul	6-Ago	17
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	2	B946 - Marco 1 - 4x3.5	67+517			Variante Independencia	26-Jul	6-Ago	10
Servicios Afectados	2	Eléctrica	68+720	68+720	ORITECNO	Variante Independencia	21-Jun	30-Jul	15
Servicios Afectados	2	Eléctrica	70+138	70+138	ORITECNO	E/Independencia y Cardal	29-Jun	20-Jul	7
Servicios Afectados	2	Eléctrica	74+115	74+115	BERKES	Cardal (Incluye Variantes)	15-Jul	30-Jul	12
Servicios Afectados	2	Eléctrica	74+249	74+249	BERKES	Cardal (Incluye Variantes)	15-Jul	30-Jul	12
Movimiento de Suelos	2	Préstamo	76+000		Préstamo	Cardal (Incluye Variantes)	12-Jul	28-Jul	13
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	78+000	69+000		Cardal (Incluye Variantes)	12-Jul	28-Jul	13
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	78+000	69+000		Cardal (Incluye Variantes)	12-Jul	13-Jul	2
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	78+000	76+000		Cardal (Incluye Variantes)	12-Jul	31-Jul	15
Movimiento de Suelos	2	PR 30-31-32	80+000	77+000	Camino apartadero	Cardal (Incluye Variantes)	12-Jul	31-Ago	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	2	B083 - Marco 3 - 3x3	81+380			Cardal (Incluye Variantes)	12-Jul	6-Ago	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	81+500	79+000		25 de Mayo	12-Jul	31-Jul	15
Puentes	2	B84	82+426		Montaje vigas prefabricadas, prelosas y armado de tableros.	25 de Mayo	19-Jul	30-Jul	10
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	82+500	82+000	Terraplén zona Inundable	25 de Mayo	12-Jul	31-Jul	15
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	2	B085 - Marco 3 - 3x3	85+088			25 de Mayo	12-Jul	6-Ago	20
Servicios Afectados	2	Alumbrado y TV Cable	87+360	87+360	SARLUX	25 de Mayo	21-Jun	20-Jul	7
Movimiento de Suelos	2	Préstamo	87+500		Préstamo	25 de Mayo	12-Jul	28-Jul	13
Servicios Afectados	2	Eléctrica	88+540	88+540	ORITECNO	25 de Mayo	15-Jun	30-Jul	15
Movimiento de Suelos	3	PR 33. retiro de material inadecuado	89+000	90+000	Atraso por lluvia y sus consecuencias	25 de Mayo	12-Jul	14-Jul	3
Movimiento de Suelos	3	PR 33. Terraplenado y desvio	89+000	90+000	Atraso por lluvia y sus consecuencias	25 de Mayo	12-Jul	14-Ago	20
Puentes	3	B087	89+145		Acabados finales en hormigon	25 de Mayo	12-Jul	23-Jul	10
Puentes	3	B087	89+145		Montaje de vigas	25 de Mayo	12-Jul	16-Jul	5
Puentes	3	B087	89+145		Armado de Losa y llenado	25 de Mayo	15-Jul	23-Jul	7
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	89+706	89+706	Replanteo de alcantarillas	25 de Mayo	14-Jul	14-Jul	1
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	89+706	89+706	Cama de apoyo suelo cemento	25 de Mayo	26-Jul	26-Jul	1
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	89+706	89+706	Colocación de caño	25 de Mayo	27-Jul	28-Jul	2
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	89+706	89+706	Tapada de caños	25 de Mayo	29-Jul	29-Jul	1
Puentes	3	B089	91+291		Acabados finales en hormigon	25 de Mayo	12-Jul	23-Jul	10
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	91+414	91+414	Replanteo de alcantarillas	25 de Mayo	22-Jul	22-Jul	1
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	91+414	91+414	Cama de apoyo suelo cemento	25 de Mayo	30-Jul	30-Jul	1
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	91+414	91+414	Colocación de caño	25 de Mayo	2-Ago	3-Ago	2
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	91+414	91+414	Tapada de caños	25 de Mayo	4-Ago	4-Ago	1
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	92+691	92+691	Replanteo de alcantarillas	25 de Mayo	29-Jul	29-Jul	1
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	92+691	92+691	Cama de apoyo suelo cemento	25 de Mayo	5-Ago	5-Ago	1
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	92+691	92+691	Colocación de caño	25 de Mayo	6-Ago	9-Ago	1
Puentes	3	B091	94+944		Armado y llenado de solera	25 de Mayo	12-Jul	23-Jul	10
Puentes	3	B091	94+944		Armado y llenado de muros	25 de Mayo	19-Jul	6-Ago	15
Puentes	3	B092	95+213		Armado y llenado de solera	25 de Mayo	19-Jul	30-Jul	10
Puentes	3	B092	95+213		Armado y llenado de muros	25 de Mayo	26-Jul	6-Ago	10
Puentes	3	B093	95+515		Estribos y pila	25 de Mayo	12-Jul	20-Jul	7
Puentes	3	B093	95+515		Preparacion de Mesetas	25 de Mayo	19-Jul	23-Jul	5
Puentes	3	B093	95+515		Montaje de vigas	25 de Mayo	26-Jul	30-Jul	5
Puentes	3	B093	95+515		Armado de Losa y llenado	25 de Mayo	2-Ago	6-Ago	5
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	97+183	97+183	Replanteo de alcantarillas	Berrondo	30-Jul	30-Jul	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	B94 3 Ø 1200 mm	98+183		Colocación de Aletas	Berrondo	26-Jul	26-Jul	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	B94 3 Ø 1200 mm	98+183		Colocación de Acero en Cabezales	Berrondo	27-Jul	29-Jul	3
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	B94 3 Ø 1200 mm	98+183		Encofrado Solera de Cabezales	Berrondo	30-Jul	30-Jul	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	B94 3 Ø 1200 mm	98+183		Hormigonado Solera de Cabezales	Berrondo	2-Ago	2-Ago	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	B94 3 Ø 1200 mm	98+183		Encofrado Frontal de Cabezal	Berrondo	3-Ago	4-Ago	2
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	B94 3 Ø 1200 mm	98+183		Hormigonado Frontal de Cabezal	Berrondo	5-Ago	5-Ago	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	B94 3 Ø 1200 mm	98+183		Desencofrado y Acabados	Berrondo	6-Ago	6-Ago	1
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	98+300	98+700	Retraso de inicio de la actividad por falta de desalojo de personas	Berrondo	12-Jul	6-Ago	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C089 3 Ø 800 mm	98+448		Colocación de Aletas	Berrondo	14-Jul	14-Jul	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C089 3 Ø 800 mm	98+448		Colocación de Acero en Cabezales	Berrondo	15-Jul	19-Jul	3
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C089 3 Ø 800 mm	98+448		Encofrado Solera de Cabezales	Berrondo	20-Jul	20-Jul	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C089 3 Ø 800 mm	98+448		Hormigonado Solera de Cabezales	Berrondo	21-Jul	21-Jul	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C089 3 Ø 800 mm	98+448		Encofrado Frontal de Cabezal	Berrondo	22-Jul	23-Jul	2
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C089 3 Ø 800 mm	98+448		Hormigonado Frontal de Cabezal	Berrondo	23-Jul	23-Jul	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C089 3 Ø 800 mm	98+448		Desencofrado y Acabados	Berrondo	26-Jul	27-Jul	2
Puentes	3	B095	98+845		Acabados finales en hormigon	Berrondo	12-Jul	23-Jul	10
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C090 1 Ø 800 mm	98+970		Colocación de Acero en Cabezales	Berrondo	12-Jul	14-Jul	3
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C090 1 Ø 800 mm	98+970		Encofrado de solera de cabezales	Berrondo	14-Jul	15-Jul	2
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C090 1 Ø 800 mm	98+970		Hormigonado Solera de Cabezales	Berrondo	16-Jul	16-Jul	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C090 1 Ø 800 mm	98+970		Encofrado Frontal de Cabezal	Berrondo	19-Jul	20-Jul	2
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C090 1 Ø 800 mm	98+970		Hormigonado Frontal de Cabezal	Berrondo	21-Jul	21-Jul	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C090 1 Ø 800 mm	98+970		Desencofrado y Acabados	Berrondo	22-Jul	23-Jul	2
Movimiento de Suelos	3	Confección de protocolos de sub-rasante	99+000	103+450	Atraso de tarea	Berrondo	12-Jul	29-Jul	14
Puentes	3	B096	99+277		Acabados finales en hormigon	Berrondo	26-Jul	6-Ago	10
Movimiento de Suelos	3	Realización de cuneta en desmonte	100+000	102+400	Atraso por lluvia y sus consecuencias	Florida	17-Jul	6-Ago	15
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C092 # 1BOCA 1,0x1,0	100+514		Colocación de Acero en Cabezales	Florida	19-Jul	21-Jul	3
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C092 # 1BOCA 1,0x1,0	100+514		Encofrado Solera de Cabezales	Florida	22-Jul	22-Jul	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C092 # 1BOCA 1,0x1,0	100+514		Hormigonado Solera de Cabezales	Florida	23-Jul	23-Jul	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C092 # 1BOCA 1,0x1,0	100+514		Encofrado Frontal de Cabezal y Aletas	Florida	26-Jul	27-Jul	2
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C092 # 1BOCA 1,0x1,0	100+514		Hormigonado Frontal de Cabezal	Florida	28-Jul	28-Jul	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C092 # 1BOCA 1,0x1,0	100+514		Desencofrado y Acabados	Florida	29-Jul	30-Jul	2
Movimiento de Suelos	3	Bloque tecnicos C094	101+621	101+621	Atraso por lluvia y sus consecuencias	Florida	2-Ago	7-Ago	5
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C094 2 Ø 800 mm	101+621		Colocación de Acero en Cabezales	Florida	13-Jul	15-Jul	3
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C094 2 Ø 800 mm	101+621		Encofrado Solera de Cabezales	Florida	16-Jul	16-Jul	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C094 2 Ø 800 mm	101+621		Hormigonado Solera de Cabezales	Florida	19-Jul	19-Jul	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C094 2 Ø 800 mm	101+621		Encofrado Frontal de Cabezal	Florida	20-Jul	21-Jul	2
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C094 2 Ø 800 mm	101+621		Hormigonado Frontal de Cabezal	Florida	22-Jul	22-Jul	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C094 2 Ø 800 mm	101+621		Desencofrado y Acabados	Florida	23-Jul	23-Jul	1
Movimiento de Suelos	3	Bloque tecnicos C095	101+800	101+800	Atraso por lluvia y sus consecuencias	Florida	2-Ago	7-Ago	5

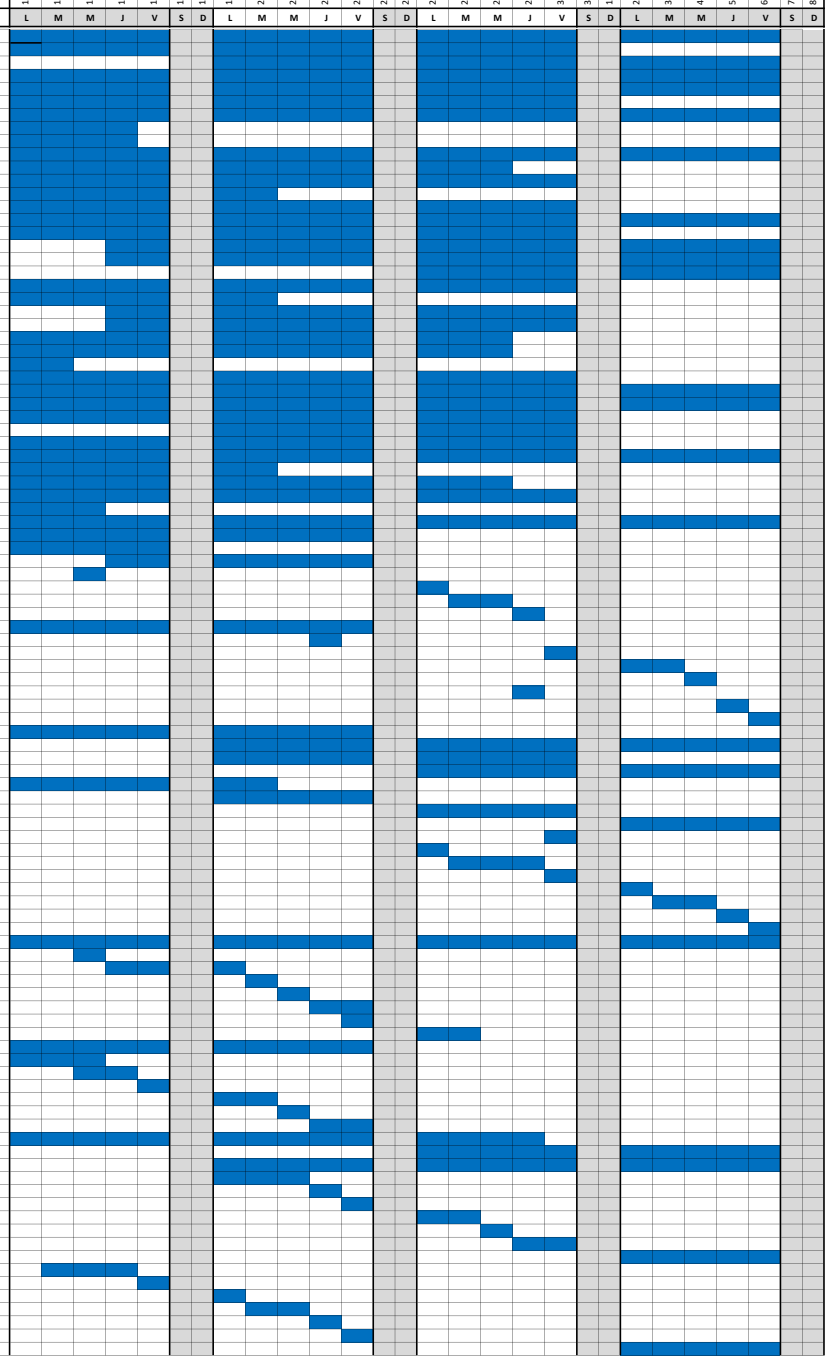

Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 28/2021

1	Montevideo-Progreso
2	Progreso-25 de Mayo
3	25 de Mayo-Sarandí Grande
4	Sarandí Grande-Durazno
5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C095 2 Ø 1000 mm	101+800		Desencofrado y Acabados	Florida	12-Jul	13-Jul	2
Puentes	3	B097	102+688		Acabados finales en hormigon	Florida	12-Jul	23-Jul	10
Movimiento de Suelos	3	Capa de Forma	103+450	101+200	Reprogramación por inico de cuneta revestida	Florida	26-Jul	7-Ago	10
Servicios Afectados	3	Agua Potable y Saneamiento	103+881	103+881	Insaco	Florida	7-Jul	14-Jul	3
Movimiento de Suelos	3	Cuneta Revestida	104+000	127+000	Atraso por lluvia y sus consecuencias	Florida	31-Jul	15-Ago	5
Movimiento de Suelos	3	Realización de cuneta en desmonte	104+500	104+100	Atraso por lluvia y sus consecuencias	Florida	12-Jul	17-Jul	5
Movimiento de Suelos	3	Cuneta Revestida	104+500	104+100	Atraso por lluvia y sus consecuencias	Florida	26-Jul	31-Jul	5
Movimiento de Suelos	3	Bloque tecnicos C096	104+528	104+528	Atraso por lluvia y sus consecuencias	Florida	26-Jul	31-Jul	5
Movimiento de Suelos	3	Capa de Forma	104+650	103+900	Reprogramación por inico de cuneta revestida	Florida	26-Jul	9-Ago	10
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	104+800	104+900	GRINOR	Florida	19-Jul	28-Jul	8
Movimiento de Suelos	3	Retiro de Tierra Vegetal	104+900	105+000	GRINOR	Florida	12-Jul	16-Jul	5
Movimiento de Suelos	3	Retiro de Tierra Vegetal	105+000	105+100	GRINOR	Florida	19-Jul	23-Jul	5
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	105+000	105+100	GRINOR	Florida	27-Jul	3-Ago	6
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C098-C910 # 1BOCA 1,50x1,50	105+343		Encofrado Frontal de Cabezal y Aletas	Florida	12-Jul	13-Jul	2
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C098-C910 # 1BOCA 1,50x1,50	105+343		Hormigonado Frontal de Cabezal	Florida	14-Jul	14-Jul	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C098-C910 # 1BOCA 1,50x1,50	105+343		Desencofrado y Acabados	Florida	15-Jul	16-Jul	2
Puentes	3	B100	105+980		Preparacion de Mesetas	Florida	12-Jul	16-Jul	5
Puentes	3	B100	105+980		Acabados finales en hormigon	Florida	12-Jul	23-Jul	10
Puentes	3	B100	105+980		Montaje de vigas	Florida	26-Jul	30-Jul	5
Puentes	3	B100	105+980		Armado de Losa y llenado	Florida	2-Ago	6-Ago	5
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	106+100	106+400	GRINOR	Florida	12-Jul	23-Jul	10
Servicios Afectados	3	Agua Potable y Saneamiento	106+145	106+145	Insaco	Florida	12-Jul	17-Jul	5
Trinchera de Usher- Calleros	3	Demoliciones	106+400	106+470		Florida	27-Jul	26-Ago	9
Trinchera de Usher- Calleros	3	Replanteo	106+400	106+470		Florida	12-Jul	28-set	20
Trinchera de Usher- Calleros	3	CIMENTALIA - Pilotaje	106+400	106+470		Florida	12-Jul	26-Ago	20
Trinchera de Usher- Calleros	3	Preparacion pista de acceso de la pilotera	106+400	106+470		Florida	12-Jul	26-Ago	20
Trinchera de Usher- Calleros	3	FERRALIA - Armadura de pilotes	106+400	106+470		Florida	12-Jul	26-Ago	20
Trinchera de Usher- Calleros	3	Descabezado de pilotes	106+400	106+470		Florida	12-Jul	26-Ago	20
Trinchera de Usher- Calleros	3	Encofrado y Armado de viga superior de atado	106+400	106+470		Florida	12-Jul	26-Ago	20
Trinchera de Usher- Calleros	3	Llenado viga superior de atado	106+400	106+470		Florida	12-Jul	26-Ago	20
Trinchera de Usher- Calleros	3	Encofrado puente B101	106+400	106+470		Florida	12-Jul	26-Ago	20
Demoliciones	3	Demoliciones	106+440	106+440	Casa Padrón 2962 (parcial)	Florida	26-Jul	30-Jul	5
Demoliciones	3	Demoliciones	106+440	106+440	Galpón Padrón 6881	Florida	2-Ago	9-Ago	5
Movimiento de Suelos	3	Bloque tecnicos C101	106+476	106+476	Atraso por lluvia y sus consecuencias	Florida	12-Jul	16-Jul	5
Movimiento de Suelos	3	preparacion de entrega	106+500	107+000	GRINOR	Florida	12-Jul	17-Jul	5
Movimiento de Suelos	3	Bloque tecnicos C102	106+771	106+771	Atraso por lluvia y sus consecuencias	Florida	19-Jul	24-Jul	5
Movimiento de Suelos	3	Bloque tecnicos C103	107+111	107+111	Atraso por lluvia y sus consecuencias	Florida	19-Jul	24-Jul	5
Servicios Afectados	3	Agua Potable y Saneamiento	108+870	108+870	Insaco	Florida	19-Jul	29-Jul	9
Movimiento de Suelos	3	PRESTAMO	109+000	109+050		Florida	12-Jul	31-Ago	20
Movimiento de Suelos	3	Colocacion de capa de forma	109+000	109+200	GRINOR	Florida	12-Jul	14-Jul	3
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	3	Instalación de Cerco de Ley	109+000	124+000	ENRIQUE RUIZ	Florida	12-Jul	31-Ago	20
Vías	3	Producción de durmientes	109+000		Planta de durmientes	Florida	12-Jul	6-Ago	20
Vías	3	Preparación de fijaciones	109+000		Planta de durmientes	Florida	12-Jul	6-Ago	20
Vías	3	Producción de soldaduras eléctricas	109+000		Planta de soldadura eléctrica	Florida	12-Jul	6-Ago	20
Vías	3	Carga, transporte y descarga de ADV's	109+000		Planta de soldadura eléctrica	Florida	26-Jul	6-Ago	10
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	109+234	109+234	Replanteo de alcantarillas	Florida	16-Jul	16-Jul	1
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	109+234	109+234	Cama de apoyo suelo cemento	Florida	20-Jul	20-Jul	1
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	109+234	109+234	Colocación de caño	Florida	21-Jul	22-Jul	2
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	109+234	109+234	Tapada de caños	Florida	23-Jul	23-Jul	1
Servicios Afectados	3	Eléctrica	109+285	109+285	BERKES	Florida	21-Jul	22-Jul	2
Servicios Afectados	3	Eléctrica	109+360	109+360	BERKES	Florida	21-Jul	22-Jul	2
Movimiento de Suelos	3	Colocacion de capa de forma	110+500	111+500	GRINOR	Florida	12-Jul	16-Jul	5
Movimiento de Suelos	3	Revestimiento de cunetas en hormigón	110+500	111+500		Florida	19-Jul	23-Jul	5
Movimiento de Suelos	3	Colocacion de capa de forma	111+500	112+000	GRINOR	Florida	16-Jul	23-Jul	6
Movimiento de Suelos	3	Revestimiento de cunetas en hormigón	111+500	112+000		Florida	23-Jul	30-Jul	6
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	111+555	111+555	Cama de apoyo suelo cemento	Florida	28-Jul	28-Jul	1
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	111+555	111+555	Colocación de caño	Florida	29-Jul	30-Jul	2
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	111+555	111+555	Tapada de caños	Florida	2-Ago	2-Ago	1
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	111+899	111+899	Cama de apoyo suelo cemento	Florida	12-Jul	16-Jul	5
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	111+899	111+899	Colocación de caño	Florida	19-Jul	20-Jul	2
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	111+899	111+899	Tapada de caños	Florida	21-Jul	21-Jul	1
Movimiento de Suelos	3	Colocacion de capa de forma	112+000	112+600	GRINOR	Florida	21-Jul	26-Jul	4
Movimiento de Suelos	3	Revestimiento de cunetas en hormigón	112+000	112+600		Florida	2-Ago	6-Ago	5
Movimiento de Suelos	3	Colocacion de capa de forma	112+600	113+200	GRINOR	Florida	26-Jul	29-Jul	4
Movimiento de Suelos	3	preparacion de entrega	113+200	113+700	GRINOR	Florida	12-Jul	15-Jul	4
Movimiento de Suelos	3	Revestimiento de taludes con tierra vegetal	113+200	114+000	GRINOR	Florida	12-Jul	19-Jul	6
Movimiento de Suelos	3	Colocacion de capa de forma	113+200	113+700	GRINOR	Florida	29-Jul	5-Ago	6
Movimiento de Suelos	3	preparacion de entrega	113+700	114+500	GRINOR	Florida	15-Jul	23-Jul	7
Movimiento de Suelos	3	Revestimiento de taludes con tierra vegetal	114+000	114+200	GRINOR	Florida	19-Jul	23-Jul	5
Movimiento de Suelos	3	Revestimiento de taludes con tierra vegetal	114+200	114+600	GRINOR	Florida	26-Jul	30-Jul	5
Movimiento de Suelos	3	Perforacion en roca para voladura	116+400	116+700	CODIWAY	Florida	12-Jul	30-Jul	15
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	116+400	116+420	CODIWAY	Florida	12-Jul	14-Jul	3
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	116+420	116+440	CODIWAY	Florida	12-Jul	16-Jul	5
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	116+420	116+460	CODIWAY	Florida	20-Jul	20-Jul	1
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	116+440	116+480	CODIWAY	Florida	12-Jul	18-Jul	5
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	116+460	116+480	CODIWAY	Florida	22-Jul	22-Jul	1
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras (a definir la semana 28)	116+480	116+500	CODIWAY	Florida	13-Jul	13-Jul	1
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	116+480	116+500	CODIWAY	Florida	27-Jul	27-Jul	1
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	116+500	116+540	CODIWAY	Florida	15-Jul	15-Jul	1
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	116+500	116+520	CODIWAY	Florida	29-Jul	29-Jul	1
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	116+520	116+550	CODIWAY	Florida	3-Ago	3-Ago	1
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	120+850	121+450	CCFC	Florida	12-Jul	6-Ago	20
Servicios Afectados	3	Telecomunicaciones	121+949	121+949	Oriteceno	Florida	20-Abr	20-Jul	7
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras (a definir la semana 28)	123+400	123+450	CODIWAY	Florida	13-Jul	13-Jul	1
Movimiento de Suelos	3	Subrasante	124+000	124+450		Florida	12-Jul	12-Jul	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C122 - Marco 0,8x0,8	125+291		Terminaciones	La Cruz	12-Jul	6-Ago	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C124 - Marco 2 bocas 1x1	126+361		Muros y losa superior	La Cruz	12-Jul	6-Ago	20
Servicios Afectados	3	Telecomunicaciones	126+393	126+393	Oriteceno	La Cruz	21-Jun	20-Jul	7
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C125 - Marco 2 bocas 0,8x0,8	126+792		Armado Marco	La Cruz	12-Jul	6-Ago	20
Movimiento de Suelos	3	Formación de Terraplén	128+300	128+500		E/La Cruz y Pintado	12-Jul	30-Jul	15
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C126 - Tubo Ø 1200 mm	128+304		Terminaciones	E/La Cruz y Pintado	12-Jul	6-Ago	20
Movimiento de Suelos	3	Retiro Vegetal	128+500	128+800		E/La Cruz y Pintado	12-Jul	30-Jul	15
Movimiento de Suelos	3	Desmonte	128+500	128+800		E/La Cruz y Pintado	12-Jul	30-Jul	15
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C127 - Tubo Ø 800 mm	128+980		Cabezales	E/La Cruz y Pintado	12-Jul	6-Ago	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C129 - Tubo Ø 1000 mm	130+974		Colocación tubo	E/La Cruz y Pintado	12-Jul	6-Ago	20
Movimiento de Suelos	3	Retiro material prestamo	131+800			E/La Cruz y Pintado	12-Jul	30-Jul	15
Puentes	3	B106 - Puente Vial	131+904		Movimiento de Tierras	E/La Cruz y Pintado	12-Jul	6-Ago	20
Movimiento de Suelos	3	Desmonte	140+000	141+000		E/Pintado y Sarandí Grande	12-Jul	30-Jul	15
Movimiento de Suelos	3	Retiro material prestamo	140+000			E/Pintado y Sarandí Grande	12-Jul	30-Jul	15
Movimiento de Suelos	3	Formación de Terraplén	143+000	143+300		E/Pintado y Sarandí Grande	12-Jul	30-Jul	15
Movimiento de Suelos	3	Destape prestamo	143+000			E/Pintado y Sarandí Grande	12-Jul	30-Jul	15



Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 28/2021

1	Montevideo-Progreso
2	Progreso-25 de Mayo
3	25 de Mayo-Sarandí Grande
4	Sarandí Grande-Durazno
5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración	SEMANA 28							SEMANA 29							SEMANA 30							SEMANA 31						
										12/7/2021	13/7/2021	14/7/2021	15/7/2021	16/7/2021	17/7/2021	18/7/2021	19/7/2021	20/7/2021	21/7/2021	22/7/2021	23/7/2021	24/7/2021	25/7/2021	26/7/2021	27/7/2021	28/7/2021	29/7/2021	30/7/2021	31/7/2021	1/8/2021	2/8/2021	3/8/2021	4/8/2021	5/8/2021	6/8/2021	7/8/2021	8/8/2021
										L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Movimiento de Suelos	3	Desmonte / Terraplén	147+000	148+000		E/Pintado y Sarandí Grande	12-Jul	30-Jul	15																												
Movimiento de Suelos	4	Rectificación de Caminos paralelos	157+100	194+000	Conformación de Cunetas provisionales	E/Sarandí y Maciel	12-Jul	30-Jul	15																												
Puentes	4	B109 - Puente Ferroviario	158+484		Acondicionamiento para montaje de vigas	E/Sarandí y Maciel	12-Jul	6-Ago	20																												
Movimiento de Suelos	4	Preparacion Fondo Excavación	159+600	160+000	Subcontrato Grinor	E/Sarandí y Maciel	12-Jul	26-Jul	11																												
Movimiento de Suelos	4	Formación de Terraplén	160+000	161+500	Subcontrato Grinor	E/Sarandí y Maciel	19-Jul	1-Ago	10																												
Paso de Fauna	4	B930 - Marco 3x2	165+110		Impermeabilización (Subcontrato Gofinal)	Variante Puntas de Maciel	12-Jul	20-Jul	7																												
Movimiento de Suelos	4	Formación de Terraplén	165+300	165+400	Subcontrato Grinor	Variante Puntas de Maciel	12-Jul	19-Jul	6																												
Movimiento de Suelos	4	Formación de Terraplén	166+500	168+000	Subcontrato Grinor	E/Maciel y Goñi	27-Jul	9-Ago	9																												
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	4	C168 - Tubo Ø 800 mm	166+741		Solera cabezales	E/Maciel y Goñi	12-Jul	6-Ago	20																												
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	4	C170 - Tubo Ø 800 mm	167+479		Frontines	E/Maciel y Goñi	12-Jul	6-Ago	20																												
Movimiento de Suelos	4	Formación de Terraplén	168+000	169+800	Subcontrato Grinor	E/Maciel y Goñi	12-Jul	18-Jul	5																												
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	4	C171 - Tubo Ø 800 mm	168+080		Frontines	E/Maciel y Goñi	12-Jul	6-Ago	20																												
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	4	C172 - Tubo Ø 1200 mm	168+736		Frontines	E/Maciel y Goñi	12-Jul	6-Ago	20																												
Movimiento de Suelos	4	Formación de Terraplén	169+800	170+000	Subcontrato Grinor	E/Maciel y Goñi	12-Jul	24-Jul	10																												
Movimiento de Suelos	4	Formación de Terraplén	170+000	175+000	Subcontrato Diaz Álvarez	E/Maciel y Goñi	18-Jul	31-Jul	10																												
Servicios Afectados	4	Telecomunicaciones	170+190	170+190	Oritecno	E/Maciel y Goñi	20-Jun	20-Jul	7																												
Paso de Fauna	4	B113 - Marco 2x2	170+240		Muros (Subcontrato Gofinal)	E/Maciel y Goñi	12-Jul	30-Jul	15																												
Movimiento de Suelos	4	Retiro material prestamo	171+000			E/Maciel y Goñi	12-Jul	30-Jul	15																												
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	4	C178 - Tubo Ø 1000 mm	175+454		Cabezales	E/Maciel y Goñi	12-Jul	6-Ago	20																												
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	4	C179 - Marco 1x1	176+230		Solera	E/Maciel y Goñi	12-Jul	6-Ago	20																												
Movimiento de Suelos	4	Retiro material prestamo	177+000			Goñi	12-Jul	30-Jul	15																												
Balasto y Sub-balasto de Vía	4	Acopio de Balasto / Subbalasto	177+000			Goñi	12-Jul	30-Jul	15																												
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	177+664	177+664	Insaco	Goñi	19-Jul	29-Jul	9																												
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	4	C186 - Marco 2 bocas 1x1	181+352		Paredes	Durazno	12-Jul	6-Ago	20																												
Puentes	4	B178 - Puente Ferroviario	185+032		Dinteles Estribos y pilas lado norte	Durazno	12-Jul	6-Ago	20																												
Paso de Fauna	4	B915 - Marco 6x4	185+751		Aletas (Subcontrato Gofinal)	Durazno	12-Jul	30-Jul	15																												
Movimiento de Suelos	4	Retiro material prestamo	187+200			Durazno	12-Jul	30-Jul	15																												
Movimiento de Suelos	4	Retiro material prestamo	189+000			Durazno	12-Jul	30-Jul	15																												
Servicios Afectados	4	Telecomunicaciones	192+408	192+408	Oritecno	Durazno	0-Ene	20-Jul	7																												
Obradores	4	Obrador Durazno	192+500		Carga, descarga y transporte de materiales	Durazno	12-Jul	30-Jul	15																												
Servicios Afectados	4	Eléctrica	194+530	194+530	BERKES	Durazno	29-Jul	30-Jul	2																												
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	195+505	195+505	Insaco	Durazno	26-Jul	5-Ago	9																												
Servicios Afectados	4	Eléctrica	195+578	195+578	BERKES	Durazno	14-Jul	15-Jul	2																												
Servicios Afectados	4	Telecomunicaciones	195+650	195+650	Oritecno	Durazno	30-Jun	20-Jul	7																												
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	195+845	195+845	Insaco	Durazno	26-Jul	5-Ago	9																												
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	195+870	195+870	Insaco	Durazno	2-Ago	19-Ago	5																												
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	195+872	195+872	Insaco	Durazno	2-Ago	12-Ago	5																												
Servicios Afectados	4	Telecomunicaciones	196+913	196+913	Oritecno	Durazno	15-Jul	20-Jul	4																												
Servicios Afectados	4	Eléctrica	196+932	196+932	BERKES	Durazno	20-May	27-Jul	12																												
Servicios Afectados	4	Alumbrado y TV Cable	196+940	196+940	SARLUX	Durazno	20-Jul	25-Jul	4																												
Servicios Afectados	4	Alumbrado y TV Cable	196+941	196+941	SARLUX	Durazno	20-Jul	25-Jul	4																												
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	196+967	196+967	Insaco	Durazno	19-Jul	8-Ago	15																												
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	196+975	196+975	Insaco	Durazno	24-Jul	13-Ago	10																												
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	196+991	196+991	Insaco	Durazno	19-Jul	2-set	15																												
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	196+993	196+993	Insaco	Durazno	19-Jul	2-set	15																												
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	197+275	197+275	Insaco	Durazno	21-Jul	31-Jul	8																												
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	197+956	197+956	Insaco	Durazno	19-Jul	29-Jul	9																												
Servicios Afectados	4	Eléctrica	197+959	197+959	BERKES	Durazno	14-Jul	15-Jul	2																												
Servicios Afectados	4	Eléctrica	198+245	196+932	BERKES	Durazno	28-Jun	19-Jul	6																												
Movimiento de Suelos	5	Formación de Pedraplén	198+400	198+700		Durazno	12-Jul	30-Jul	15																												
Movimiento de Suelos	5	Retiro Vegetal	199+200	199+300		Durazno	12-Jul	30-Jul	15																												
Movimiento de Suelos	5	Corte de Talud	200+370	204+000	SubCtto EMSA	Durazno	12-Jul	6-Ago	20	1	1	1	1	1		5	1	1	1	1	1		5	1	1	1	1	1		5	1	1	1	1	1		
Movimiento de Suelos	5	Desmonte / Terraplén	202+800	204+000	SubCtto EMSA	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	12-Jul	6-Ago	20																												
Movimiento de Suelos	5	Destape/Excavación de préstamo/Tapado	204+000		SubCtto EMSA	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	12-Jul	6-Ago	20																												
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	B126 - Alcantarilla 1,5 x 1,5	207+943		Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	19-Jul	6-Ago	15																												
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C1501 - Alcantarilla 1,5 x 1,5	209+443		Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	19-Jul	6-Ago	15																												
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C229 - Alcantarilla 0,8 x 0,8	217+361		Excavación/Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	12-Jul	6-Ago	20																												
Movimiento de Suelos	5	Desmonte / Terraplén	219+000	224+000	SubCtto EMSA	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	12-Jul	6-Ago	20																												
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	B137 - Alcantarilla 1,5 x 1,5	221+195		Cabezales	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	19-Jul	6-Ago	15																												
Balasto y Sub-balasto de Vía	5	Acopio de Balasto / Subbalasto	221+200			E/Sta. Bernardina y C. Reyles	12-Jul	6-Ago	20																												
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	B138 - Alcantarilla 1,5 x 1,5	221+590		Cabezales	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	12-Jul	6-Ago	20																												
Movimiento de Suelos	5	Destape/Excavación de préstamo/Tapado	222+500		SubCtto EMSA	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	12-Jul	6-Ago	20																												
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	B140 - Marco 6 x 2	223+040		Construcción (SubCtto Gofinal)	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	12-Jul	6-Ago	20																												
Servicios Afectados	5	Telecomunicaciones	225+585	225+585	Cietel	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	29-Jun	12-Jul	1																												
Servicios Afectados	5	Telecomunicaciones	228+270	228+270	Cietel	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	12-Jul	21-Jul	8																												
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C238 - ODT Ø 1200 mm	228+343		Cabezales	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	12-Jul	23-Jul	10																												
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C240 - Alcantarilla 1,5 x 1,5	229+308		Cabezales	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	12-Jul	30-Jul	15																												
Movimiento de Suelos	5	Capa de Forma	230+000	231+000		E/Sta. Bernardina y C. Reyles	12-Jul	6-Ago	20																												
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C244 - ODT Ø 1200 mm	231+548		Bloque técnico	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	12-Jul	6-Ago	20																												
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C245 - Alcantarilla 1 x 1	232+048		Cabezales	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	12-Jul	6-Ago	20																												
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C246 - ODT Ø 1200 mm	232+648		Bloque técnico	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	12-Jul	6-Ago	20																												
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C247 - Alcantarilla 1 x 1	233+247		Cabezales	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	19-Jul	6-Ago	15																												
Movimiento de Suelos	5	Destape/Excavación de préstamo/Tapado	233+800			E/Sta. Bernardina y C. Reyles	12-Jul	6-Ago	20																												
Balasto y Sub-balasto de Vía	5	Acopio de Balasto / Subbalasto	234+000			E/Sta. Bernardina y C. Reyles	12-Jul	6-Ago	20																												
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C248 - Alcantarilla 1,5 x 1,5	234+947		Cabezales	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	19-Jul	6-Ago	15																												
Servicios Afectados	5	Eléctrica	236+177	236+177	BERKES	Carlos Reyles	19-Jul	20-Jul	2																												
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C252 - Alcantarilla 1 x 1	236+467		Construcción	Carlos Reyles	12-Jul	6-Ago	20																												
Servicios Afectados	5	Telecomunicaciones	236+893	236+893	Cietel	Carlos Reyles	21-Jul	21-Jul	1																												
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C255 - Alcantarilla 0,8 x 0,8	237+085		Construcción	Carlos Reyles	19-Jul	6-Ago	15																												
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C1556 - Alcantarilla 0,8 x 0,8	237+510		Construcción	Carlos Reyles	26-Jul	6-Ago	10																												
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C256 - Alcantarilla 1 x 1	237+849		Construcción	Carlos Reyles	26-Jul	6-Ago	10																												
Movimiento de Suelos	5	Corte de Talud / Recubrimiento con TV	238+000	245+000		Carlos Reyles	12-Jul	6-Ago	20																												
Puentes	5	B147 - Vigas prefabricadas de 12m	239+353		Construcción	E/C. Reyles y Centenario	12-Jul	6-Ago	20																												
Servicios Afectados	5	Telecomunicaciones	239+353	239+353	Cietel	E/C. Reyles y Centenario	22-Jul	27-Jul	4																												
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C257 - Alcantarilla 1 x 1	239+971		Construcción	E/C. Reyles y Centenario	2-Ago	6-Ago	5																												
Servicios Afectados	5	Telecomunicaciones	239+984	239+984	Cietel	E/C. Reyles y Centenario	28-Jul	30-Jul	3																												
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C258 - Alcantarilla 1,5 x 1,5	241+146		Construcción	E/C. Reyles y Centenario	2-Ago	6-Ago	5																												
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C259 - Alcantarilla 1 x 1	241+977		Cabezales	E/C. Reyles y Centenario	12-Jul	6-Ago	20																												
Movimiento de Suelos	5	Destape/Excavación de préstamo/Tapado	242+400			E/C. Reyles y Centenario	12-Jul	6-Ago	20																												
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C260 - Alcantarilla 0,8 x 0,8	242+448		Cabezales	E/C. Reyles y Centenario	12-Jul	6-Ago	20																												
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C262 - Alcantarilla 0,8 x 0,8	242+900		Cabezales	E/C. Reyles y Centenario	12-Jul	6-Ago	20																												
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C263 - Alcantarilla 0,8 x 0,8	243+071		Cabezales	E/C. Reyles y Centenario	12-Jul	6-Ago	20																												
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C264 - Alcantarilla 0,8 x 0,8	243+216		Cabezales	E/C. Reyles y Centenario	12-Jul	6-Ago	20																												
Puentes	5	B148 - Vigas prefabricadas de 18m	243+731		Excavación/Construcción	E/C. Reyles y Centenario	12-Jul	6-Ago																													
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	B1560 - Alcantarilla 1,5 x 1,5	243+862		Cabezales	E/C. Reyles y Centenario	12-Jul	23-Jul	10																												
Movimiento de Suelos	5	Capa de Forma	244+000	245+000		E/C. Reyles y Centenario	12-Jul	6-Ago	20																												
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	B150 - Alcantarilla 1,5 x 1,5	244+925		Cabezales	E/C. Reyles y Centenario	12-Jul	6-Ago	20																												
Movimiento de Suelos	5	Destape/Excavación de préstamo/Tapado	247+200			E/C. Reyles y Centenario	12-Jul	6-Ago	20																												
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C267 - Alcantarilla 1 x 1	247+446		Construcción	E/C. Reyles y Centenario	12-Jul	6-Ago	20																												
Movimiento de Suelos	5	Destape/Excavación de préstamo/Tapado	248+300			E/C. Reyles y Centenario	12-Jul	6-Ago	20																												
Balasto y Sub-balasto de Vía	5	Acopio de Balasto / Subbalasto	249+500			E/C. Reyles y Centenario	12-Jul	6-Ago	20																												

Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 28/2021

1	Montevideo-Progreso
2	Progreso-25 de Mayo
3	25 de Mayo-Sarandí Grande
4	Sarandí Grande-Durazno
5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración
Movimiento de Suelos	5	Desmonte / Terraplén	253+000	254+000		E/C. Reyles y Centenario	12-Jul	6-Ago	20
Puentes	5	B155 - Vigas prefabricadas de 18m	254+437		Excavación/Construcción	E/C. Reyles y Centenario	12-Jul	6-Ago	20
Puentes	5	B156 - Vigas prefabricadas de 12m	254+672		Construcción	E/C. Reyles y Centenario	12-Jul	6-Ago	20
Puentes	5	B157 - Vigas prefabricadas de 9m	254+833		Construcción	E/C. Reyles y Centenario	12-Jul	6-Ago	20
Movimiento de Suelos	5	Desmonte / Terraplén	255+800		Eje 220	Desvío UPM 2	12-Jul	6-Ago	20
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	5	Instalación de Cerco de Ley	255+800			Desvío UPM 2	12-Jul	6-Ago	20
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	3	Replanteo cerco de Ley					12-Jul	6-Ago	20
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	3	Instalación de Cerco de Ley					12-Jul	6-Ago	20
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	4	Replanteo cerco de Ley					12-Jul	30-Jul	15
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	4	Instalación de Cerco de Ley					12-Jul	30-Jul	15
Balasto y Sub-balasto de Vía	4	Acopio de Balasto / Subbalasto Obrador Bracco					12-Jul	30-Jul	15
Reposición de Caminos	4	Mantenimiento de accesos y caminos			Todo el tramo		12-Jul	30-Jul	15

SEMANA 28							SEMANA 29							SEMANA 30							SEMANA 31						
12/7/2021	13/7/2021	14/7/2021	15/7/2021	16/7/2021	17/7/2021	18/7/2021	19/7/2021	20/7/2021	21/7/2021	22/7/2021	23/7/2021	24/7/2021	25/7/2021	26/7/2021	27/7/2021	28/7/2021	29/7/2021	30/7/2021	31/7/2021	1/8/2021	2/8/2021	3/8/2021	4/8/2021	5/8/2021	6/8/2021	7/8/2021	8/8/2021
L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
