Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 32/2021

1	Montevideo-Progreso
2	Progreso-25 de Mayo
3	25 de Mayo-Sarandí Grande
4	Sarandí Grande-Durazno
5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración
Movimiento de Suelos	1	Terraplén	26+550	26+900	Relleno Frente 1	Progreso	9-Ago	20-Ago	10
Movimiento de Suelos	1	Terraplén	23+000	23+300	Relleno Frente 1	Las Piedras	23-Ago	3-set	10
Movimiento de Suelos	1	Terraplén	26+100	26+500	Relleno Frente 2	Progreso	9-Ago	27-Ago	15
Movimiento de Suelos	1	Terraplén	25+300	25+690	Relleno Frente 3	Progreso	9-Ago	3-set	20
Movimiento de Suelos	1	Desmonte	23+000	23+300	Excavación Frente 1	Las Piedras	9-Ago	13-Ago	5
Movimiento de Suelos	1	Desmonte	24+200	25+000	Excavación Frente 1	Progreso	16-Ago	3-set	15
Movimiento de Suelos	1	Desmonte	24+200	25+000	Excavación Frente 2	Progreso	9-Ago	3-set	20
Movimiento de Suelos	1	Terraplén	24+000	25+000	Relleno Frente	Progreso	16-Ago	27-Ago	10
Movimiento de Suelos	1	Desmonte	7+000	9+000	Excavación Frente 2, en traza y bifurcación Peñarol	Montevideo	9-Ago	3-set	20
Movimiento de Suelos	1	Terraplén Ramal Peñarol Eje 360	8+130		Relleno (Sub Contr- Grinor) Eje 360: 0+590 - 1+100	Montevideo	9-Ago	20-Ago	10
Movimiento de Suelos	1	B039- Cuña Transición	20+700		Frente Cuña de transición	Las Piedras	9-Ago	10-Ago	2
Movimiento de Suelos	1	B043- Cuña Transición	23+120		Frente Cuña de transición	Las Piedras	11-Ago	1-set	16
Movimiento de Suelos	1	Prestamo	21+600		Prestamo para Relleno	Las Piedras	9-Ago	3-set	20
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	30+000	31+400		E/Progreso y Juanicó	9-Ago	3-set	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	34+000	36+500		Juanicó	9-Ago	27-Ago	15
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	47+500	50+200	Macromáquinas	Canelones	9-Ago	3-set	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	47+500	50+200	Macromáquinas	Canelones	9-Ago	3-set	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	51+000	51+500	Macromáquinas	Canelones	9-Ago	27-Ago	15
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	52+000	53+000	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	9-Ago	27-Ago	15
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	55+500	57+000	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	9-Ago	3-set	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	57+800	59+755	Macromáquinas	Variante Santa Lucía	9-Ago	3-set	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	51+300	51+700	Macromáquinas	Canelones	9-Ago	3-set	20
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	57+936	58+227		Variante Santa Lucía	9-Ago	27-Ago	15
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	57+936	58+227		Variante Santa Lucía	9-Ago	27-Ago	15
Movimiento de Suelos	2	Préstamo	62+700			25 de Agosto	9-Ago	28-Oct	20
Movimiento de Suelos	2	Préstamo	76+000			Cardal (Incluye Variantes)	9-Ago	28-Oct	20
Movimiento de Suelos	2	Préstamo	87+500			25 de Mayo	9-Ago	28-Oct	20
Movimiento de Suelos	2	PR 24	66+000	64+000	RUTA 77	25 de Agosto	9-Ago	30-set	20
Movimiento de Suelos	2	B939- Excavacion	66+400	66+400	Paso de Gandao	25 de Agosto	9-Ago	30-Ago	16
Movimiento de Suelos	2	PR 30-31-32	80+000	77+000	Camino apartadero	Cardal (Incluye Variantes)	9-Ago	30-set	20
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	78+000	69+000		Cardal (Incluye Variantes)	9-Ago	28-set	20
Movimiento de Suelos	2	Retiro Capa Vegetal	78+000	69+000		Cardal (Incluye Variantes)	9-Ago	20-Ago	10
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	78+000	76+000		Cardal (Incluye Variantes)	9-Ago	31-Ago	17
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	64+000	62+000		25 de Agosto	9-Ago	31-Ago	17
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	82+500	82+000	Terraplén zona Inundable	25 de Mayo	9-Ago	20-Ago	10
Movimiento de Suelos	2	Terraplén/Desmonte	81+500	79+000		25 de Mayo	9-Ago	31-Ago	17
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	98+300	98+700	Retraso de inicio de la actividad por falta de desalojo de personas .	Berrondo	16-Ago	27-Ago	10
Movimiento de Suelos	3	PR 35. Terraplenado y desvio	98+000	99+000		Berrondo	9-Ago	21-Ago	10
Movimiento de Suelos	3	PR 35.Colocación Capa CBR 40	98+000	99+000		Berrondo	23-Ago	27-Ago	5
Movimiento de Suelos	3	PR 35.Colocación Capa CBR 60	98+000	99+000		Berrondo	30-Ago	10-set	5
Movimiento de Suelos	3	Bloque tecnicos C91	100+080	100+080		Florida	23-Ago	27-Ago	5
Movimiento de Suelos	3	Bloque tecnicos B97	102+688	102+688	Adelanto de tarea	Florida	9-Ago	10-Ago	2
Movimiento de Suelos	3	Bloque tecnicos B96	99+277	99+277	Retraso en el inicio de tarea.	Berrondo	16-Ago	27-Ago	10
Movimiento de Suelos	3	Bloque tecnicos B98	103+522	103+522	Retraso en el inicio de tarea.	Florida	16-Ago	31-Ago	12
Movimiento de Suelos	3	Bloque tecnicos C910	105+343	105+343	Reprogramación de tarea	Florida	9-Ago	17-Ago	7
Movimiento de Suelos	3	Bloque tecnicos C98	105+343	105+343	Reprogramación de tarea	Florida	9-Ago	17-Ago	7
Movimiento de Suelos	3	Bloque tecnicos B95	98+845	98+845		Berrondo	9-Ago	20-Ago	10
Movimiento de Suelos	3	Bloque tecnicos C92	100+514	100+514		Florida	17-Ago	20-Ago	4
Movimiento de Suelos	3	Bloque tecnicos B90	93+876	93+876	Adelanto de tarea	25 de Mayo	9-Ago	17-Ago	7
Movimiento de Suelos	3	Bloque tecnicos B88	90+350	90+350		25 de Mayo	23-Ago	3-set	10
Movimiento de Suelos	3	Bloque tecnicos B928	92+291	92+291		25 de Mayo	23-Ago	3-set	10
Movimiento de Suelos	3	Bloque tecnicos C90	98+970	98+970		Berrondo	16-Ago	20-Ago	5
Movimiento de Suelos	3	Bloque tecnicos C89	98+448	98+448		Berrondo	30-Ago	3-set	5
Movimiento de Suelos	3	Realización de cuneta en desmonte	100+000	102+400		Florida	9-Ago	13-Ago	5
Movimiento de Suelos	3	Cuneta Revestida	104+500	104+100	agroiberica	Florida	9-Ago	15-Ago	5
Movimiento de Suelos	3	Cuneta Revestida	102+400	101+200	agroiberica	Florida	15-Ago	25-Ago	8
Movimiento de Suelos	3	Capa de Forma	104+650	103+900		Florida	9-Ago	16-Ago	6
Movimiento de Suelos	3	Capa de Forma	103+450	101+200		Florida	9-Ago	23-Ago	11
Movimiento de Suelos	3	PR 33.aprobación de fondo	89+000	90+000		25 de Mayo	16-Ago	20-Ago	5
Movimiento de Suelos	3	PR 33. Terraplenado y desvio	89+000	90+000		25 de Mayo	23-Ago	15-set	10
Movimiento de Suelos	3	PR 33. Terraplenado y desvio	98+000	99+000		Berrondo	9-Ago	21-Ago	10
Movimiento de Suelos	3	Capa de Forma	90+500	91+200		25 de Mayo	30-Ago	3-set	5
Movimiento de Suelos	3	PRESTAMO	109+000	109+050		Florida	9-Ago	20-Dic	20
Movimiento de Suelos	3	Retiro de Tierra Vegetal	104+900	105+000	GRINOR	Florida	9-Ago	17-Ago	7
Movimiento de Suelos	3	Retiro de Tierra Vegetal	105+000	105+100	GRINOR	Florida	9-Ago	13-Ago	5
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	104+800	104+900	GRINOR	Florida	9-Ago	16-Ago	6
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	105+000	105+100	GRINOR	Florida	16-Ago	20-Ago	5
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	105+700	105+950	GRINOR	Florida	19-Ago	27-Ago	7
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	122+000	123+000	GRINOR	Florida	9-Ago	27-Ago	15
Movimiento de Suelos	3	preparacion de entrega	106+500	107+000	GRINOR	Florida	9-Ago	11-Ago	3
Movimiento de Suelos	3	preparacion de entrega	113+700	114+500	GRINOR	Florida	9-Ago	10-Ago	2
Movimiento de Suelos	3	preparacion de entrega	114+500	114+900	GRINOR	Florida	12-Ago	20-Ago	7
Movimiento de Suelos	3	preparacion de entrega	115+600	116+000	GRINOR	Florida	16-Ago	20-Ago	5
Movimiento de Suelos	3	preparacion de entrega	116+700	117+300	GRINOR	Florida	9-Ago	11-Ago	3
Movimiento de Suelos	3	preparacion de entrega	122+000	122+400	GRINOR	Florida	30-Ago	3-set	5
Movimiento de Suelos	3	Terraplén/Desmonte	120+850	121+800	CCFC	Florida	9-Ago	18-Ago	8
Movimiento de Suelos	3	Colocacion de capa de forma	107+400	107+900	GRINOR	Florida	11-Ago	20-Ago	8
Movimiento de Suelos	3	Colocacion de capa de forma	113+200	113+700	GRINOR	Florida	16-Ago	20-Ago	5
Movimiento de Suelos	3	Colocacion de capa de forma	106+400	107+000	GRINOR	Florida	23-Ago	31-Ago	7
Movimiento de Suelos	3	Cuneta Revestida	109+200	109+400	agroiberica	Florida	9-Ago	12-Ago	4
Movimiento de Suelos	3	Cuneta Revestida	110+050	110+500	agroiberica	Florida	11-Ago	18-Ago	6
Movimiento de Suelos	3	Cuneta Revestida	110+500	111+500	agroiberica	Florida	18-Ago	24-Ago	5
Movimiento de Suelos	3	Cuneta Revestida	111+500	111+800	agroiberica	Florida	26-Ago	3-set	7
Movimiento de Suelos	3	Cuneta Revestida	112+000	112+500	agroiberica	Florida	2-set	11-set	2
Movimiento de Suelos	3	Perforacion en roca para voladura	116+400	116+700	CODIWAY	Florida	9-Ago	18-Ago	8
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	116+500	116+520	CODIWAY	Florida	19-Ago	19-Ago	1
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	116+520	116+550	CODIWAY	Florida	12-Ago	12-Ago	1
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	116+550	116+570	CODIWAY	Florida	10-Ago	10-Ago	1
Movimiento de Suelos	3	Detonacion de voladuras	123+400	123+450	CODIWAY	Florida	26-Ago	26-Ago	1
Movimiento de Suelos	3	Subrasante	124+000	124+450		Florida	9-Ago	3-set	20
Movimiento de Suelos	3	Desmonte	127+800	128+300		E/La Cruz y Pintado	9-Ago	3-set	20
Movimiento de Suelos	3	Formación de Terraplén	128+300	128+500		E/La Cruz y Pintado	9-Ago	3-set	20
Movimiento de Suelos	3	Subrasante	128+500	128+800		E/La Cruz y Pintado	9-Ago	3-set	20
Movimiento de Suelos	3	Subrasante	140+000	141+000		E/Pintado y Sarandí Grande	9-Ago	3-set	20
Movimiento de Suelos	3	Formación de Terraplén	143+000	143+300		E/Pintado y Sarandí Grande	9-Ago	3-set	20
Movimiento de Suelos	3	Desmonte / Terraplén	145+000	148+000		E/Pintado y Sarandí Grande	9-Ago	3-set	20
Movimiento de Suelos	3	Camino PR 47	146+176	146+888	Replanteo - Limpieza	E/Pintado y Sarandí Grande	11-Ago	3-set	18
Movimiento de Suelos	3	Retiro material prestamo	131+800			E/La Cruz y Pintado	9-Ago	3-set	20
Movimiento de Suelos	3	Retiro material prestamo	140+000			E/Pintado y Sarandí Grande	9-Ago	3-set	20
Movimiento de Suelos	3	Destape prestamo	143+000			E/Pintado y Sarandí Grande	9-Ago	3-set	20



Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 32/2021

1	Montevideo-Progreso
2	Progreso-25 de Mayo
3	25 de Mayo-Sarandí Grande
4	Sarandí Grande-Durazno
5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración
Movimiento de Suelos	4	Subrasante	157+100	157+200	Subcontrato Grinor	E/Sarandi y Maciel	9-Ago	20-Ago	10
Movimiento de Suelos	4	Subrasante	159+600	159+900	Subcontrato Grinor	E/Sarandi y Maciel	9-Ago	13-Ago	5
Movimiento de Suelos	4	Formación de Terraplén	168+700	169+000	Subcontrato Grinor	E/Maciel y Goñi	9-Ago	13-Ago	5
Movimiento de Suelos	4	Desmonte	170+700	170+900	Subcontrato Diaz Álvarez	E/Maciel y Goñi	9-Ago	3-set	20
Movimiento de Suelos	4	Formación de Terraplén	170+900	175+000	Subcontrato Diaz Álvarez	E/Maciel y Goñi	9-Ago	3-set	20
Movimiento de Suelos	4	Retiro material prestamo	171+000			E/Maciel y Goñi	9-Ago	3-set	20
Movimiento de Suelos	4	Retiro material prestamo	177+000			Goñi	9-Ago	3-set	20
Movimiento de Suelos	4	Retiro material prestamo	187+200			Durazno	9-Ago	3-set	20
Movimiento de Suelos	4	Retiro material prestamo	189+000			Durazno	9-Ago	3-set	20
Movimiento de Suelos	4	Rectificación de Caminos paralelos			Conformación de Cunetas provisionales		9-Ago	3-set	20
Movimiento de Suelos	5	Formación de Pedraplén	198+300	198+400		Durazno	9-Ago	3-set	20
Movimiento de Suelos	5	Retiro Vegetal	199+200	199+300		Durazno	9-Ago	3-set	20
Movimiento de Suelos	5	Capa de Forma	201+000	201+600	SubCtto EMSA	Santa Bernardina	9-Ago	3-set	20
Movimiento de Suelos	5	Desmonte / Terraplén	203+000	204+000	SubCtto EMSA	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	9-Ago	3-set	20
Movimiento de Suelos	5	Destape/Excavación de préstamo/Tapado	204+000		SubCtto EMSA	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	9-Ago	3-set	20
Movimiento de Suelos	5	Corte de Talud	203+000	204+000	SubCtto EMSA	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	9-Ago	3-set	20
Movimiento de Suelos	5	Desmonte / Terraplén	222+000	224+000	SubCtto EMSA	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	9-Ago	3-set	20
Movimiento de Suelos	5	Destape/Excavación de préstamo/Tapado	222+500		SubCtto EMSA	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	9-Ago	3-set	20
Movimiento de Suelos	5	Capa de Forma	230+000	231+000		E/Sta. Bernardina y C. Reyles	9-Ago	3-set	20
Movimiento de Suelos	5	Destape/Excavación de préstamo/Tapado	233+800			E/Sta. Bernardina y C. Reyles	9-Ago	3-set	20
Movimiento de Suelos	5	Corte de Talud / Recubrimiento con TV	244+000	246+000		E/C. Reyles y Centenario	9-Ago	3-set	20
Movimiento de Suelos	5	Capa de Forma	244+000	245+000		E/C. Reyles y Centenario	23-Ago	3-set	10
Movimiento de Suelos	5	Destape/Excavación de préstamo/Tapado	242+400			E/C. Reyles y Centenario	9-Ago	3-set	20
Movimiento de Suelos	5	Destape/Excavación de préstamo/Tapado	247+200			E/C. Reyles y Centenario	9-Ago	3-set	20
Movimiento de Suelos	5	Destape/Excavación de préstamo/Tapado	248+300			E/C. Reyles y Centenario	9-Ago	3-set	20
Movimiento de Suelos	5	Desmonte / Terraplén	256+000		Eje 50 y 220	Desvio UPM 2	9-Ago	3-set	20

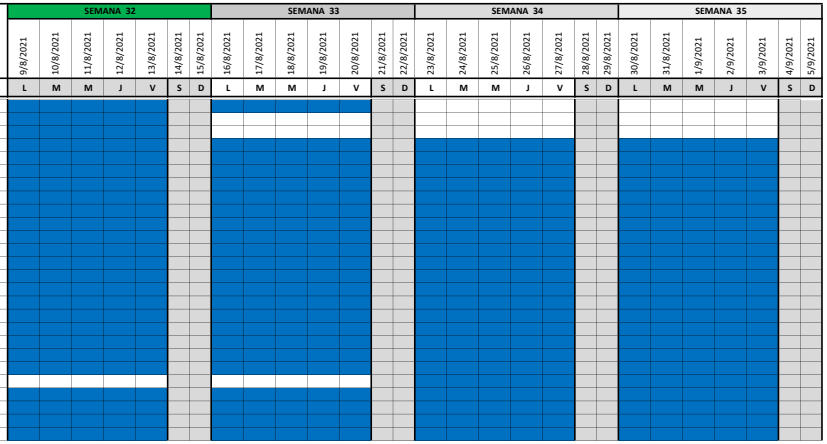

Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 32/2021

1	Montevideo-Progreso
2	Progreso-25 de Mayo
3	25 de Mayo-Sarandí Grande
4	Sarandí Grande-Durazno
5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	3	Instalación de Cerco de Ley	109+000	124+000	ENRIQUE RUIZ	Florida	9-Ago	20-Dic	20
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	3	Replanteo cerco de Ley					9-Ago	3-set	20
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	3	Instalación de Cerco de Ley					9-Ago	3-set	20
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	4	Replanteo cerco de Ley					9-Ago	3-set	20
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	4	Instalación de Cerco de Ley					9-Ago	3-set	20
Cerco Olímpico y Cerco de Ley	5	Instalación de Cerco de Ley	255+800			Desvío UPM 2	9-Ago	3-set	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	1	B047 - Marco rectangular 4x5 Florencio Sanchez	24+090		Construcción- (Sub Contr- Ventus) - Aletas y losa superior	Progreso	9-Ago	13-Ago	5
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	2	C030 - 3 Diam.1000	31+768			E/Progreso y Juanicó	9-Ago	3-set	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	2	B077 - Marco 2 - 6x4	57+875			Variante Santa Lucía	9-Ago	25-Ago	13
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	2	B083 - Marco 3 - 3x3	81+380			Cardal (Incluye Variantes)	9-Ago	3-set	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	2	B085 - Marco 3 - 3x3	85+088			25 de Mayo	9-Ago	3-set	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C091 # 2BOCA 1,0x1,0	100+080		Desencofrado y Acabados	Florida	9-Ago	10-Ago	2
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C084 1 Ø 1000 mm	94+447		Colocación de Acero en Cabezales	25 de Mayo	9-Ago	11-Ago	3
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C084 1 Ø 1000 mm	94+447		Encofrado de Solera cabezales	25 de Mayo	12-Ago	12-Ago	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C084 1 Ø 1000 mm	94+447		Hormigonado Solera de Cabezales	25 de Mayo	13-Ago	13-Ago	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C084 1 Ø 1000 mm	94+447		Encofrado Frontal de Cabezal	25 de Mayo	16-Ago	17-Ago	2
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C084 1 Ø 1000 mm	94+447		Desencofrado y Acabados	25 de Mayo	18-Ago	19-Ago	2
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C087 1 Ø 800 mm	96+760		Desencofrado y Acabados	Berrondo	9-Ago	10-Ago	2
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	B94 3 Ø 1200 mm	98+183		Colocación de Acero en Cabezales	Berrondo	9-Ago	11-Ago	3
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	B94 3 Ø 1200 mm	98+183		Encofrado de Solera cabezales	Berrondo	12-Ago	13-Ago	2
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	B94 3 Ø 1200 mm	98+183		Hormigonado Solera de Cabezales	Berrondo	16-Ago	16-Ago	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	B94 3 Ø 1200 mm	98+183		Encofrado Frontal de Cabezal	Berrondo	17-Ago	18-Ago	2
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	B94 3 Ø 1200 mm	98+183		Hormigonado Frontal de Cabezal	Berrondo	19-Ago	19-Ago	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	B94 3 Ø 1200 mm	98+183		Desencofrado y Acabados	Berrondo	20-Ago	23-Ago	2
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C085 3 Ø 800 mm	96+161		Colocación de Acero en Cabezales	25 de Mayo	9-Ago	11-Ago	3
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C085 3 Ø 800 mm	96+161		Encofrado de Solera cabezales	25 de Mayo	12-Ago	13-Ago	2
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C085 3 Ø 800 mm	96+161		Hormigonado Solera de Cabezales	25 de Mayo	16-Ago	16-Ago	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C085 3 Ø 800 mm	96+161		Encofrado Frontal de Cabezal	25 de Mayo	17-Ago	18-Ago	2
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C085 3 Ø 800 mm	96+161		Hormigonado Frontal de Cabezal	25 de Mayo	19-Ago	19-Ago	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C085 3 Ø 800 mm	96+161		Desencofrado y Acabados	25 de Mayo	20-Ago	23-Ago	2
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C088 # 3BOCA 0,80x0,80m	97+697		Colocación de Acero en Cabezales	Berrondo	11-Ago	16-Ago	4
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C088 # 3BOCA 0,80x0,80m	97+697		Encofrado de Solera cabezales	Berrondo	17-Ago	17-Ago	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C088 # 3BOCA 0,80x0,80m	97+697		Hormigonado Solera de Cabezales	Berrondo	18-Ago	18-Ago	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C088 # 3BOCA 0,80x0,80m	97+697		Encofrado Frontal de Cabezal y Aletas	Berrondo	19-Ago	20-Ago	2
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C088 # 3BOCA 0,80x0,80m	97+697		Hormigonado Frontal de Cabezal y Aletas	Berrondo	23-Ago	23-Ago	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C088 # 3BOCA 0,80x0,80m	97+697		Desencofrado y Acabados	Berrondo	24-Ago	26-Ago	3
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C930 2 Ø 1000 mm	93+348		Encofrado p/hormigón de limpieza Cabezal IZQ	25 de Mayo	20-Ago	20-Ago	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C930 2 Ø 1000 mm	93+348		Hormigonado de limpieza en Cabezal IZQ	25 de Mayo	23-Ago	23-Ago	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C930 2 Ø 1000 mm	93+348		Colocación de Aletas en Cabezal IZQ	25 de Mayo	24-Ago	24-Ago	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C930 2 Ø 1000 mm	93+348		Colocación de Acero en Cabezales	25 de Mayo	24-Ago	26-Ago	3
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C930 2 Ø 1000 mm	93+348		Encofrado de Solera cabezales	25 de Mayo	27-Ago	27-Ago	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C930 2 Ø 1000 mm	93+348		Hormigonado Solera de Cabezales	25 de Mayo	30-Ago	30-Ago	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C930 2 Ø 1000 mm	93+348		Encofrado Frontal de Cabezal	25 de Mayo	31-Ago	1-set	2
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C930 2 Ø 1000 mm	93+348		Hormigonado Frontal de Cabezal	25 de Mayo	2-set	2-set	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C930 2 Ø 1000 mm	93+348		Desencofrado y Acabados	25 de Mayo	3-set	3-set	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C081 2 Ø 800 mm	93+003		Colocación de Acero en Cabezales	25 de Mayo	24-Ago	26-Ago	3
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C081 2 Ø 800 mm	93+003		Encofrado de Solera cabezales	25 de Mayo	27-Ago	27-Ago	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C081 2 Ø 800 mm	93+003		Hormigonado Solera de Cabezales	25 de Mayo	30-Ago	30-Ago	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C081 2 Ø 800 mm	93+003		Encofrado Frontal de Cabezal	25 de Mayo	31-Ago	1-set	2
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C081 2 Ø 800 mm	93+003		Hormigonado Frontal de Cabezal	25 de Mayo	2-set	2-set	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C081 2 Ø 800 mm	93+003		Desencofrado y Acabados	25 de Mayo	3-set	3-set	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C079 3 Ø 1200 mm	92+077		Colocación de Acero en Cabezales	25 de Mayo	24-Ago	26-Ago	3
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C079 3 Ø 1200 mm	92+077		Encofrado de Solera cabezales	25 de Mayo	27-Ago	27-Ago	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C079 3 Ø 1200 mm	92+077		Hormigonado Solera de Cabezales	25 de Mayo	30-Ago	30-Ago	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C079 3 Ø 1200 mm	92+077		Encofrado Frontal de Cabezal	25 de Mayo	31-Ago	1-set	2
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C079 3 Ø 1200 mm	92+077		Hormigonado Frontal de Cabezal	25 de Mayo	2-set	2-set	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C079 3 Ø 1200 mm	92+077		Desencofrado y Acabados	25 de Mayo	3-set	3-set	1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C124 - Marco 2 bocas 1x1	126+361		Terminaciones	La Cruz	9-Ago	3-set	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C125 - Marco 2 bocas 0,8x0,8	126+792		Encofrado muros y techo	La Cruz	9-Ago	3-set	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C127 - Tubo Ø 800 mm	128+980		Terminaciones	E/La Cruz y Pintado	9-Ago	3-set	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C128 - Tubo 3 bocas Ø 800 mm	129+392		Encofrado muros y techo	E/La Cruz y Pintado	9-Ago	3-set	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C130 - Tubo 2 bocas Ø 1200 mm	131+413		Cabezales	E/La Cruz y Pintado	9-Ago	3-set	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C132 - Tubo Ø 1200 mm	132+308		Posicionamiento de aletas	E/La Cruz y Pintado	9-Ago	3-set	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C133 - Tubo Ø 800 mm	135+654		Hormigón de limpieza	E/La Cruz y Pintado	9-Ago	3-set	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C904 - Tubo Ø 800 mm	136+356		Posicionamiento de aletas	E/La Cruz y Pintado	9-Ago	3-set	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C134 - Tubo Ø 800 mm	137+225		Posicionamiento de aletas	E/La Cruz y Pintado	9-Ago	3-set	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	3	C138 - Tubo 2 bocas Ø 1200 mm	142+001		Posicionamiento de aletas	E/Pintado y Sarandí Grande	9-Ago	3-set	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	4	B108 - 2-Marco 1,5x1,5	156+715		Cabezal lado este	E/Sarandí y Maciel	9-Ago	3-set	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	4	C159 - Tubo Ø 1200 mm	157+116		Cabezales	E/Sarandí y Maciel	9-Ago	3-set	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	4	C178 - Tubo Ø 1000 mm	175+454		Cabezales	E/Maciel y Goñi	9-Ago	3-set	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	4	C179 - Marco 1x1	176+230		Cabezales	E/Maciel y Goñi	9-Ago	3-set	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	4	C180 - Tubo Ø 1200 mm	176+646		Colocación de tubo	E/Maciel y Goñi	9-Ago	3-set	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	4	C181 - Tubo Ø 1200 mm	176+908		Cabezales	E/Maciel y Goñi	9-Ago	3-set	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	B1517 - Alcantarilla 1,0 x 1,0	207+584		Cabezales	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	9-Ago	3-set	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	B126 - Alcantarilla 1,5 x 1,5	207+943		Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	9-Ago	3-set	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C1500 - Alcantarilla 1,5 x 1,5	208+634		Cabezales	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	9-Ago	27-Ago	15
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C229 - Alcantarilla 0,8 x 0,8	217+361		Excavación/Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	9-Ago	3-set	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C232 - ODT Ø 1200 mm	222+218		Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	9-Ago	3-set	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C244 - ODT Ø 1200 mm	231+548		Bloque técnico	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	9-Ago	3-set	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C246 - ODT Ø 1200 mm	232+648		Bloque técnico	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	9-Ago	3-set	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C256 - Alcantarilla 1,0 x 1,0	237+510		Construcción	Carlos Reyles	9-Ago	3-set	20
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C257 - Alcantarilla 1 x 1	239+971		Cabezales	E/C. Reyles y Centenario	9-Ago	27-Ago	15
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C260 - Alcantarilla 0,8 x 0,8	242+448		Cabezales	E/C. Reyles y Centenario	2-Ago	27-Ago	15
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C267 - Alcantarilla 1 x 1	247+446		Construcción	E/C. Reyles y Centenario	2-Ago	27-Ago	15
ODT´s/Alcantarillas/Marcos	5	C288 - Marco 4 x 2	258+000		Excavación/Construcción	Centenario-Paso de los Toros	2-Ago	3-set	20

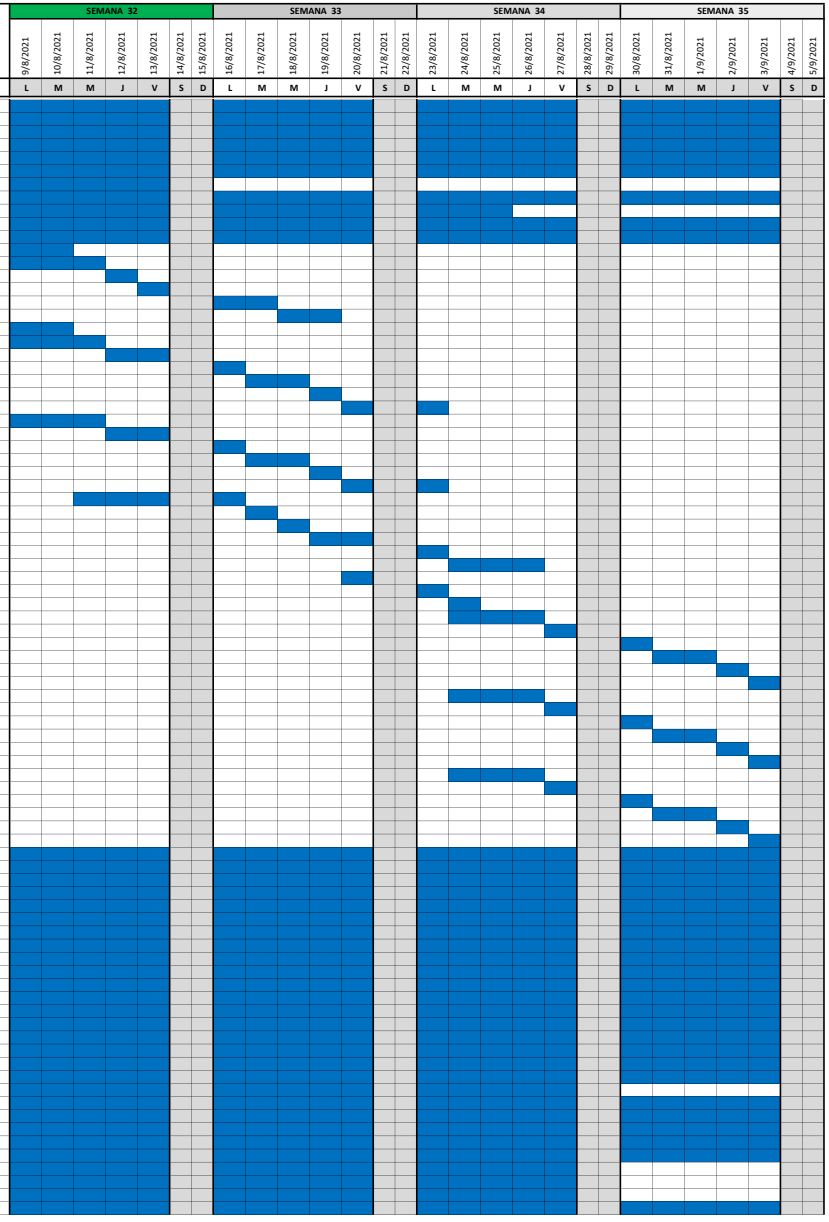

Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 32/2021

1	Montevideo-Progreso
2	Progreso-25 de Mayo
3	25 de Mayo-Sarandí Grande
4	Sarandí Grande-Durazno
5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	103+881	103+881	Cama de apoyo suelo cemento	Florida	9-Ago	11-Ago	3
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	103+881	103+881	Colocación de caño	Florida	11-Ago	12-Ago	2
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	103+881	103+881	Tapada de caños	Florida	13-Ago	13-Ago	1
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	109+234	109+234	Cama de apoyo suelo cemento	Florida	9-Ago	10-Ago	2
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	109+234	109+234	Colocación de caño	Florida	11-Ago	12-Ago	2
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	109+234	109+234	Tapada de caños	Florida	13-Ago	13-Ago	1
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	111+555	111+555	Cama de apoyo suelo cemento	Florida	16-Ago	17-Ago	2
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	111+555	111+555	Colocación de caño	Florida	18-Ago	19-Ago	2
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	111+555	111+555	Tapada de caños	Florida	20-Ago	20-Ago	1
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	113+740	113+740	Replanteo	Florida	11-Ago	11-Ago	1
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	113+740	113+740	Cama de apoyo suelo cemento	Florida	16-Ago	17-Ago	2
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	113+740	113+740	Colocación de caño	Florida	18-Ago	19-Ago	2
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	113+740	113+740	Tapada de caños	Florida	20-Ago	20-Ago	1
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	116+118	116+118	Replanteo	Florida	11-Ago	11-Ago	1
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	116+118	116+118	Cama de apoyo suelo cemento	Florida	23-Ago	24-Ago	2
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	116+118	116+118	Colocación de caño	Florida	25-Ago	26-Ago	2
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	116+118	116+118	Tapada de caños	Florida	27-Ago	27-Ago	1
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	122+957	122+957	Replanteo	Florida	11-Ago	11-Ago	1
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	122+957	122+957	Cama de apoyo suelo cemento	Florida	23-Ago	24-Ago	2
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	122+957	122+957	Colocación de caño	Florida	25-Ago	26-Ago	2
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	122+957	122+957	Tapada de caños	Florida	27-Ago	27-Ago	1
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	124+777	124+777	Replanteo	Florida	11-Ago	11-Ago	1
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	124+777	124+777	Cama de apoyo suelo cemento	Florida	30-Ago	31-Ago	2
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	124+777	124+777	Colocación de caño	Florida	1-set	2-set	2
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	124+777	124+777	Tapada de caños	Florida	3-set	3-set	1
Drenajes Longitudinales	3	Ejecucion Drenajes Longitudinales	106+400	106+470		Florida	9-Ago	26-Ago	14
Paso de Fauna	3	B944 - Marco 4x3	128+290		Hormigón de limpieza	E/La Cruz y Pintado	9-Ago	3-set	20
Paso de Fauna	4	B930 - Marco 3x2	165+110		Impermeabilización (Subcontrato Gofinal)	Variante Puntas de Maciel	9-Ago	3-set	20
Paso de Fauna	4	B113 - Marco 2x2	170+240		Cabezales (Sibcontrato Gofinal)	E/Maciel y Goñi	9-Ago	3-set	20
Paso de Fauna	4	B945 - Marco 3x2	170+270		Hormigón de limpieza (Subcontrato Gofinal)	E/Maciel y Goñi	9-Ago	3-set	20
Paso de Fauna	4	B915 - Marco 6x4	185+751		Aletas (Subcontrato Gofinal)	Durazno	9-Ago	3-set	20
Puentes	1	B045-Puente ferroviario - 2 Vías 15 m - VIAF -	23+574		Construcción Puente B045 - Acceso y Montaje de vigas prefabricadas	Las Piedras	16-Ago	27-Ago	10
Puentes	2	B54	34+551		Estructura	Juanicó	9-Ago	17-Ago	7
Puentes	2	B55	36+637		Montaje vigas prefabricadas, prelosas y armado de tableros.	Juanicó	9-Ago	13-Ago	5
Puentes	2	B63	48+222		Montaje vigas prefabricadas, prelosas y armado de tableros.	Canelones	23-Ago	3-set	10
Puentes	2	B64	48+975		Estructura	Canelones	9-Ago	27-Ago	15
Puentes	2	B65	49+890		Estructura	Canelones	9-Ago	20-Ago	10
Puentes	2	B67	50+696		Montaje vigas prefabricadas, prelosas y armado de tableros.	Canelones	9-Ago	13-Ago	5
Puentes	2	B69	51+854		Estructura	Variante Santa Lucía	9-Ago	1-set	18
Puentes	2	B939- Pasa Ganado	66+861		Estructura	Variante Independencia	9-Ago	27-Ago	15
Puentes	2	B179	68+265		Montaje vigas prefabricadas, prelosas y armado de tableros.	Variante Independencia	9-Ago	20-Ago	10
Puentes	2	B84	82+426		Montaje vigas prefabricadas, prelosas y armado de tableros.	25 de Mayo	12-Ago	27-Ago	12
Puentes	3	B092	95+213		Armado y llenado de muros	25 de Mayo	9-Ago	17-Ago	7
Puentes	3	B092	95+213		Armado y llenado de losa	25 de Mayo	16-Ago	26-Ago	9
Puentes	3	B092	95+213		Impermeabilizacion	25 de Mayo	25-Ago	3-set	8
Puentes	3	B091	94+944		Armado y llenado de muros	25 de Mayo	9-Ago	20-Ago	10
Puentes	3	B091	94+944		Armado y llenado de losa	25 de Mayo	19-Ago	27-Ago	7
Puentes	3	B091	95+213		Impermeabilizacion	25 de Mayo	25-Ago	3-set	8
Puentes	3	B093	95+515		Montaje de vigas	25 de Mayo	9-Ago	11-Ago	3
Puentes	3	B093	95+515		Armado de Losa y llenado	25 de Mayo	12-Ago	20-Ago	7
Puentes	3	B093	95+515		Acabados finales en hormigon	25 de Mayo	16-Ago	20-Ago	5
Puentes	3	B093	95+515		Impermeabilizacion	25 de Mayo	16-Ago	20-Ago	5
Puentes	3	B947	96+800		Armado y llenado de muros	Berrondo	9-Ago	13-Ago	5
Puentes	3	B947	96+800		Armado y llenado de losa	Berrondo	16-Ago	20-Ago	5
Puentes	3	B947	96+800		Armado y llenado de aletas	Berrondo	11-Ago	20-Ago	8
Puentes	3	B947	96+800		Impermeabilizacion	Berrondo	23-Ago	27-Ago	5
Puentes	3	B096	99+277		Acabados finales en hormigon	Berrondo	9-Ago	13-Ago	5
Puentes	3	B100	105+980		Montaje de vigas	Florida	9-Ago	11-Ago	3
Puentes	3	B100	105+980		Armado de Losa y llenado	Florida	12-Ago	20-Ago	7
Puentes	3	B106 - Puente Vial	131+904		Movimiento de Tierras - Excavaciones en zapatas	E/La Cruz y Pintado	9-Ago	3-set	20
Puentes	4	B109 - Puente Ferroviario	158+484		Acondicionamiento para montaje de vigas	E/Sarandí y Maciel	13-Ago	3-set	16
Puentes	4	B178 - Puente Ferroviario	185+032		Acondicionamiento para montaje de vigas	Durazno	9-Ago	3-set	20
Puentes	5	B121 - Refuerzo Metálico	202+842		Desmontaje	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	16-Ago	3-set	15
Puentes	5	B134 - Refuerzo Metálico	219+643		Desmontaje	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	16-Ago	3-set	15
Puentes	5	B142 - Vigas prefabricadas de 12m	224+630		Excavación/Construcción	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	16-Ago	3-set	15
Puentes	5	B147 - Vigas prefabricadas de 12m	239+353		Construcción	E/C. Reyles y Centenario	9-Ago	3-set	20
Puentes	5	B148 - Vigas prefabricadas de 18m	243+731		Construcción	E/C. Reyles y Centenario	9-Ago	3-set	20
Puentes	5	B155 - Vigas prefabricadas de 18m	254+437		Excavación/Construcción	E/C. Reyles y Centenario	9-Ago	3-set	20
Puentes	5	B156 - Vigas prefabricadas de 12m	254+672		Construcción	E/C. Reyles y Centenario	9-Ago	3-set	20
Puentes	5	B157 - Vigas prefabricadas de 9m	254+833		Construcción	E/C. Reyles y Centenario	16-Ago	3-set	15



Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 32/2021

1	Montevideo-Progreso
2	Progreso-25 de Mayo
3	25 de Mayo-Sarandí Grande
4	Sarandí Grande-Durazno
5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración
Demoliciones	1	Demolición/Muro	3+678	3+678	Padrón 56651 (muro nuevo)	Trinchera Capurro	9-Ago	20-Ago	10
Demoliciones	1	Demolición/Muro	3+857	3+857	Padrón 56695 (muro nuevo)	Trinchera Capurro	19-Jul	13-Ago	5
Demoliciones	1	Demolición/Muro	3+934	3+934	Padrón 118902 (muro nuevo bajo + reja)	Trinchera Capurro	22-Jul	13-Ago	5
Demoliciones	1	Demolición/Muro	5+800	5+800	Padrón 41736	Montevideo	16-Ago	17-Ago	2
Demoliciones	1	Demolición/Muro	6+985	6+985	Padrón 51210 (muro nuevo)	Montevideo	23-Ago	23-Ago	1
Demoliciones	1	Demolición/Muro	12+385	12+385	Padrón 44689 (La Casona)	Montevideo	18-Ago	18-Ago	1
Demoliciones	1	Demolición/Muro	12+385	12+385	Padrón 44689 (Menck)	Montevideo	19-Ago	20-Ago	2
Demoliciones	1	Demolición/Muro	20+000	20+000	Padrón 79 (demolición muro + nuevo muro)	Trinchera Las Piedras	19-Jul	13-Ago	5
Demoliciones	1	Demolición/Muro	20+016	20+016	Padrón 5752 (demolición muro + nuevo muro)	Trinchera Las Piedras	26-Jul	26-Ago	14
Demoliciones	1	Demolición/Muro	25+725	25+725	Padrón 4840 (demolición muros + nuevo muro)	Progreso	26-Jul	26-set	20
Demoliciones	3	Demoliciones	106+440	106+440	Casa Padrón 2962 (parcial)	Florida	17-Ago	20-Ago	4
Demoliciones	3	Demoliciones	106+440	106+440	Galpón Padrón 6881	Florida	9-Ago	16-Ago	6
Servicios Afectados	1	Frente Cateos	+726	30+000	RR - OSE/IMM	Montevideo	22-Jun	27-Ago	15
Servicios Afectados	1	Frente Cateos	+726	3+000	ES - UTE	Montevideo	22-Jun	27-Ago	15
Servicios Afectados	1	Frente Cateos	+726	40+000	MC - OSE/ANTEL/ANTENA	Montevideo	22-Jun	27-Ago	15
Servicios Afectados	1	Gas	9+250	9+250	Ciemsa	Montevideo	27-Ago	7-set	6
Servicios Afectados	1	Gas	9+311	9+311	Ciemsa	Montevideo	12-Ago	19-Ago	6
Servicios Afectados	1	Gas	14+804	14+804	Ciemsa	La Paz	20-Ago	26-Ago	5
Servicios Afectados	1	Gas	3+003	3+003	Gofinal	Montevideo	10-Ago	16-Ago	5
Servicios Afectados	1	Gas	3+625	3+625	Gofinal	Trinchera Capurro	9-Ago	20-Ago	10
Servicios Afectados	1	Gas	7+447	7+447	Gofinal	Montevideo	2-Ago	13-Ago	5
Servicios Afectados	1	Gas	7+448	7+448	Gofinal	Montevideo	2-Ago	13-Ago	5
Servicios Afectados	1	Gas	9+279	9+279	Gofinal	Montevideo	16-Ago	20-Ago	5
Servicios Afectados	1	Gas	10+166	10+166	Gofinal	Montevideo	16-Ago	22-Ago	5
Servicios Afectados	1	Gas	19+955	19+955	Gofinal	Trinchera Las Piedras	2-Ago	13-Ago	5
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	3+878	3+878	Saceem	Trinchera Capurro	20-Jul	15-Ago	5
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	13+100	13+100	Saceem	Montevideo	8-Abr	27-Ago	15
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	13+199	13+199	Saceem	Montevideo	8-Abr	27-Ago	15
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	15+997	15+997	Electrosistemas	La Paz	21-Jul	10-Ago	2
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	19+550	19+550	Electrosistemas	Trinchera Las Piedras	9-Ago	10-set	20
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	19+548	19+548	Electrosistemas	Trinchera Las Piedras	9-Ago	10-set	20
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	22+863	22+863	Electrosistemas	Las Piedras	26-Abr	11-Ago	3
Servicios Afectados	3	Telecomunicaciones	126+393	126+393	Oritecno	La Cruz	21-Jun	13-Ago	5
Servicios Afectados	4	Telecomunicaciones	170+190	170+190	Oritecno	E/Maciel y Goñi	20-Jun	13-Ago	5
Servicios Afectados	4	Telecomunicaciones	196+913	196+913	Oritecno	Durazno	15-Jul	13-Ago	5
Servicios Afectados	5	Telecomunicaciones	243+107	243+107	Cietel	E/C. Reyles y Centenario	9-Ago	13-Ago	5
Servicios Afectados	5	Telecomunicaciones	243+731	243+731	Cietel	E/C. Reyles y Centenario	16-Ago	20-Ago	5
Servicios Afectados	5	Telecomunicaciones	244+985	244+985	Cietel	E/C. Reyles y Centenario	19-Ago	27-Ago	7
Servicios Afectados	5	Telecomunicaciones	249+896	249+896	Cietel	E/C. Reyles y Centenario	28-Ago	3-set	5
Servicios Afectados	5	Telecomunicaciones	252+600	252+600	Cietel	E/C. Reyles y Centenario	23-Ago	27-Ago	5
Servicios Afectados	5	Telecomunicaciones	253+382	253+382	Cietel	E/C. Reyles y Centenario	13-Ago	20-Ago	6
Servicios Afectados	5	Telecomunicaciones	254+437	254+437	Cietel	E/C. Reyles y Centenario	9-Ago	12-Ago	4
Servicios Afectados	3	Agua Potable y Saneamiento	108+870	108+870	Insaco	Florida	19-Ago	29-Ago	7
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	177+664	177+664	Insaco	Goñi	16-Ago	26-Ago	9
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	195+505	195+505	Insaco	Durazno	16-Ago	26-Ago	9
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	195+845	195+845	Insaco	Durazno	18-Ago	28-Ago	8
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	195+870	195+870	Insaco	Durazno	25-Ago	11-set	8
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	195+872	195+872	Insaco	Durazno	25-Ago	4-set	8
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	196+967	196+967	Insaco	Durazno	15-Ago	4-set	15
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	196+975	196+975	Insaco	Durazno	20-Ago	9-set	11
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	196+991	196+991	Insaco	Durazno	15-Ago	29-set	15
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	196+993	196+993	Insaco	Durazno	15-Ago	29-set	15
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	197+275	197+275	Insaco	Durazno	17-Ago	27-Ago	9
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	197+956	197+956	Insaco	Durazno	20-Ago	30-Ago	7
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	3+001	3+001	Saceem	Montevideo	15-Jul	19-Ago	9
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	3+004	3+004	Saceem	Montevideo	9-Ago	19-Ago	9
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	3+005	3+005	Saceem	Montevideo	9-Ago	19-Ago	9
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	3+950	3+950	Saceem	Trinchera Capurro	25-Jul	21-Ene	20
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	4+310	4+310	Saceem	Montevideo	24-Ago	4-set	9
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	6+985	6+985	Saceem	Montevideo	28-Ago	10-set	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	19+097	19+097	Saceem	Trinchera Las Piedras	13-Ago	23-Ago	7
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	19+237	19+237	Saceem	Trinchera Las Piedras	25-Jun	12-Ago	4
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	19+240	19+240	Saceem	Trinchera Las Piedras	5-Jul	13-Ago	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	19+241	19+241	Saceem	Trinchera Las Piedras	5-Jul	13-Ago	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	19+300	19+300	Saceem	Trinchera Las Piedras	18-Jun	13-Ago	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	1+145	1+145	Ciemsa	Montevideo	15-Ago	20-Ago	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	1+245	1+245	Ciemsa	Montevideo	15-Ago	20-Ago	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	1+354	1+354	Ciemsa	Montevideo	19-Ago	22-Ago	2
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	1+355	1+355	Ciemsa	Montevideo	19-Ago	22-Ago	2
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	15+683	15+683	Ciemsa	La Paz	22-Ago	29-Ago	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	21+940	21+940	Insaco	Las Piedras	22-Ago	3-set	10
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	+735	+735	Insaco	Montevideo	22-Ago	1-set	8
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	1+133	1+133	Insaco	Montevideo	16-Ago	23-Ago	6
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	2+884	2+884	Insaco	Montevideo	16-Ago	23-Ago	6
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	4+663	4+663	Insaco	Montevideo	27-Ago	8-set	6
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	4+781	4+781	Insaco	Montevideo	18-Ago	30-Ago	9
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	4+787	4+787	Insaco	Montevideo	18-Ago	30-Ago	9
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	4+897	4+897	Insaco	Montevideo	6-Ago	18-Ago	8
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	6+119	6+119	Insaco	Montevideo	28-Jul	20-Ago	10
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	6+458	6+458	Insaco	Montevideo	4-Ago	28-set	20
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	7+463	7+463	Insaco	Montevideo	16-Ago	26-Ago	9
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	14+794	14+794	Insaco	La Paz	23-Ago	29-Ago	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	22+941	22+941	Insaco	Las Piedras	23-Ago	2-Oct	10
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	20+194	20+194	Ventus	Trinchera Las Piedras	25-Ene	2-Oct	20
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	44+988	44+988	Gofinal	Canelones	16-Ago	23-Ago	6
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+200	42+200	Gofinal	Canelones	23-Ago	10-set	10
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+222	42+222	Gofinal	Canelones	26-Ago	12-set	7
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+223	42+223	Gofinal	Canelones	26-Ago	12-set	7
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+226	42+226	Gofinal	Canelones	29-Ago	8-set	5
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+232	42+232	Gofinal	Canelones	20-Ago	8-set	11
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+247	42+247	Gofinal	Canelones	25-Ago	4-set	8
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+263	42+263	Gofinal	Canelones	19-Ago	29-Ago	7
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+263	42+264	Gofinal	Canelones	19-Ago	29-Ago	7
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	43+242	43+242	Gofinal	Canelones	29-Ago	4-set	5
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	44+230	44+230	Gofinal	Canelones	25-Ago	14-Oct	8
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	13+203	13+203	Gofinal	La Paz	24-May	22-Ago	10
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	15+701	15+701	Gofinal	La Paz	23-Ago	9-set	10
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	2+223	2+223	Gofinal	Montevideo	15-Ago	2-set	14
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	10+125	10+125	Gofinal	Montevideo	26-Jul	15-Ago	5
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	10+626	10+626	Gofinal	Montevideo	15-Ago	25-Ago	8

Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 32/2021

1	Montevideo-Progreso
2	Progreso-25 de Mayo
3	25 de Mayo-Sarandí Grande
4	Sarandí Grande-Durazno
5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+726	+726	SARLUX	Montevideo	31-May	20-Ago	10
Servicios Afectados	1	Eléctrica	+942	+942	SARLUX	Montevideo	31-May	20-Ago	10
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+120	1+120	SARLUX	Montevideo	31-May	20-Ago	10
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+219	1+219	SARLUX	Montevideo	31-May	20-Ago	10
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+229	1+229	SARLUX	Montevideo	12-May	18-Ago	8
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+323	1+323	SARLUX	Montevideo	29-Ene	30-Ago	16
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+420	1+420	SARLUX	Montevideo	20-May	20-Ago	10
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+427	1+427	SARLUX	Montevideo	31-May	27-Ago	15
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+428	1+428	SARLUX	Montevideo	20-May	20-Ago	10
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+429	1+429	SARLUX	Montevideo	19-Abr	18-Ago	8
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+433	1+433	SARLUX	Montevideo	12-Abr	18-Ago	8
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+448	1+448	SARLUX	Montevideo	20-May	20-Ago	10
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+491	1+491	SARLUX	Montevideo	13-Abr	18-Ago	8
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+540	1+540	SARLUX	Montevideo	20-May	24-Ago	12
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+615	1+615	SARLUX	Montevideo	20-May	20-Ago	10
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+621	1+621	SARLUX	Montevideo	25-Ago	24-set	8
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+652	1+652	SARLUX	Montevideo	14-Abr	20-Ago	10
Servicios Afectados	1	Eléctrica	1+860	1+860	SARLUX	Montevideo	6-May	18-Ago	8
Servicios Afectados	1	Eléctrica	2+003	2+003	SARLUX	Montevideo	10-May	18-Ago	8
Servicios Afectados	1	Eléctrica	2+320	2+320	SARLUX	Montevideo	10-May	18-Ago	8
Servicios Afectados	1	Eléctrica	2+340	2+340	SACEEM	Montevideo	28-Abr	30-Ago	16
Servicios Afectados	1	Eléctrica	3+621	3+621	SACEEM	Trinchera Capurro	21-Ago	15-set	10
Servicios Afectados	1	Eléctrica	3+879	3+879	SACEEM	Trinchera Capurro	1-Jun	17-Ago	7
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+307	4+307	SACEEM	Montevideo	16-Feb	18-Ago	8
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+797	4+797	SARLUX	Montevideo	4-Jun	24-Ago	12
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+894	4+894	SACEEM	Montevideo	28-Ago	27-set	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+906	4+906	SARLUX	Montevideo	31-May	24-Ago	12
Servicios Afectados	1	Eléctrica	4+937	4+937	SARLUX	Montevideo	31-May	24-Ago	12
Servicios Afectados	1	Eléctrica	5+590	5+590	SACEEM	Montevideo	20-Ene	15-set	20
Servicios Afectados	1	Eléctrica	5+893	5+893	SARLUX	Montevideo	25-Ago	29-Ago	3
Servicios Afectados	1	Eléctrica	5+894	5+894	SARLUX	Montevideo	25-Ago	29-Ago	3
Servicios Afectados	1	Eléctrica	6+298	6+298	SARLUX	Montevideo	17-May	26-Ago	14
Servicios Afectados	1	Eléctrica	6+820	6+820	SARLUX	Montevideo	31-May	26-Ago	14
Servicios Afectados	1	Eléctrica	6+969	6+969	SACEEM	Montevideo	9-Ago	15-set	20
Servicios Afectados	1	Eléctrica	7+371	7+371	SACEEM	Montevideo	9-Ago	15-set	20
Servicios Afectados	1	Eléctrica	9+316	9+316	SACEEM	Montevideo	8-Abr	20-Ago	10
Servicios Afectados	1	Eléctrica	9+356	9+356	SACEEM	Montevideo	13-Ene	20-Ago	10
Servicios Afectados	1	Eléctrica	9+837	9+837	SACEEM	Montevideo	24-May	15-set	20
Servicios Afectados	1	Eléctrica	9+841	9+841	SACEEM	Montevideo	14-Dic	15-set	20
Servicios Afectados	1	Eléctrica	10+116	10+116	SACEEM	Montevideo	25-Ene	20-Ago	10
Servicios Afectados	1	Eléctrica	10+215	10+215	SACEEM	Montevideo	12-Ene	31-Ago	17
Servicios Afectados	1	Eléctrica	11+281	11+281	SACEEM	Montevideo	12-Ene	20-Ago	10
Servicios Afectados	1	Eléctrica	11+282	11+282	SACEEM	Montevideo	12-Ene	20-Ago	10
Servicios Afectados	1	Eléctrica	13+268	13+268	SACEEM	La Paz	5-Abr	10-Ago	2
Servicios Afectados	1	Eléctrica	15+694	15+694	SACEEM	La Paz	7-Dic	15-set	20
Servicios Afectados	1	Eléctrica	17+393	17+393	SARLUX	La Paz	30-Nov	10-Ago	2
Servicios Afectados	1	Eléctrica	19+093	19+093	SACEEM	Trinchera Las Piedras	14-set	25-Ago	13
Servicios Afectados	1	Eléctrica	19+228	19+228	SACEEM	Trinchera Las Piedras	21-Jun	15-Ago	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	19+347	19+347	SACEEM	Trinchera Las Piedras	27-Ago	30-Ago	2
Servicios Afectados	1	Eléctrica	19+676	19+676	SACEEM	Trinchera Las Piedras	19-Jun	30-Ago	16
Servicios Afectados	1	Eléctrica	20+220	20+220	SACEEM	Trinchera Las Piedras	27-Jul	30-Ago	16
Servicios Afectados	1	Eléctrica	21+875	21+875	SARLUX	Las Piedras	8-Oct	30-Ago	16
Servicios Afectados	2	Eléctrica	40+104	40+104	ORITECNO	Canelones	15-Ene	15-set	20
Servicios Afectados	2	Eléctrica	43+892	43+892	ORITECNO	Canelones	15-Feb	18-Ago	8
Servicios Afectados	2	Eléctrica	66+649	66+649	ORITECNO	25 de Agosto	28-Feb	25-Ago	13
Servicios Afectados	2	Eléctrica	74+115	74+115	BERKES	Cardal (Incluye Variantes)	15-Jul	30-Ago	16
Servicios Afectados	2	Eléctrica	74+249	74+249	BERKES	Cardal (Incluye Variantes)	15-Jul	30-Ago	16
Servicios Afectados	2	Eléctrica	88+540	88+540	ORITECNO	25 de Mayo	15-Jun	15-set	20
Servicios Afectados	4	Eléctrica	194+530	194+530	BERKES	Durazno	15-Ago	7-set	15
Servicios Afectados	4	Eléctrica	196+932	196+932	BERKES	Durazno	10-Ago	8-set	19
Servicios Afectados	4	Eléctrica	198+245	196+932	BERKES	Durazno	28-Jun	11-Ago	3
Servicios Afectados	5	Eléctrica	256+726	256+726	BERKES	Desvío UPM 2	23-Jul	11-Ago	3
Servicios Afectados	5	Eléctrica	256+730	256+730	BERKES	Desvío UPM 2	23-Jul	11-Ago	3
Servicios Afectados	1	Eléctrica	8+809	8+809	SACEEM	Montevideo	31-May	13-Ago	5
Servicios Afectados	1	Eléctrica	10+070	10+070	SARLUX	Montevideo	4-Jun	15-set	20
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	10+135	10+135	SARLUX	Montevideo	22-Jun	27-Ago	15
Servicios Afectados	1	Alumbrado y TV Cable	26+042	26+042	SARLUX	Progreso	22-Jun	30-Ago	16
Servicios Afectados	2	Alumbrado y TV Cable	60+885	60+885	SARLUX	25 de Agosto	8-Ago	25-Ago	13
Servicios Afectados	2	Alumbrado y TV Cable	60+920	60+920	SARLUX	25 de Agosto	8-Ago	25-Ago	13
Servicios Afectados	2	Alumbrado y TV Cable	87+360	87+360	SARLUX	25 de Mayo	8-Ago	25-Ago	13
Servicios Afectados	4	Alumbrado y TV Cable	196+940	196+940	SARLUX	Durazno	20-Ago	25-Ago	4
Servicios Afectados	4	Alumbrado y TV Cable	196+941	196+941	SARLUX	Durazno	20-Ago	25-Ago	4



Ferrocarril Central MVD-PDT
Planificación Semana 32/2021

1	Montevideo-Progreso
2	Progreso-25 de Mayo
3	25 de Mayo-Sarandí Grande
4	Sarandí Grande-Durazno
5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración
Balasto y Sub balasto de Vía	1	Acopio de Balasto	8+200		Acopio Obrador Sayago	Montevideo	9-Ago	3-set	20
Balasto y Sub-balasto de Vía	3	Acopio de Balasto / Subbalasto	139+000				9-Ago	3-set	20
Balasto y Sub-balasto de Vía	4	Acopio de Balasto / Subbalasto Obrador Bracco	148+700				9-Ago	3-set	20
Balasto y Sub-balasto de Vía	4	Acopio de Balasto / Subbalasto	177+000			Goñi	9-Ago	3-set	20
Balasto y Sub-balasto de Vía	5	Acopio de Balasto / Subbalasto	221+200			E/Sta. Bernardina y C. Reyles	9-Ago	3-set	20
Balasto y Sub-balasto de Vía	5	Acopio de Balasto / Subbalasto	234+000			E/Sta. Bernardina y C. Reyles	9-Ago	3-set	20
Balasto y Sub-balasto de Vía	5	Acopio de Balasto / Subbalasto	249+500			E/C. Reyles y Centenario	9-Ago	3-set	20
Trinchera Las Piedras	1	Desvios	20+228		B037- Liber Seregni- Desvíos	Trinchera Las Piedras	9-Ago	27-Ago	15
Trinchera Las Piedras	1	Desvios	19+771		B034- Batlle y Ordoñez	Trinchera Las Piedras	9-Ago	20-Ago	10
Trinchera Las Piedras	1	Desvios	19+360		B030 - Baltasar Brum	Trinchera Las Piedras	23-Ago	3-set	10
Trinchera Las Piedras	1	Muros de Trinchera	20+228		Muro U3- Zona Pk 20100-Construcción- Muro de Trinchera	Trinchera Las Piedras	9-Ago	20-Ago	10
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	20+300		Pilotera 3 - Muro U3 a Final	Trinchera Las Piedras	9-Ago	13-Ago	5
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	20+300		Pilotera 3 - W.F.Aldunate a Seregni	Trinchera Las Piedras	16-Ago	3-set	15
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	19+102		Pilotera 1- Norte Calle Ellauri	Trinchera Las Piedras	9-Ago	10-Ago	2
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	19+360		Pilotera 1- Pilotaje aledaño a B030	Trinchera Las Piedras	11-Ago	20-Ago	8
Trinchera Las Piedras	1	Pilotaje	19+360		Pilotera 1- B030_Baltasar Brum	Trinchera Las Piedras	23-Ago	3-set	10
Trinchera Las Piedras	1	Viga de atado	19+102		Desmoche Pozo bombeo a Ellauri	Trinchera Las Piedras	9-Ago	13-Ago	5
Trinchera Las Piedras	1	Viga de atado	19+102		Viga de atado Pozo bombeo a Ellauri (B182)	Trinchera Las Piedras	16-Ago	27-Ago	10
Trinchera Las Piedras	1	Viga de atado	19+102		Estampidores B182 a B029	Trinchera Las Piedras	9-Ago	20-Ago	10
Trinchera Las Piedras	1	Drenaje longitudinal	18+870		Inicio PK 18+870 a B028 (Etapa 1) - Prefabricación	Trinchera Las Piedras	9-Ago	3-set	20
Trinchera Las Piedras	1	Excavación	18+870		Excavación Inicio PK 18+870 a B028	Trinchera Las Piedras	9-Ago	3-set	20
Trinchera Las Piedras	1	B943 - Pasarela peatonal Arroyo La Paz	15+315		Preparación de terreno y acceso	La Paz	9-Ago	13-Ago	5
Trinchera Las Piedras	1	B034 - Batlle y Ordoñez	19+771		Losa vehicular	Trinchera Las Piedras	9-Ago	13-Ago	5
Trinchera Las Piedras	1	B029 - Aparicio Saravia	19+255		Losas de veredas con canalizaciones	Trinchera Las Piedras	9-Ago	13-Ago	5
Trinchera Las Piedras	1	B037- Seregni	20+228		Losa vehicular y vereda	Trinchera Las Piedras	9-Ago	20-Ago	10
Trinchera Capurro	1	Desvío	4+000		Desvío Uruguayana	Trinchera Capurro	9-Ago	3-set	20
Trinchera Capurro	1	Pilotaje	3+600		Zona Entre Flanghini y Fco Gomez (P3)	Trinchera Capurro	9-Ago	9-Ago	1
Trinchera Capurro	1	Pilotaje	3+200		Pantallas transversales entre Capurro y PK 4+100	Trinchera Capurro	9-Ago	13-Ago	5
Trinchera Capurro	1	Pilotaje	3+200		Pilotaje entre PK 3+880 y 3+940 (P2)	Trinchera Capurro	9-Ago	3-set	20
Trinchera Capurro	1	Vigas de Atado	3+640		Vigas de Atado entre Flangini y Fco Gomez	Trinchera Capurro	9-Ago	27-Ago	15
Trinchera Capurro	1	Puente B004 - Hnos Gil	3+340		Obras accesorias	Trinchera Capurro	9-Ago	3-set	20
Trinchera Capurro	1	Estampidores definitivos	3+340		Entre B005 y B006	Trinchera Capurro	9-Ago	20-Ago	10
Trinchera Capurro	1	Estampidores definitivos	3+340		Entre B006 y comienzo de cubierta Uruguayana	Trinchera Capurro	23-Ago	3-set	10
Trinchera Capurro	1	Prefabricados drenajes longitudinales	3+100		Canales abiertos de 1400x1000	Trinchera Capurro	9-Ago	3-set	20
Trinchera Capurro	1	Prefabricados drenajes longitudinales	3+100		Canales abiertos de 850x500	Trinchera Capurro	9-Ago	3-set	20
Trinchera Capurro	1	Prefabricados drenajes longitudinales	3+100		Canales abiertos de 1250x500	Trinchera Capurro	9-Ago	3-set	20
Trinchera Capurro	1	Prefabricados drenajes longitudinales	3+100		Canales abiertos de 550x450	Trinchera Capurro	9-Ago	27-Ago	15
Trinchera Ruta 102	1	Preparación de terreno	13+200		Para pilotera, mixer y muro guía	La Paz	9-Ago	3-set	20
Trinchera Ruta 102	1	Desmoche	13+200		Desmoche pilotes M4 Oeste	La Paz	9-Ago	27-Ago	15
Trinchera Ruta 102	1	Viga de atado	13+200		Viga de atado M5	La Paz	9-Ago	13-Ago	5
Trinchera Ruta 102	1	Viga de atado	13+200		Viga de atado M4 Oeste	La Paz	16-Ago	3-set	15
Trinchera Ruta 102	1	Pilotaje	13+200		Pilote trasdos en M5	La Paz	11-Ago	11-Ago	1
Trinchera Ruta 102	1	Pilotaje	13+200		Ejecución de pilotes en M1	La Paz	12-Ago	27-Ago	12
Trinchera Ruta 102	1	Pilotaje	13+200		Ejecución de pilotes en M4 Este	La Paz	30-Ago	3-set	5
Trinchera Ruta 102	1	Muro Guía	13+200		Ejecución de muro guía - M4 este	La Paz	9-Ago	13-Ago	5
Trinchera Ruta 102	1	Muros de Contención	13+200		Muro de contención M5 Este - Excavación/Saneo/Hormigonado	La Paz	9-Ago	20-Ago	10
Trinchera Ruta 102	1	Muros de Contención	13+200		Muro de contención M5 Oeste - Excavación/Saneo/Hormigonado	La Paz	9-Ago	3-set	20
Trinchera Ruta 102	1	Muros de Contención	13+200		Muros entibados en voladizo	La Paz	30-Ago	3-set	5
Trinchera Ruta 102	1	Desvios	13+200		MDS de desvios provisorios Noroeste	La Paz	11-Ago	3-set	18
Trinchera de Usher- Calleros	3	Demoliciones	106+400	106+470		Florida	9-Ago	26-Ago	14
Trinchera de Usher- Calleros	3	Replanteo	106+400	106+470		Florida	9-Ago	28-set	20
Trinchera de Usher- Calleros	3	CIMENTALIA - Pilotaje	106+400	106+470		Florida	9-Ago	30-set	20
Trinchera de Usher- Calleros	3	FERRALIA - Armadura de pilotes	106+400	106+470		Florida	9-Ago	30-set	20
Trinchera de Usher- Calleros	3	Descabezado de pilotes	106+400	106+470		Florida	9-Ago	5-Oct	20
Trinchera de Usher- Calleros	3	Encofrado y Armado de viga superior de atado	106+400	106+470	lado izq y der- zona usher hasta puente B101	Florida	9-Ago	26-Ago	14
Trinchera de Usher- Calleros	3	Llenado viga superior de atado	106+400	106+470	lado izq y der- zona usher hasta puente B102	Florida	11-Ago	26-Ago	12
Trinchera de Usher- Calleros	3	Encofrado puente B101	106+400	106+470		Florida	19-Ago	2-set	11
Obradores	4	Obrador Durazno	192+500		Carga, descarga y transporte de materiales	Durazno	9-Ago	3-set	20
Reposición de Caminos	4	Mantenimiento de accesos y caminos			Todo el tramo		9-Ago	3-set	20
Vías	3	Producción de durmientes	109+000		Planta de durmientes	Florida	9-Ago	3-set	20
Vías	3	Preparación de fijaciones	109+000		Planta de durmientes	Florida	9-Ago	3-set	20
Vías	3	Transporte y descarga de fijaciones	109+000		Planta de durmientes	Florida	9-Ago	9-Ago	1
Vías	3	Producción de soldaduras eléctricas	109+000		Planta de soldadura eléctrica	Florida	9-Ago	3-set	20
Vías	1	Carga, transporte y descarga de durmientes en obrador de Sayago	9+000		Planta de durmientes	Montevideo	9-Ago	3-set	20
Vías	1	Carga, transporte y descarga de ADV's en obrador de Sayago	9+000		Obrador Sayago	Montevideo	9-Ago	20-Ago	10
Vías	5	Carga, transporte y descarga de durmientes en obrador de Lombardi	207+000		Planta de durmientes	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	9-Ago	3-set	20
