

Gestión binacional e integrada de los recursos hídricos en la Cuenca de la Laguna Merín y Lagunas Costeras Gestão Binacional e Integrada dos Recursos Hídricos na Bacia da Lagoa Mirim e nas Lagoas Costeiras


GCP/RLA/230/GFF

15ª Sesión del Consejo Regional de la Laguna Merín

Martes 15 de octubre de 2024

Informe de Avances del Proyecto

II. 1b. Mapa del proyecto y coordenadas geográficas

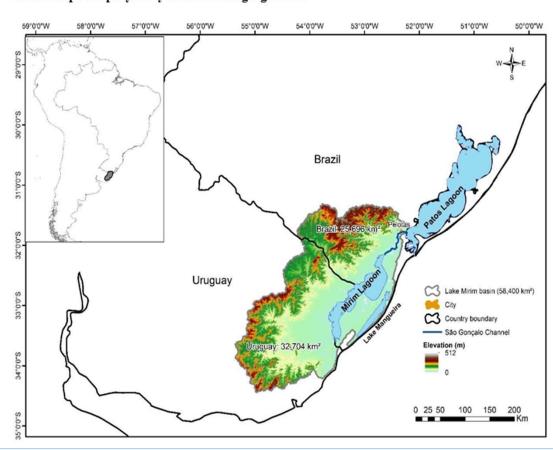

Objetivos del Proyecto:

"Gestión Binacional e Integrada de recursos hídricos en Cuenca de Laguna Merín y Lagunas Costeras"

Objetivos: Fortalecer las capacidades del sector público y privado en Brasil y Uruguay para la gestión conjunta e integrada de los recursos hídricos (GIRH) en la Cuenca de la Laguna Merín y las Lagunas Costeras, con <u>énfasis</u> en el uso sostenible y eficiente del agua, la preservación de los ecosistemas y sus servicios y la adaptación al cambio climático, a través del desarrollo de un Análisis de Diagnóstico Transfronterizo (ADT) y un Programa de Acción Estratégica (PAE).

Roles Económicos y Ecológicos: pesca artesanal y actividades agrícolas, y valor ecológico de los humedales para especies endémicas y migratorias, como Reserva de la Biosfera.







Objetivos específicos del Proyecto:

Generar **consensos** entre Brasil y Uruguay sobre las principales preocupaciones transfronterizas.

Implementar **reformas** legales, institucionales y de políticas prioritarias para la protección y utilización equitativa de los recursos hídricos de la cuenca y sus ecosistemas dependientes.

Mejorar la **cooperación** transfronteriza a través de la formulación y aprobación del **Programa de Acción Estratégico**.

Mejorar los mecanismos de **consulta** y **participación** de partes interesadas (incorporando la perspectiva de género), y generar **instrumentos** y herramientas para la **gestión** que permitan generar bases sólidas para la implementación del **Programa de Acción Estratégico**.


Probar estrategias para el uso eficiente del agua, la preservación de los recursos naturales y el desarrollo de actividades económicas sostenibles, a través de actividades demostrativas








Etapas de elaboración e inicio del Proyecto

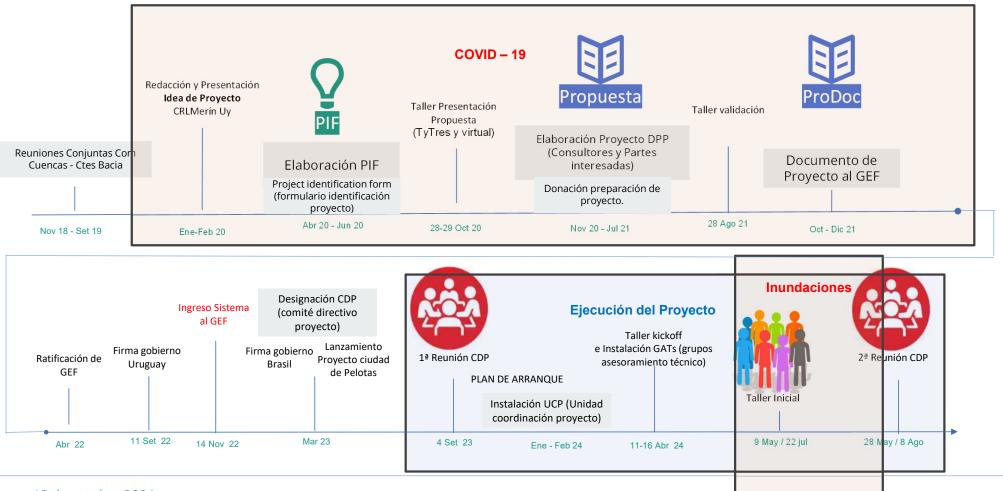


Avances del Proyecto



				2024					2025
lay	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Enero	Febr
			CDP #2	CDP #3		POA 2025			CDP#4
					Esp. comunicacio	n			
	Mision RLC				Esp. Género				
					Esp. Gobernanza				
					As. Particip.				
					Comun. UY				
		Taller Inicial			Informe inicial				
				Misión ALM +					
				CURE					
	PIR 2024	PPR 24 1S		IWC10					
				Proceso elaboració	n CdA		F	irma e inicio CdA	

Gobernanza del Proyecto / Organigrama funcional:

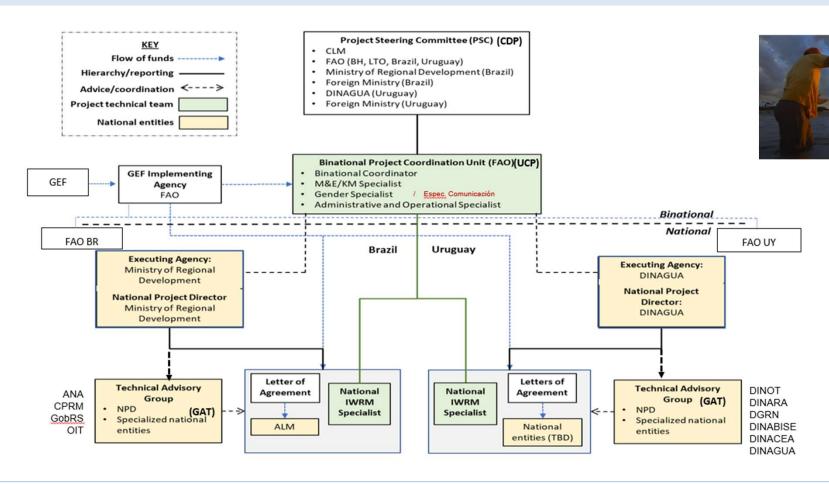

Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP)

Instalación UCP

- ✓ Coordinador Técnico Binacional: Llamado abierto
- ✓ **Responsable Operaciones y Administración**: Lucia Pais (01/01/24)
- ✓ Responsable Monitoreo, Evaluación y Gestión del conocimiento: Leopoldo Blanco (15/01/24)
- ✓ Especialista Cuencas Brasil: Danielle Alencar (21/02/24)
- ✓ Especialista Cuencas Uruguay: Virginia Arribas (01/02/24)

Pendientes:

- ✓ Especialista Comunicación: incorporación inmediata
- ✓ Especialista en Género: Términos de referencia en adaptación.
- ✓ Especialistas en Gobernanza. 1BR y 1UY. Términos de referencia en elaboración.
- ✓ Asistente en comunicación y procesos participativos. Términos de referencia por aprobar. Próxima publicación de vacante. (consultoría)

Grupo de Asesoramiento Técnico (GAT)

Instalación GAT (16/04/24)

Institucion	es de Brasil
Gilberto Loguercio Collares. Agencia Laguna Merin (ALM)	Jocemar Tomasino Mendonca. MPA
Rafael Corteletti. ALM	Francisco Everardo Sousa. MPA
Regina Coeli Montenegro Generino. Agencia Nacional de Agua (ANA)	Marcelo de Almeida Bastos. Ministerio das Ciudades (MC)
Renata Rozendo Maranhão. ANA	Mariana Maciel Fonseca. MRE
Thiago Gil Barreto Barros. ANA	Claudia Elisabeth Bezerra Marques. MME
Mariana Vaini De Freitas. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes	Maria Ceicilene Aragao Martins. MME
Kleber Souza dos Santos. Ministerio de Agricultura e Pecuaria (MAPA)	Rita Alves Silva. MME
Alberto Batista da Silva Filho. Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR)	Wilson Rodrigues de Melo Junior. MME
Edilene Madalena da Silva. MIDR	Rafael Costa Morgado Soares Braga. Ministerio de Turismo
Emmanuelle Viçoso Caiafa. MIDR	Iara Bueno Giacomini. MMA
Fernanda Ayres. MIDR	Tatiana Gontijo de Loreto Advincula. Ministerio do Portos e Aeroportos
Giuseppe Serra Seca Vieira. MIDR	Carolina Menegaz. Secretaria do Meio Ambiente E Infraestructura
Nayla Motta Campos Libos. MIDR	Anderson Felipe de Medeiros Bezerra. MMA
Vinicius Ferreira Boico. MIDR	Daniel De Castro Jorge Silva.
Carolina Amorim da Silva Bittencourt. MPA	Gustavo dos Santos Goretti.
Catarina Cardoso de Melo. MPA	Karina Retzlaff.
	Valdomiro Haas.


Institucione	s de Uruguay:
Roberto Mezzera. Consejo Laguna Merín (CLM)	Luis Anastasia . Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA – MA)
Luis Reolon. Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental - Ministerio Ambiente (DINACEA – MA)	Carlos Mazza. Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA – MGAP)
Martin Etcheverry. Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (DINABISE – MA)	Carolina Miranda. Dirección General Recursos Naturales DGRN – MGAP)
Amalia Panizza. Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA – MA)	Pablo Lacuesta. Dirección General Recursos Naturales DGRN – MGAP)
Viveka Sabaj. Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA – MA)	Ana Álvarez. Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (DINOT – MVOT)
Camila Vincent. Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA — MA)	Diana Musitelle. Programa de Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable en los Humedales del Este - Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (PROBIDES- DINABISE – MA)
Mario Bustamante. Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA – MA)	


Taller Inicial – objetivos (virtual - 22/07/24)

- Presentar el Proyecto y sus documentos estratégicos.
- Promover la importancia de la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) compartido en lugar de uso competitivo.
- Proporcionar un importante momento de diálogo con las principales partes interesadas.
- Presentar al equipo técnico del proyecto Unidad de Coordinación del Proyecto UCP/FAO.
- o Iniciar el **proceso participativo** de implementación del proyecto.
- Obtener contribuciones sobre los siguientes aspectos:
 - Temas (sociales, ambientales, económicos y de gobernanza) a ser profundizados en el
 Diagnóstico Ambiental Transfronterizo de la Cuenca;
 - Mapa de actores identificados en el PRODOC;
 - Instancias de participación previstas.

Taller Inicial (virtual - 22/07/24)

Inscritos:

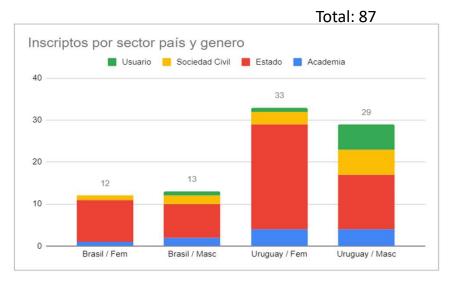



- 1) Estado actual de los recursos hídricos (cantidad y calidad, sedimentación, zooplancton) (aguas superficiales y subterráneas) y fragilidad de los humedales
- En Uruguay, se realiza el monitoreo de la calidad del agua por parte del Ministerio de Ambiente en conjunto con CURE
- Existen más de 30 puntos de medición de la calidad del agua utilizando metodologías Latu sensu. Las metodologías adoptadas no miden la presencia de residuos de pesticidas, sólo los nutrientes provenientes de la fertilización/eutrofización de los cultivos.
- Se observa el aumento de extracción de volúmenes de agua para usos privados.
- Hay evidencia de la contaminación física y química del agua, así como de arsénico en la laguna.
- Se destaca el uso sin control de agua en temporada de seguía.
- Evaluar el impacto del manejo de ganadería y pesca en humedales y la efectividad de los diques.

- 2) Condiciones del suelo, y su contenido de fósforo;
- Incluir otros agentes de contaminación del suelo (no solo por fósforo).
- Evaluación de floraciones algales, no hay monitoreo de Cianobacterias en la laguna (si hay en afluentes).
- Incremento de nutrientes en el ecosistema totalmente relacionado con la degradación vegetal del monte ribereño.
- 3) Estado actual de los recursos pesqueros, capacidad de producción de la acuicultura y efectos de las actividades pesqueras y acuícolas en la diversidad biológica y el ambiente;
- Considerar la planificación espacial marina.
- Falta de información, captura indiscriminada, pesca ilegal y sobrepesca de los recursos Pesqueros (Cure).
- Necesidad de evaluaciones y análisis de especies pesqueras, y especies exóticas invasoras.
- Experiencia en proyectos de revitalización de cuencas implementados por Emater RS y conocimiento de comunidades rurales locales, comunidades que trabajan con pesca y áreas periurbanas.

4) Uso de la tierra; y degradación de recursos naturales en la cuenca;

- Considerar la zonificación de idoneidad agrícola.
- Se percibe la presión sojera que avanza sobre las pampas, que sólo existe en este Estado y en esta región, y trabajan para hacer más rigurosas las autorizaciones para la reconversión de áreas.
- Se visualizan cambios de uso del suelo, eliminación de la mata atlántica, reemplazo de las marismas entre otros, sin planificación, que provocan la degradación del suelo mediante la acción humana, no solamente por el cambio climático.
- En Uruguay la terminología adecuada sería usos del suelo, no de la tierra, destacándose la planificación y ordenamiento territorial en los planes directores municipales.
- Se observan daños físicos a la estructura del suelo, erosión, y sedimentación.
- Falta la Dimensión Territorial. No hay interrelación entre los diferentes territorios. La cuenca no es plana.

5) Fuentes de contaminación concentrada y difusa con énfasis en los nutrientes;

- Considerar la contaminación de las aguas por las plumas de aves.
- Incluir el impacto de otros rubros agrícolas, no solo el arroz.

6) Estado de conservación y utilización sostenible de la biodiversidad inclusive la agrícola, forestal, acuática y ganadera;

- Aportar una mirada menos fragmentada y más completa al análisis del paisaje, valorando además de los humedales que se encuentran en la parte inferior de la cuenca, la vegetación forestal que se encuentra en la región de los manantiales, aguas arriba de la cuenca.
- Se sugiere considerar la cuestión de la caza ilegal de patos.
- Respeto de los sitios Ramsar.
- Atender la aplicación de productos químicos en el mismo momento y de manera continua, lo que aumenta la mortandad de peces.
- Considerar el impacto del manejo de ganadería y pesca en zonas bajas de humedales, y de los diques en particular (Cure).
- Realizar evaluaciones de riesgos asociados a la introducción de especies exóticas invasoras y uso de plaguicidas sobre la biodiversidad y la productividad.
- No se visualiza una gestión clara de plaguicidas.

7) Pobreza, género, etnia, acceso a recursos y derechos y vulnerabilidad;

- Problemas de la permanencia de la población de la zona.
- Educación y trabajo para las nuevas demandas del territorio.
- Tendencia de los usuarios de los bienes públicos a la creciente marginalización por el avance de la propiedad privada.
- Atención al cuidado del acuerdo de Escazú y la perspectiva de género.
- Profundización en temas de etnia en Brasil, requiriendo la participación presencial.
- Énfasis del cuidado en temas de pobreza, género y educación.
- Considerar que el agua en Uruguay es un derecho humano consagrado en la Constitución.
- Integración del cuidado del patrimonio arqueológico.

8) Gobierno, planificación participativa y proceso de toma de decisiones entre sectores y actores;

- Considerar la existencia de una alianza entre Fepam, organismo estatal de RS, con MAP Biomas, que abarca también Uruguay.
- Considerar más participación social, y más instancias para la revisión de los problemas y temas a analizar.
- Se cuestiona la existencia de controles de vertidos y efluentes en el sector arrocero.
- Se percibe la debilidad de las competencias de las instituciones del Estado.
- Falta de acuerdos y arreglos institucionales para la participación.
- Atención al cuidado del acuerdo de Escazú.
- Fortalecimiento de la gobernanza y la legislación transfronteriza para el uso de recursos hídricos.
- Se percibe que existen leyes y normativas, pero faltan capacidades institucionales y recursos humanos para la aplicación y fiscalización.
- Necesidad de considerar los diagnósticos existentes, y deben tomarse en cuenta.
- No respeto a zonas buffer (barreras de contención) en zonas arroceras, sin monte nativo.

Principales insumos taller inicial 22/7/2024

- 9) Análisis y evaluación de los valores económicos de los ecosistemas y sus servicios y los impactos económicos de su degradación o pérdida.
- Sin comentarios
- 10) Servicios climáticos para apoyar a los productores de arroz y pescadores;
- Sin comentarios
- 11) Riesgos e impactos por el aumento del nivel del mar, inundaciones, sequías y otros fenómenos climáticos adversos
- Se plantea el Plan de Cambio Climático centrado en la adaptación de las zonas costeras (Br y Uy –
 interactúan)

Principales insumos taller inicial 22/7/2024

12) Infraestructuras - Nuevo

- Revisar los criterios de licenciamiento ambiental de obras hidráulicas con miras a una mayor protección ambiental de la Cuenca.
- El análisis a realizar debe considerar el hecho de que Lagoa Mirim y Lagoa dos Patos son ambientes modificados por obras de infraestructura hídrica que las conectan y que, como resultado, su fauna sufre cambios.
- Impacto al patrimonio arqueológico de la región por obras de infraestructura hídrica.
- Impacto ambiental de la Hidrovía. Existen dudas respecto a qué implicaría este tema a analizar.
- Impacto ambiental de las Carreteras digues
- Obras hidráulicas no autorizadas ejecutadas por vecinos (barreras, represas, canales) lo que conlleva complicación de vecinos aguas arriba, y cambia los cursos de agua.
- Debe considerarse que en el riego por rebase, riego corrido, el agua rebasa los muros, existen tomas de bombeo 24horas, y el agua vuelve a la fuente original de manera permanente.
- Considerar el análisis de impactos de la hidrovia en cuenca y ecosistema, así como de las obras de impermeabilización e industrias.
- Se plantea la interrogante acerca de si se van a realizar los embalses planificados, y cómo afectarán estos proyectos.

Principales insumos taller inicial 22/7/2024

13) Salud y trabajo - Nuevo

- Problema de salud vinculado al uso agrícola de pesticidas
- Problemas relacionados a la salud vinculadas a las actividades productivas
- Impacto de Pesticidas: Efectos en la salud humana y del ecosistema, incluyendo especies invasoras como tilapias de agua fría. (Cure)
- Enfoque en "Una Salud" para evaluar impactos en salud humana y ecosistemas. (Cure)
- Problemas y riesgos a la salud humana por impacto de agrotóxicos.

14) Concientización y divulgación - Nuevo

- Falta de involucramiento de la población, que no se informa y desconoce cómo vincularse.
- Debe divulgarse masivamente el proyecto y sus objetivos.
- Necesidad de divulgar y concientizar a todos los usuarios del agua en relación al cuidado del recurso hídrico.

Principales actores faltantes identificados en el taller y aportes post taller

- Comissão Guarani Yvyrupa
- Associação de Estudos e Projetos com Povos Indígenas e Minoritarios
- Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines
- Asociación Uruguaya de Guardaparques
- Associação Mbya Guarani Tenonde RãTekoa Para Roke
- Gremial de molinos FOEMYA
- Gremiales de empleados, de base.
- SUTAA (sindicato unico trabaj de arroz y afines)
- ONG: Julana, Movimiento por la Tierra
- Afrodescendientes: (no de Montevideo)
- Sociedad de Fomento de San Miguel
- SUNATRA
- FUCREA
- Instituto Plan Agropecuario
- UTU (Áreas Protegidas)
- Juntas Locales y Departamentales
- CNDAV (Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida)
- Cooperativas de Mujeres

- Comitê de Bacia hidrográfica, representante dos grupos de usuários de água da bacia que atua no território em mais de 20 municípios que o comitê abrange
- Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul (Arpin-Sul), a qual compõe o Comitê Gestor da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (CG-PNGATI).
- Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

Presentación de la Planificación Operativa

POG - POA 2024

									<u> </u>	
POG - Proyecto de Gestión Binacional Integrada de los Recursos Hídricos de la Cuenca de la Laguna Merín y Lagunas Costeras										
Componente Resultation 2022 2023	2024	2025	2026	2027				Description	to anual (USD)	
All All	2024 9 9 10 10 11 12 7 1 5 1 7 1 1 10 11 11	12111211111	2020	122-112-118	пи	Presupcesto (USD)	2022-2023			1026 2027
Compenente 9 - Actividades Iniciales								- 77		
Resultado G.1 Plan de Arranque										
Componente 1 Análfsis Diagnéstico Transfronteriao (ADT) de la cuenca de la laguna Merén.										
Resultado 1.1 Principales problemas ambientales transfronterizos, causas, impulsores e impactos en la cuenca de la laguna Merin y el río Yaguarán identificados y acordados por ambos países a través de un Análisis Diagnéstico Transfronterizo.						698,600	1,578	478,967	218,055	
Producto 1.1.1 (ivaluación Ambiental, social (género, cenia y juventud), económica y de gobernanta, incluida la valoración de los servicios ecosistémicos.										
Producto 1.1.2 Documento de Análisis Diagnóstico Transfronterizo que utiliza procesos de consulta colectiva y pública y el mejor conocimiento científico y datos disponibles.										
Componente 2 Diseño de un Programa de Acción Estratégico (PAE) para la evenca de la Isguna Merín y consolidación de capacidades para su aplicación.										
Resultado 2.1- Fertalecimiento de los mecanismos e instituciones existentes para la gestión y coordinación integrada a efectos de facilitar la cooperación y gestión de la cuenca de la laguna Merin y una gebernanza conjunta major coordinada, eficaz e integrada.						377,352	***	11,243	*****	79,828 27,32
Producto 2.1.1 Plan de acción/hoja de ruta para fortalecer la base legal e institucional para la GIRH transfronteriza en todos los niveles.						377,352	-	*******		27,32
Producto 2.1.2 Instrumentos de planificación para implementar marcos de normativa prioritaria y buenos princípios de gobierno										
Products 2.1.3 Programs de fortalectrisento de capacidades desarrollado para las partes interesadas pertinentes de gobiernos nacionales y regionales y otros actores pertinentes para planificar y desarrollar acciones principales (apoyado por IM-LARIA)										
Resultado 2.2 Mejors de los procesos conjuntos de toma de decisiones en un marto de gestión integrada de los recursos hidricos (GIRH)						767,735	505	2,641	365,469 3	362,837 36,28
Producto 2.2.1 Análisis y planificación de los sistemas de apoyo para la toma de decisiones (DSS por su sigía en inglés) que utilizan la participación, integración y divulgación de datos e información:										
Producto 2.2.2 Mecanismo de gestión e intercambio de datos, información y conocimiento, con regias y procedimientos acondados y una base de datos compantida										
Resultado 2.3. Programa de Acción Estratégico (PAE) socializado con las partes interesadas, acordado con los gobiernos nacionales, firmado y aprobado a nivel ministerial.						276,374	505	2,892	71,622	99,097 102,75
Producto 2.3.1 Proceso multivectorial para la formulación y comunicación del PAE de la Laguna Merín, acordado e implementado.										
Producto 2.3.2 PAE desarrolitado y aceptado por las partes interesadas, y firmado a nivel ministerial										
Producto 2.3.3 Estrategia de sostenibilidad financiera para la implementación del PAE desarrollado y aceptado										
Componente 3. Hierramientas y demostraciones para apoyar la aplicación de la GIRH.										
Resultado 3.1 Herramientas establecidas de Gestión integrada de los Recursos Hidricos.						821,289	789	3,393	731,536	49,413 36,16
Producto 3.1.1 Sistema de monitoreo conjunto vigente		_								
Producto 3.1.2 Sistema de monitoreo de áreas protegidas.										
Resultado 3.2- Beneficios de la gestión integrada de cuencas demostrados como la primera etapa del FAT a través de la implementación de proyectos piloto.						963,176	789	36,380	831,435	58,728 35,86
Producto 3.2.1 Proyectos piloto de erríoques sostenibles para la producción y gestión de los recursos naturales para abondar las cuestiones transfronterizas.										
Products 3.2.2 Proyecto(s) piloto de enfoque que utiliza(n) ecosistemas para la gestión y el gobierno del desarrollo integrado de la pesca y el turismo, incluidos los planes de gestión de tipo comunitario.										
Componente 4 Monitareo, comunicación y evaluación del proyecto.			-							
Resultado 4.1- Las partes interesadas pertinentes del proyecto son conscientes de los beneficios de los proyectos piloto y la gestión integrada de cuencas.						247,867	368	40,040	46,154 1	103,318 57,78
Producto 4.1.1 Plan de comunicación, educación y concientización sobre los resultados que sustentan las actividades del proyecto desarrollado.										
Resultado 4.2 El proyecto deponde de una GBR efectiva.						52,230	505	12,671	10,599	12,581 15,87
Producto 4.2.1 El programa de MyE está desarrollado e implementado.										
Producto 4.2.2 Sistema para la gestión adaptativa basada en resultados (GBR) del proyecto.										
Resultado 4.3 Conocimiento compartido entre Brasil, Uruguay, otros países y los proyectos de GEF en asociación con IW-LEARN.						173,602	1,212	52,641	34,818	40,584 44,34
Products 4.3.1 Sitio web en consonancia con la guia actualizada de IW.LEARN, con información ambiental y socioeconómica integrada.										
Producto 4.3.2 Instancias de formación/hermanamiento de IW LEARN con la purticipación de autoridades de ambos gobiernos.										
Producto 4.3.3 Creación de al menos una Mota de Experiencia y una Nota de Resultados en IWEEARM.										
Producto 4.3.4 Conferencies de Aguas internacionales a lis que concurren personal del proyecto y representantes del país, y datos espaciales y otros datos puntuales suministrados a trovés del sido web del proyecto.										
M&E PMC				32		279,650 192,125		34,701 60,359	84,701 41,731	34,701 125,54 43,490 46,54
						4,850,000	7,019	735,428	2,694,504 8	884,575 528,47

Principales actividades previstas 2024



Marcos legislativos e institucionales. Comparación y oportunidades (act. 1.1.1.3 y act. 1.1.1.4)

Elaboración Cartas de Acuerdo

Principales actividades previstas 2024

Contrataciones pendientes UCP (Unidad de coordinación de proyecto)

- Proceso final especialista en comunicación
- Asistente en comunicación y procesos participativos (UY)
- Especialista en Género.
- Consultorías en gobernanza. 1BR + 1UY (act. 1.1.1.3 y act. 1.1.1.4)

Presencia en Territorio

• 2 Talleres (sub. 1.1.1.2.1)

4º CDP (Comité directivo de proyecto)

- POA 2025 (plan operativo anual)
- Manual operativo


Presupuesto Operativo Global (POG) por Componentes

(proyecto completo)

Componentes	Resultados	Componente (USD)	Componente (%)	2024	2025	2026	2027
Componente 1: Análisis Diagnóstico Transfronterizo (ADT) /Análise Diagnóstica Transfronteiriça (ADT)	1.1.Principales problemas ambientales transfronterizos, causas, impulsores e impactos identificados y acordados por ambos países a través de un ADT / Principais problemas ambientais transfronteiriços, causas, motivadores e impactos identificados e acordados por ambos os países através de uma ADT	698,600	14%	XX	XXXX		
Componente 2: Diseño de un Programa de Acción Estratégico	2.1. Fortalecimiento de mecanismos e instituciones existentes para la gestión y coordinación integrada regional / Fortalecimento dos mecanismos e instituições existentes para gestão e coordenação integradas			x	XXXX	XXXX	XXX
(PAE) y consolidación de capacidades para su aplicación / Desenho de um Programa de Ação	2.2. Mejora de los procesos conjuntos de toma de decisiones de GIRH / Melhoria dos processos de tomada de decisão conjunta de GIRH	1,421,460	29%			XXXX	XX
Estratégica (PAE) e consolidação de capacidades para sua aplicação	2.3. PAE aprobado y firmado / PAE aprovado e assinado				X	XXXX	XXX
Componente 3: Herramientas y pilotos demostrativos para la Gestión Integrada de Recursos Hídiricos	3.1. Herramientas para la GIRH establecidas / Ferramentas estabelecidas para a GIRH				XXX	XXXX	XXX
(GIRH) / Ferramentas e demonstrações para apoiar a aplicação da gestão integrada de recursos hídricos (GIRH)	3.2. Beneficios de la GIRH demostrados a través de pilotos / Beneficios da GIRH demonstrados através de pilotos	1,784,466	37%	X	XXXX	XXXX	XXX
Componente 4:	4.1. Las partes interesadas del proyecto son conscientes de los beneficios de los proyectos piloto y la GIRH /As partes interessadas estão conscientes dos beneficios dos projetos piloto e da GIRH			хх	XXXX	XXXX	XXX
Monitoreo, Evaluación y Comunicación / Monitoramento, comunicação e avaliação do	4.2. Efectiva aplicación de la Gestión por Resultado / Aplicação efetiva da Gestão por Resultado	473,699	10%	XXXX	XXXX	XXXX	XXX
projeto	4.3. Conocimiento compartido entre los países y proyecto del GEF en asociación con IW-LEARN / Conhecimento compartilhado entre países e projetos do GEF em associação com o IW-LEARN			XXX	XXXX	XXXX	XXX
	Monitoreo y evaluación / Monitoramento e avaliação	279,650	6%				
	Costo de gestión del proyecto / Custos de Gestão do Projeto	192,125	4%				
	TOTAL	4,850,000					

		202	4
Componentes	Resultados	Componente (USD)	Resultado (USD)
Componente 1: Análisis Diagnóstico Transfronterizo (ADT) /Análise Diagnóstica Transfronteiriça (ADT)	1.1.Principales problemas ambientales transfronterizos, causas, impulsores e impactos identificados y acordados por ambos países a través de un ADT / Principais problemas ambientais transfronteiriços, causas, motivadores e impactos identificados e acordados por ambos os países através de uma ADT	478,967	478,967
Componente 2: Diseño de un Programa de Acción Estratégico	2.1. Fortalecimiento de mecanismos e instituciones existentes para la gestión y coordinación integrada regional / Fortalecimento dos mecanismos e instituições existentes para gestão e coordenação integradas		11,243
(PAE) y consolidación de capacidades para su aplicación / Desenho de um Programa de Ação Estratégica (PAE) e consolidação de capacidades	2.2. Mejora de los procesos conjuntos de toma de decisiones de GIRH / Melhoria dos processos de tomada de decisão conjunta de GIRH	16,276	2,641
para sua aplicação	2.3. PAE aprobado y firmado / PAE aprovado e assinado		2,392
Componente 3: Herramientas y pilotos demostrativos para la Gestión Integrada de Recursos Hídiricos (GIRH)	3.1. Herramientas para la GIRH establecidas / Ferramentas estabelecidas para a GIRH		3,393
/ Ferramentas e demonstrações para apoiar a aplicação da gestão integrada de recursos hídricos (GIRH)	3.2. Beneficios de la GIRH demostrados a través de pilotos / Beneficios da GIRH demonstrados através de pilotos	39,773	36,380
Componente 4:	4.1. Las partes interesadas del proyecto son conscientes de los beneficios de los proyectos piloto y la GIRH /As partes interessadas estão conscientes dos beneficios dos projetos piloto e da GIRH		40,040
Monitoreo, Evaluación y Comunicación / Monitoramento, comunicação e avaliação do	4.2. Efectiva aplicación de la Gestión por Resultado / Aplicação efetiva da Gestão por Resultado	105,352	12,671
projeto	4.3. Conocimiento compartido entre los países y proyecto del GEF en asociación con IW-LEARN / Conhecimento compartilhado entre países e projetos do GEF em associação com o IW-LEARN		52,641
	Monitoreo y evaluación / Monitoramento e avaliação	34,701	34,701
	Costo de gestión del proyecto / Custos de Gestão do Projeto	60,359	60,359
	TOTAL	735,428	735,428

POA 2024 Distribución por componentes

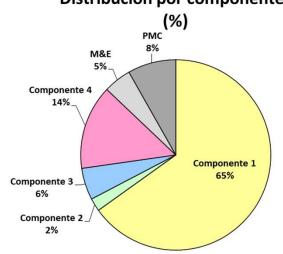

POA 2024 – Detalle Componente 1/1


								2	024						Presupues	to	
# Activided	Actividades (Anexo G)	# Sub Actividad	SubActividades (Parrafos Prodoc)	Meta 2024	Ene	Feb M	lar Abr	May Jur	Jul Ag	o Set	Oct Nov	Dic	Ejec UY	MONTO (USD)		MONTO (USD)	
to 1 Análi	sis Diagnóstico Transfronterizo (ADT) de la cu	onca do la	Jamina Merin														
ILE I AIRI	as bigliostico fransirontenzo (ADT) de la cu	enca de la	neguna memb														
	Principales problemas ambientales transfront tificados y acordados por ambos países a trave		isas, impulsores e impactos en la cuenca de la laguna Merín y el río														47
			económica y de gobernanza, incluida la valoración de los servicios					_		_							
stémicos.	Evaluación Ambiental, social (genero, echia y)	uventuu),	economica y de gobernanza, incluida la valoración de los servicios														
			Articular con las partes interesadas (órganos ejecutores, entidades ejecutoras del														
		11111	diagnóstico del Proyecto, GAT, órganos gestores de la Cuenca y otros) para acordar los principales temas a ser complementados y actualizados en la	Informe validado con GAT y ppales actores en taller inicial	Н	-	+							Ejecución dire	cta FAO - UCP		
			elaboración del Diagnóstico.														
1111	Revision del estado actual de los conocimientos y los acuerdos con las partes interesadas clave sobre los principales vacíos que deben llenarse y las	1.1.1.1.2	Ejecucion Taller Inicial	Informe Tailer Incial presentado								Г	Ejecución directa	FAO - Consul	toria para facilitad	ión del taller	
	cuestiones que deben actualizarse Cuestiones a abordar: en parrafo 91																
	an perent of	1.1.1.3	Consulta y reuniones estratégicas con actores claves (GAT) y contrapartes para complementar informacion para el ADT	Informe talleres y reuniones realizadas.									Ejecució	on directa FAO	- UCP viajes y tall	eres	3
		1.1.1.1.4	Elaborar un documento técnico que contenga aspectos actualizados a ser complementados y actualizados por el Diagnóstico Transfronterizo.	Informe de aspectos a actualizar en el ADT. Linea de Base actualizada										Ejecución dire	cta FAO - UCP		
			The state of the s	Plan de trabajo de primeras LOAs presentado y													
	Complementar y actualizar las caracterizaciones		Recopilación y análisis de datos/información ambiental, económica y social sobre los temas	aprobado Taller de presentacion y revision participativa de	\vdash	-	+					Н					
	bientales y sociales y economicas realizadas antes urante la DPP, incluídas las valoraciones de los	1.1.1.2.1	indicados en la Actividad 1.1.1.1.	cada pais con GAT	\vdash	+	+	_	-	_					Parte de la LOA	420.000	
1.1.1.2	servicios ecosistémicos y la actualización de las implicaciones de la pandemia de la COVID-19. Y del			Taller de presentacion y revision participativa binacional									Parte de la LOA 1	100.000	BR	120.000	478.9 478.9 478.9 20.000 220.00 220.00
	evento extremo ocorrido em 2024.		Determinación de impactos ambientales y sociales		\vdash	_	\perp					\vdash					
		1.1.1.2.3	Eliaboración de informes temáticos (ambientales y sociales), según el alcance acordado en los TdR									\perp					
		1.1.1.3.1	Consultoria para recopilar y analizar datos/información sobre temas de gobernanza por confirmar	Contrato de consultor/a firmado													
1.1.1.3	Finalizar y actualizar los análisis comparativos para la alineación de los marcos legislativos e institucionales llevados a cabo durante la DPP	1.1.1.3.2	Determinación de los impactos de gobernanza		Ш												
		1.1.13.3	Elaboración de informes temáticos (entrega), que componen el Rem de diagnóstico relativo a los aspectos de gobernanza/instrumentos jurídicos e institucionales, apoyando la preparación del Plan de Acción Producto 2.1.0										Ejecución directa FAO - Contratación		Ejecución directa FAO - Contratación		
		1.1.1.4.1	Consultoria para recopilar y analizar datos/información sobre cuestiones de necesidades y oportunidades de gestión en áreas prioritarias por confirmar	Contrato de consultor/a firmado									consultor/a especialista en	6.000	consultor/a especialista en gobernanza (3	5.250	1
1.1.1.4	identificar las necesidades y oportunidades para la gestión (nacionales y subnacionales) en temas prioritarios, temas a ser confirmados	1.1.1.4.2	Determinación de las necesidades y oportunidades de gestión en áreas prioritarias										gobernanza (3 meses)		meses)		
		1.1.1.4.3	Elaboración de informes temáticos (entrega), conformando el ítem de diagnóstico relativo a aspectos de gobernanza/instrumentos legales e institucionales, subvencionando la elaboración del Plan de Acción Producto 2.1.2														
		1.1.1.5.1	Definir el alcance del Atlas Binacional junto con los organismos ejecutores del proyecto y validario con los organismos ejecutores	Informe de alcance aprobado por UCP y DN													
	Revisar y digitalizar la informacion de la Biblioteca de la laguna Merin, y elaborar un Atlas Binacional de la Cuenca.	1.1.1.5.2	Revisar y digitalizar la información de la Biblioteca de la Laguna Merin										Parte de la LOA 1A (se espera ser		Parte de la LOA		
1.1.1.5	El atlas binacional será un documento descriptivo y analítico basado en cartografía que analizará y describirá la situación de la CBLM desde un punto de vista territorial, integrado a una visión ambiental de la cuenca hidrológica.	1.1.1.5.3	Generar mapas de al menos: tendendas de cobertura y uso del suelo a lo largo del tiempo, para relacionar estos factores con los cambios en las condiciones hidricas y emplentales; ecosistemas (con énfasis en sitios Ramuar y humedales);- identificación de patrimonio cultural y arqueológico.										firmada en el 2025)		BR	34.500	3
					-	_	_			_	_	-					

POA 2024 – Detalle Componente 1/2

									2024	l .						- 1	Presupues	to	
# Activided	Actividades (Anexo G)	# Sub Actividad	SubActividades (Parrafos Prodoc)	Meta 2024	Ene Feb	Mar	Abr	May	Jun Ju	Ago	Set	Oct	Nov Dic	Oct Nov	Ejec UY	MONTO (USD)	Ejec BRA	MONTO (USD)	Presupuesto 2024 (USD)
		1.1.1.6.1	Analizar las causas inmediatas, subyacentes y profundas																•
	Análisis causa-efecto, a través de la metodología	1.1.1.6.2	Proyección de escenarios futuros												Parte de la LOA	IA			
1.1.1.6	presión-estado-respuesta, definiendo	1.1.1.6.3	Identificación de puntos de apalancamiento y recomendaciones para el PEA												(se espera se	1	Parte de la LOA	34.500	34.500
	escenarios futuros y recomendaciones para el proceso del PAE.	1.1.1.6.4	Identificación y priorización de cuestiones transfronterizas - Taller binacional												firmada en e 2025)		BR	Seesall	
		1.1.1.6.5	Elaborar un informe con los resultados de las subactividades de esta actividad																
			Coordinador binacional																3.628
			Especialista en género																3.750
			Especialista en cuencas Uruguay																16.676
	Contratación de consultores nacionales		Especialista en cuencas Brasil																20.252
Costos			Especialista en enlaces y procesos estaratégicos (Uruguay)																5.670
transversa es al proyecto			Especialista en enlaces y procesos estaratégicos (Brasil)																5.670
	Misiones a territorio		Viajes nacionales Uruguay	Una misión a territorio															145
			Viajes nacionales Brasil			\vdash	-	-	\vdash	+	-	-							1.249
	Adquisición de bienes no fungibles		Laptops e impresora	Adquisición de 6 laptops y una impresora															1.750
	Gastos generales		Gastos generales incluyendo contingencias																411
	Servicio de soporte técnico		Salvaguardas ambientales y soociales																854
	1.1.2 Documento de Análisis Diagnóstico Trar y datos disponibles.	nsfronterizo	o que utiliza procesos de consulta colectiva y pública y el mejor conocimiento																
			Coordinador binacional																726
			Especialista en género																750
			Especialista en cuencas Uruguay														1		9.276
Costos	Contratación de consultores nacionales		Especialista en cuencas Brasil			Т											1		9.543
transversa			Experto internacional en ADT														1		4.000
es al proyecto			Asistente en comunicación y procesos participativos (Uruguay)																2.625
8 5			Especialista en enlaces y procesos estaratégicos (Uruguay)														1		1.134
1			Especialista en enlaces y procesos estaratégicos (Brasil)																1.134
	Adquisición de bienes no fungibles		Laptops e impresora	Adquisición de 6 laptops y una impresora															1.750
	Gastos generales		Gastos generales incluyendo contingencias																82
ı	Servicio de soporte técnico	1	Salvaeuardas ambientales v soociales	I .	I I	.1	1	I								L.	1	1	171

Misión a territorio, Pelotas y Rocha. Setiembre 2024.

Foto 1 - Eclusa lateral utilisada como rota alternativa para pequenas embarcações de pescadores mediante fluxo intenso no canal principal.

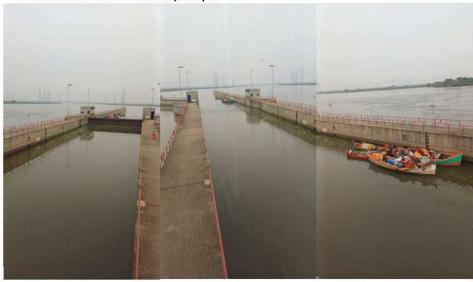

Fonte: Elaboração propria, 2024.

Foto 2 - Eclusas Canal São Gonçalo de proteção contra instrusão de água salina na Lagoa Mirim à montante.



Fonte: Elaboração propria, 2024.

Foto 3 - Equipe UCP/FAO e equipe da ALM reunião presencial em 09 de setembro de 2024, Pelotas/RS.



Fonte: Elaboração própria, 2024

Foto 4 - Equipe UCP/FAO e equipe da ALM reunião presencial em 09 de setembro de 2024, Pelotas/RS.



Fonte: Elaboração própria, 2024


Foto 5 – Imagens ilustrativas do registro da 1ª reunião conjunta realizada entre ALM, CURE, FAO/UCP e órgãos nacionais executores do projeto.



Fonte: Elbaoração própria, 2024.



Cartas de acuerdo Cartas de Acordo

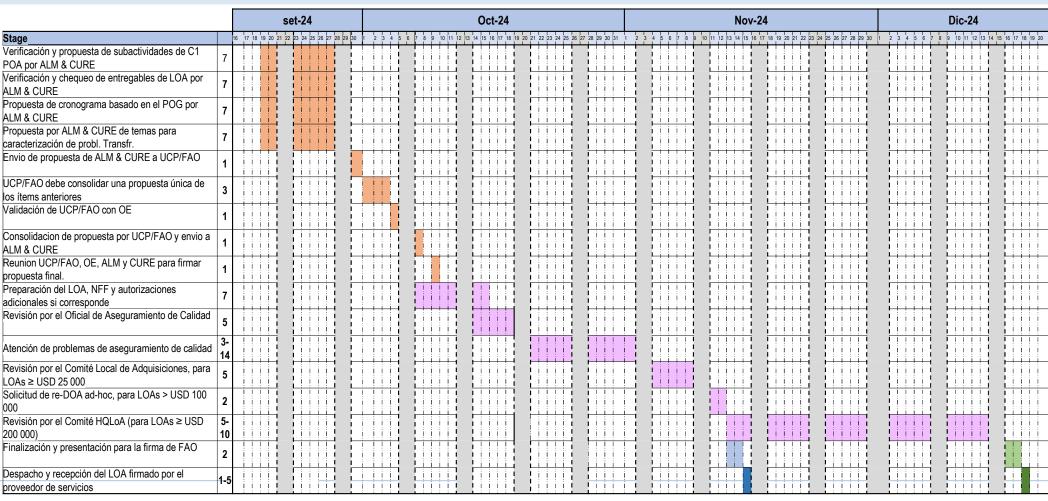

Cartas de acuerdo. Proceso ALM - CURE

								se	et-2	24										0	ct-2	24			
Stage		16	17	18	19	20	21	22 2	23	24	25	26	27 2	28 2	9 30) 1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11
Verificación y propuesta de subactividades de C1 POA por ALM & CURE	7							1												 					
Verificación y chequeo de entregables de LOA por ALM & CURE	7										İ					-	!		!			1			!
Propuesta de cronograma basado en el POG por ALM & CURE	7										I					-							-		
Propuesta por ALM & CURE de temas para caracterización de probl. Transfr.	7															-					1		-		
Envío de propuesta de ALM & CURE a UCP/FAO	1				į į			ļ	į		į	i									į	i	-		
UCP/FAO debe consolidar una propuesta única de los ítems anteriores	3						1 ! !				I	I								1	1				
Validación de UCP/FAO con OE	1		 								 	i					!					i			
Consolidación de propuesta por UCP/FAO y envío a ALM & CURE	1					!			ļ		į						!						-	İ	
Reunión UCP/FAO, OE, ALM y CURE para firmar propuesta final.	1				!						ļ	İ													

Cartas de acuerdo. Proceso FAO

	,																																				_
						0	ct-2	24													Nov	/-24											Dic-	24			
Stage		8 9	10 11	12 13 1	14 15 1	16 17 18 L L	19 20	21 22	2 23 24	1 25 2	6 27 2	28 29	30 31	1 2	3 4	5 6	7 8	9 1	0 11 1	12 13	14 15	16 17	18 19	20 21	22 23	24 25	26 27 2	28 29 30	JO 1 2	3 4	5 6	7 8	9 10 1	12 13	14 15 16	17 18 19	1 20
Reunión UCP/FAO, OE, ALM y CURE para	4		П																												\Box						
firmar propuesta final.	_ '			į į							1						11	į					İ												<u> </u>		į
Preparación del LOA, NFF y autorizaciones	7			! !																			- !													Tii	
adicionales si corresponde				; i			j	Ш			į							į	Ш				i														
Revisión por el Oficial de Aseguramiento de	5			! !						1							T														Tl	!					
Calidad	ָ ל		11					Ш									11						!														
Atención de problemas de aseguramiento de	3- ¦			Ì							į				İ			į					i			į					T	į					
calidad	14										- [Ш																		
Revisión por el Comité Local de	5			Ì							į			Ì	i			į											i								
Adquisiciones, para LOAs ≥ USD 25 000	ı ٰ ك			1]		!!					ŀ				- 1			ļ					!														!
Solicitud de re-DOA ad-hoc, para LOAs >	2						ļ											i i					i								T						
USD 100 000	Z ;				Ш						į								ij				i				Ш	Ш			Ш		Ш				
Revisión por el Comité HQLoA (para LOAs ≥	5-] !				П			į							ļ																			
USD 200 000)	10			<u> </u>		<u> </u>					į		! !	j		<u> </u>								! <u>!</u>		i			į								
Finalización y presentación para la firma de	2																	ļ													T						
FAO	;						į																									!					
Despacho y recepción del LOA firmado por el	4 5						!	-						i																							
proveedor de servicios	1-3		!!								į						!!	!					!														

Plan de acción en género





Objetivos

1

1) Reducir la brecha de género en el acceso y control de los recursos naturales por parte de las mujeres.

Evaluaciones con enfoque de género y participación femenina; diagnóstico transfronterizo para gestión integrada de recursos, reconociendo a las mujeres como agentes y gestoras del agua.

2

2) Mejorar la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones.

Promover la participación de las mujeres en la toma de decisiones a través de actividades de consulta, revisión de regulaciones para garantizar la igualdad de género, creación de acuerdos institucionales y capacitación en perspectiva de género.

3

3) Generar beneficios socioeconómicos para las mujeres.

Promover beneficios socioeconómicos para mujeres mediante acuerdos inclusivos, herramientas de gestión y capacitación equitativa en eventos de IW LEARN.

Instancias de participación

RESULTADO 1.1

COMPONENTE 1

ANÁLISE DIAGNÓSTICA TRANSFRONTEIRIÇA (ADT) PRINCIPAIS
PROBLEMAS
AMBIENTAIS
TRANSFRONTERIZOS,
CAUSAS, IMPULSORES E
IMPACTOS

IDENTIFICADOS E ACORDADOS POR AMBOS OS PAÍSES

OBJETIVOS:

- Acordar com as partes interessadas as principais lacunas a serem preenchidas e as questões a serem atualizadas.
- Comunicar resultados das avaliações desenvolvidas no âmbito do Produto 1.1.2,
- Definir e priorizar as questões comuns e transfronteiriças

INSTÂNCIAS:

- Consultas GAT
- Ferramenta de participação e comunicação virtual
- Reuniões específicas com setores usuários representados por suas entidades
- Reuniões específicas com órgãos colegiados gestores de recursos hídricos
- Consultas Públicas
- · Workshop binacional final

RESULTADO 2.1

COMPONENTE 2

ELABORAÇÃO DE
UM PROGRAMA DE
AÇÃO
ESTRATÉGICA (SAP)
E CONSOLIDAÇÃO
DAS CAPACIDADES
PARA A SUA
APLICAÇÃO

MECANISMOS E INSTITUIÇÕES DE GESTÃO E COORDENAÇÃO INTEGRADA

EXISTENTES SÃO
REFORÇADOS PARA
PERMITIR A
GOVERNANÇA,
COOPERAÇÃO E
GESTÃO CONJUNTA
INTEGRADA, MELHOR
COORDENADA E EFICAZ
DA BACIA DA LAGOA
MIRIM

OBJETIVOS:

- Confirmar os temas alvo da necessidade de harmonização dos instrumentos legislativos
- Confirmar necessidades específicas de fortalecimento da base institucional para a GIRH
- Buscar consenso sobre os princípios orientadores para a GIRH
- Confirmar temas para formulação de planos que cubram problemas temáticos-chave
- Desenvolver planos setoriais de forma participativa
- Novas análises das necessidades de capacitação
- Planejamento participativo das capacitações

INSTÂNCIAS:

- Consultas GAT
- Reuniões setoriais específicas
- Reuniões de alto nível
- Consultas aos beneficiários das capacitações (instituições públicas e sociedade civil)
- Ferramenta de participação e comunicação virtual


RESULTADO 2.2 OBJETIVOS: MELHORIA DOS PROCESSOS DE **DECISÃO CONJUNTOS** INSTÂNCIAS: NO ÂMBITO DE UM Consultas GAT **COMPONENTE 2 OUADRO DE GESTÃO** INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS ELABORAÇÃO (GIRH) **DE UM PROGRAMA DE OBJETIVOS:** AÇÃO **ESTRATÉGICA** (SAP) E **RESULTADO 2.3** CONSOLIDAÇÃO DAS **CAPACIDADES** processo SAP PROGRAMA DE AÇÃO **PARA A SUA** ESTRATÉGICO (SAP) **APLICAÇÃO** SOCIALIZADO COM AS INSTÂNCIAS: PARTES INTERESSADAS. • Consultas GAT ACORDADO COM OS **GOVERNOS NACIONAIS,**


ASSINADO E APROVADO

A NÍVEL MINISTERIAL

• Levantar o que já existe e considerar na consolidação do SAD

- Reuniões específicas CLM e outros
- Consultas instituições que monitoram dados (universidades, órgãos publicos, etc)
- Promover processo cooperativo e colaborativo entre os países, envolvendo governos e soc civil
- Promover um processo multissetorial de formalização e socialização do SAP
- Desenvolver e acordar um plano de trabalho detalhado para o processo SAP
- Validação e divulgação do documento do SAP.
 - Ferramenta de participação e comunicação virtual
 - Reuniões específicas com setores usuários representados por suas entidades
 - Reuniões específicas com órgãos colegiados gestores de recursos hídricos
 - · Consultas Públicas
 - Workshop binacional final

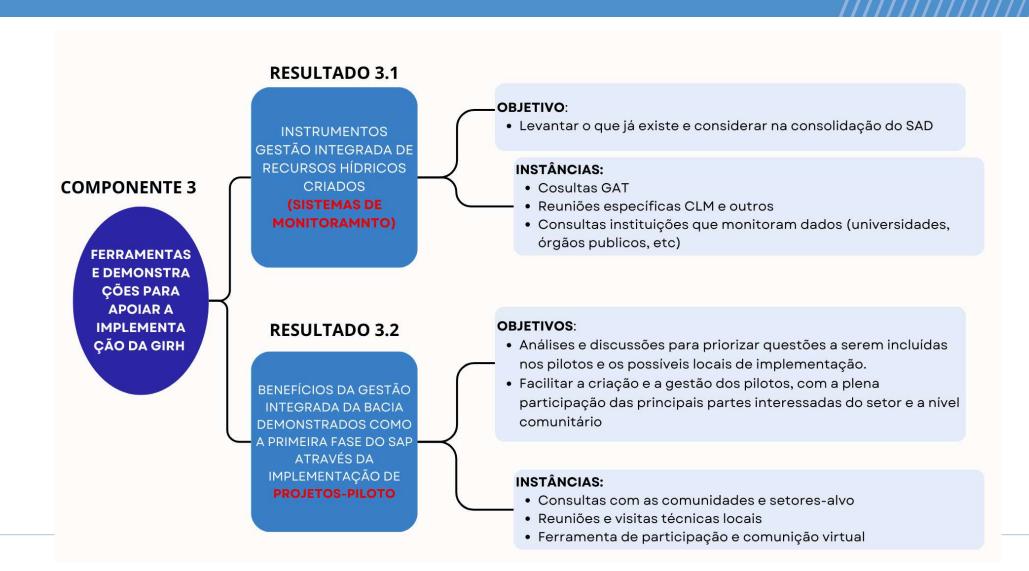

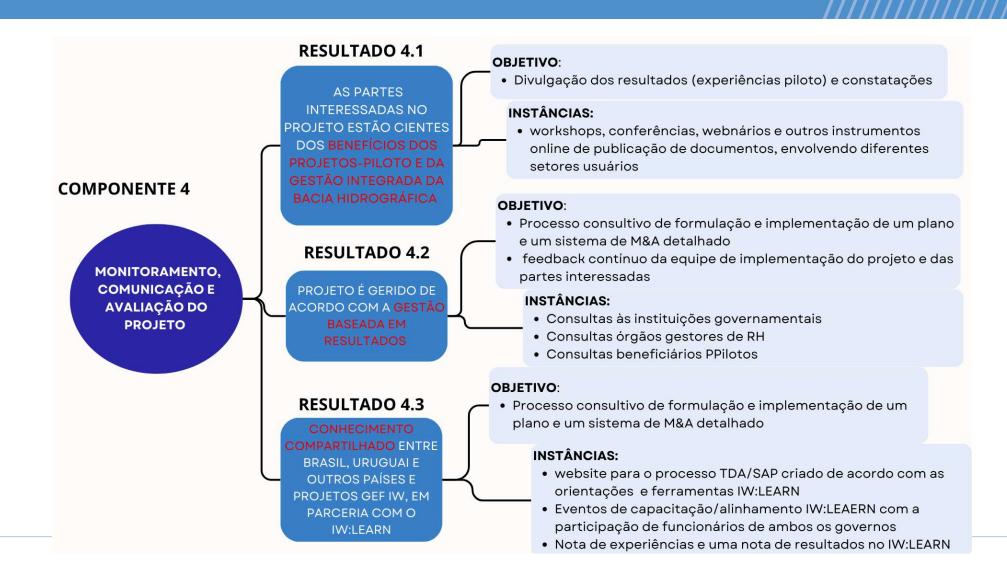

Gracias Obrigado Thanks
